




# 2019

## Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu




2020 - İskenderun



**İSKENDERUN TEKNİK**  
ÜNİVERSİTESİ

**2019 YILI**  
**YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**STARTEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

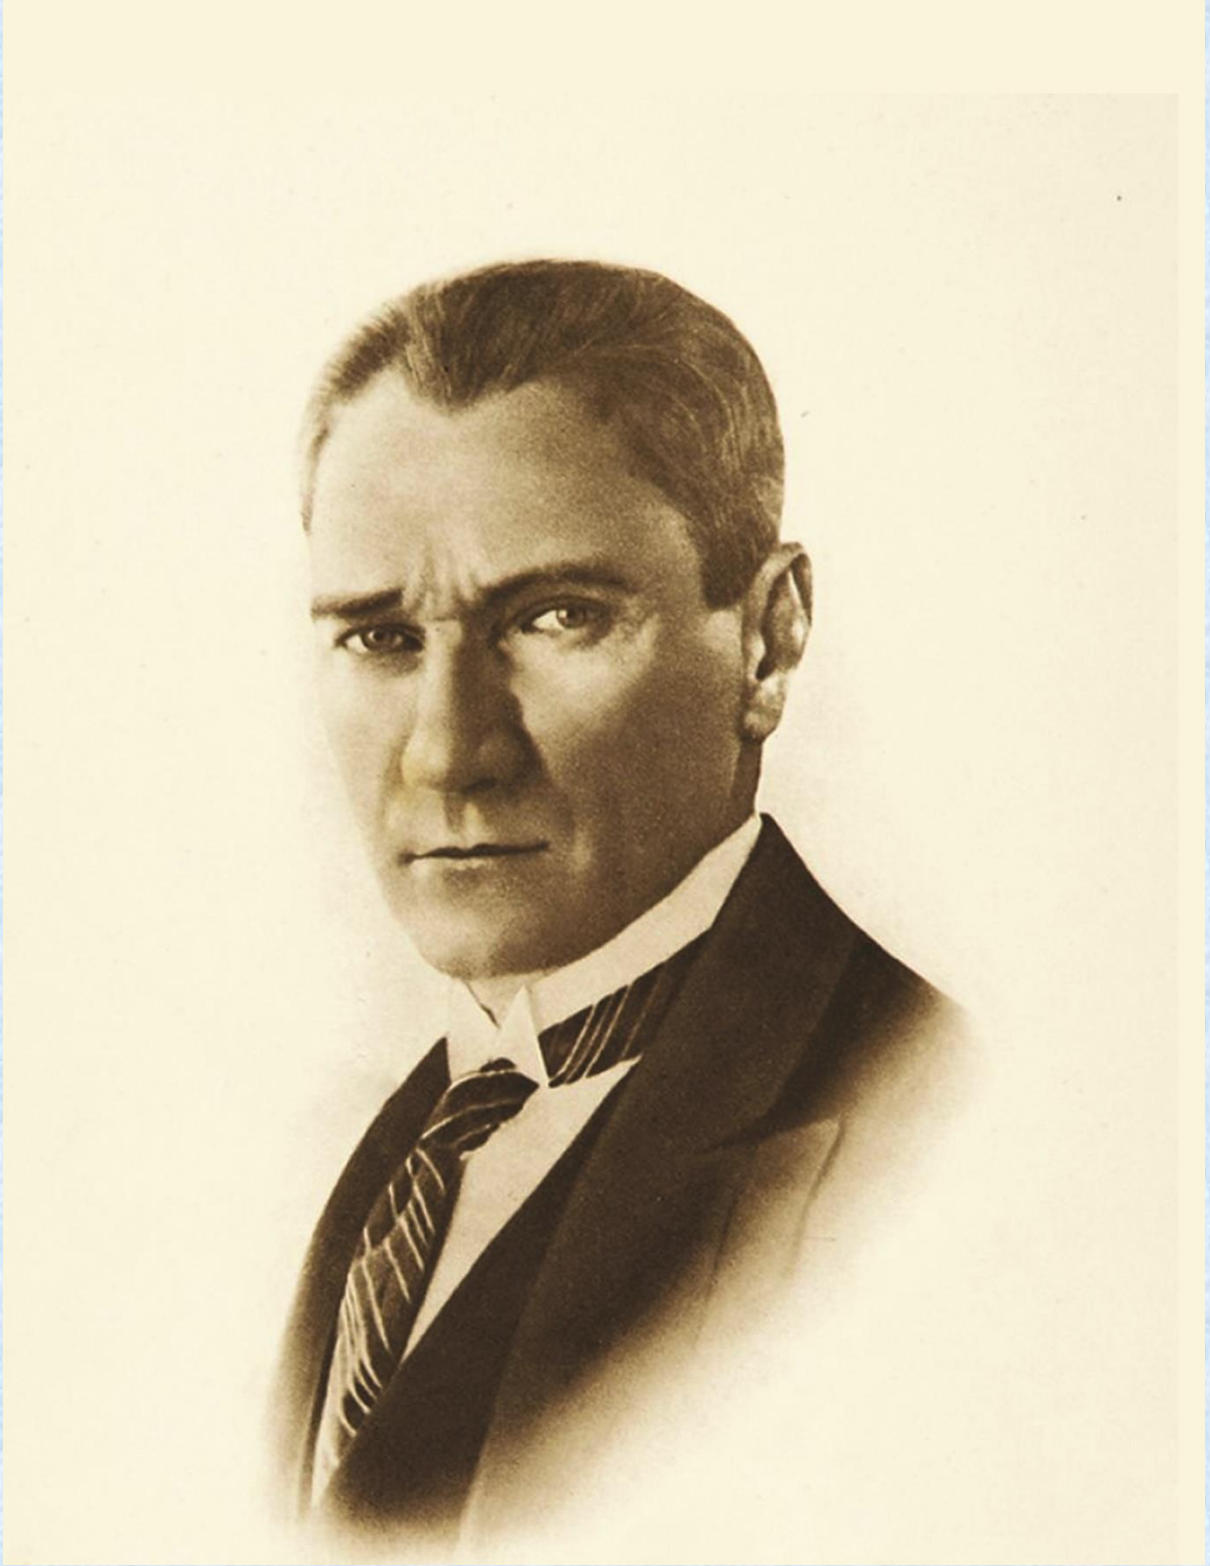

“Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamının yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK





## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

*23 Nisan 2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kendine özgü bir eğitim/öğretim/araştırma ekosistemi (TEKNOVERSİTE) oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyip tekniğe ve teknolojiye odaklanmış ve Endüstri 4.0'a eklenilen bir üniversite olmuştur.*

*Bu bağlamda bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunarak, inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.*

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi gereğince hazırlanması gereken 2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda; yatırım proje uygulamaları, sonuçları, ödenekleri, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ve karşılaşılan sorunlara yer verilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanmıştır.*

*Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için gereken özveriye gösteren tüm idari ve akademik personelimize teşekkür eder, 2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.*

**Prof. Dr. Türkay DERELİ**  
**Rektör**

# İÇİNDEKİLER

<b>1. GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>1</b>
1.1. Kuruluş Tarihçesi	1
1.2. Misyon ve Vizyon	2
1.3. Amaç ve Hedefler	3
1.4. Yatırımlarını Finansman Kaynakları	4
1.5. Mevcut Hizmet Kapasitesi	7
1.6. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	9
1.7. 2019 Yılı Genel Yatırım Uygulama Durumu	14
<b>2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI</b>	<b>14</b>
2.1. DEVAM EDEN PROJELER	14
2.1.1. Eğitim – Yükseköğretim Sektörü	14
a. Kampüs Altyapısı Projesi	14
b. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	17
2.1.2. Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	21
a. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	21
2.1.3. DKH- Teknolojik Araştırma Sektörü	22
a. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	22
2.2. TAMAMLANAN PROJELER	24
2.2.1. Eğitim – Yükseköğretim Sektörü	24
a. Çeşitli Ürünlerin Etüt Projesi	24
b. Muhtelif İşler Projesi	24
c. Yayın Alımı Projesi	32
2.3. Hibe Yatırım Projeleri	34
2.3.1. Hibe Yatırım Projeleri Kapsamında Yapılan Faaliyetler	34
a. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası	34
2.4. Tamamlanan Projeler Listesi	35
a. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	35
b. Kampüs Altyapısı Projesi	35
c. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	36
d. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	36
e. Muhtelif İşler Projesi	37
2.5. Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporları	38
<b>3. 2019 YILI YATIRIM PROGRAMIYLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER</b>	<b>43</b>



## TABLO DİZİNİ

<b>Tablo 1. 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı</b> -----	<b>5</b>
<b>Tablo 2. 2019 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları</b> -----	<b>6</b>
<b>Tablo 3. 2018 ve 2019 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu</b> -----	<b>6</b>
<b>Tablo 4. Taşınmaz Durumu (Açık Alan)</b> -----	<b>7</b>
<b>Tablo 5. Taşınmaz Durumu (Kapalı Alan)</b> -----	<b>8</b>
<b>Tablo 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu</b> -----	<b>10</b>
<b>Tablo 7. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu</b> -----	<b>10</b>
<b>Tablo 8. Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu</b> -----	<b>10</b>
<b>Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu (Bakım-Onarım)</b> -----	<b>11</b>
<b>Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu (Makine-Teçhizat)</b> ---	<b>12</b>
<b>Tablo 11. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)</b> -----	<b>12</b>
<b>Tablo 12. Yayın Alım Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu</b> -----	<b>13</b>
<b>Tablo 13. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu</b> -----	<b>13</b>
<b>Tablo 14. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu</b> ---	<b>13</b>
<b>Tablo 15. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler</b> -----	<b>14</b>
<b>Tablo 16. İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> -----	<b>15</b>
<b>Tablo 17. Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> -----	<b>15</b>
<b>Tablo 18. İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> -----	<b>16</b>
<b>Tablo 19. İSTE Stadyumu Altyapısı Kapsamında Saha Düzenlemesi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> -----	<b>16</b>
<b>Tablo 20. İSTE Gölet'i Kuyu Açılması ve Sulama Sistemi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> --	<b>16</b>
<b>Tablo 21. Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> -----	<b>17</b>
<b>Tablo 22. Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> -----	<b>17</b>
<b>Tablo 23. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler</b> -----	<b>17</b>
<b>Tablo 24. Mimarlık Fakültesi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> -----	<b>18</b>
<b>Tablo 25. Merkezi Kütüphane Yapım İş Proje Bilgi Tablosu</b> -----	<b>19</b>

<b>Tablo 26. Merkezi Yemekhane Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>20</b>
<b>Tablo 27. Kapalı Spor Kompleksi Yapım İŖi Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler</b>	<b>21</b>
<b>Tablo 28. Kapalı Spor Kompleksi Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>21</b>
<b>Tablo 29. Merkezi AraŖtırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler</b>	<b>22</b>
<b>Tablo 30. X-IŖını Difraktometre Cihazı Alımı İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>22</b>
<b>Tablo 31. Fırın Alımı İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>23</b>
<b>Tablo 32. 3 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>23</b>
<b>Tablo 33. Taramalı Elektron Mikroskobu Alımı İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>23</b>
<b>Tablo 34. ÇeŖitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler</b>	<b>24</b>
<b>Tablo 35. Muhtelif İŖler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler (Makine-Teçhizat)</b>	<b>24</b>
<b>Tablo 36. Denizcilik Meslek Yüksekokuluna DalıŖ BaŖlıđı ve Hava Kompresörü Alımı İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>25</b>
<b>Tablo 37. Akıllı Kütüphanesi Sistemi ve Cihaz Alımı İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>25</b>
<b>Tablo 38. Muhtelif İŖler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler (Bakım - Onarım)</b>	<b>26</b>
<b>Tablo 39. Köprü Üstü Simülasyon Merkezi Yapımı İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>27</b>
<b>Tablo 40. Barbaros Hayrettin Gemi İnŖaatı ve Denizcilik Fakültesi Su Deposu Onarımı Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>27</b>
<b>Tablo 41. ÇeŖitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İŖi-1 İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>28</b>
<b>Tablo 42. ÇeŖitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İŖi-2 İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>28</b>
<b>Tablo 43. Bilim ve Teknoloji AraŖtırma ve Uygulama Merkezi Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>28</b>
<b>Tablo 44. Çevre Aydınlatma Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>29</b>
<b>Tablo 45. İSTE Merkez Kampüsü ÇeŖitli Birimlerinde Bulunan Asansörlerinde Revizyon Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>29</b>
<b>Tablo 46. Dört Yol MYO Asansörlerinde Revizyon Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>29</b>
<b>Tablo 47. Merkezi Kütüphane Fotoselli Kapı ve Alüminyum Doğrama Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>30</b>
<b>Tablo 48. Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Kalorifer Sistemi Bakım ve Onarımı Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>30</b>



<b>Tablo 49. Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>31</b>
<b>Tablo 50. İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarımı Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>31</b>
<b>Tablo 51. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)</b>	<b>32</b>
<b>Tablo 52. Bilgi Sistemleri Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık, Teknik Açıklık Testleri ve SOME Eğitimi Hizmet Alımı İşi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>32</b>
<b>Tablo 53. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler</b>	<b>32</b>
<b>Tablo 54. Basılı Yayın Alımı 19. Madde İşi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>33</b>
<b>Tablo 55. Basılı Yayın Alımı 21. Madde (f) Bendi İşi Proje Bilgi Tablosu</b>	<b>33</b>
<b>Tablo 56. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası Bilgi Tablosu</b>	<b>34</b>
<b>Tablo 57. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler</b>	<b>35</b>
<b>Tablo 58. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler</b>	<b>35</b>
<b>Tablo 59. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kapsamında Tamamlanan Projeler</b>	<b>36</b>
<b>Tablo 60. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler</b>	<b>36</b>
<b>Tablo 61. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler</b>	<b>37</b>
<b>Tablo 62. Merkezi Kütüphane Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu</b>	<b>38</b>
<b>Tablo 63. Merkezi Yemekhane Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu</b>	<b>39</b>
<b>Tablo 64. Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu</b>	<b>40</b>
<b>Tablo 65. Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu</b>	<b>41</b>
<b>Tablo 66. Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu</b>	<b>42</b>
<b>Tablo 67. 2019 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu</b>	<b>44</b>



## 1.GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1. Kuruluş Tarihi

Üniversitemiz 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6640 sayılı Kanun ve 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek-160 maddesi ile kurulmuştur.

Üniversitemiz akademik birim olarak;

#### 7 Fakülte:

- Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- Turizm Fakültesi

#### 1 Yüksekokul:

- Yabancı Diller Yüksekokulu

#### 4 Meslek Yüksekokulu:

- Denizcilik Meslek Yüksekokulu
- Dörtüyl Meslek Yüksekokulu
- İskenderun Meslek Yüksekokulu
- Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

#### 1 Konservatuvar:

- Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı

#### 7 Enstitü:

- Bilişim Enstitüsü
- Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
- Demir-Çelik Enstitüsü
- Enerji Enstitüsü
- Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsünden oluşmaktadır.

Üniversitemiz idari birim olarak Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı;

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Personel Daire Başkanlığı
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği

- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi, 13.03.2017 tarihli ve 2017/10332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış olup; ilgili fakülte bünyesinde olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine bağlanmıştır.

2017 yılında:

- Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü
- Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
- İş Dünyası ile Entegrasyon (İDE) Genel Koordinatörlüğü kurulmuştur.

2018 yılında:

- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
- Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Ayrıca Yükseköğretim Genel Kurulunun 08.02.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kapatılmıştır.

18 Nisan 2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatılmış, Turizm Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

## 1.2. Misyon ve Vizyon

### ❖ Misyon

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin misyonu; **"bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmek"** olarak belirlenmiştir.

### ❖ Vizyon

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin vizyonu; **"Dörtlü Sarmal Modeli: Üniversite-sanayi-kamu-toplum" bütünleşmesini sağlayarak Türkiye'nin inovasyon odaklı kalkınma modeline katkı sağlayan, değer katan, tercih edilen, insanı ve inovasyonu önceleyen bir "Teknoersite" olmak"** olarak belirlenmiştir.




### 1.3. Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
<b>Stratejik Amaç-1</b> ➤ Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak	<b>Hedef-1</b> Mezun öğrenci sayısını ve mezunların mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğini arttırmak, mezunlarla iletişimi güçlendirmek
	<b>Hedef-2</b> Üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası etkinlik (sempozyum, kongre, sergi, konser vb.) sayısını arttırmak
	<b>Hedef-3</b> Bölümlerin doluluk oranlarını arttırmak
	<b>Hedef-4</b> Akredite bölüm ve laboratuvar sayısını arttırmak
	<b>Hedef-5</b> Kütüphane kaynaklarını arttırmak
<b>Stratejik Amaç-2</b> ➤ Bilimsel araştırma kapasitesini ve sanayi ile çalışma kabiliyetini güçlendirmek	<b>Hedef-1</b> Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak
	<b>Hedef-2</b> Üniversite fikri mülkiyet hakları çalışmalarını etkinleştirmek
	<b>Hedef-3</b> Akademisyen ve öğrencilerin araştırma desteklerinden daha fazla faydalanmasını sağlamak
	<b>Hedef-4</b> Üniversite sanayi ortaklı proje ve etkinlik sayısını arttırmak
	<b>Hedef-5</b> Akademisyen ve öğrencilerin şirketleşme sayılarını artırmak
<b>Stratejik Amaç-3</b> ➤ Uluslararası işbirliklerini ve hareketliliğini artırmak	<b>Hedef-1</b> Üniversitedeki yurtdışı doktoralı ve yabancı öğretim elemanı sayısını arttırmak
	<b>Hedef-2</b> Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak
	<b>Hedef-3</b> Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak
	<b>Hedef-4</b> Üniversite araştırma faaliyetlerinde aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısını arttırmak
	<b>Hedef-5</b> Üniversitenin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak
<b>Stratejik Amaç-4</b> ➤ Üniversitenin toplum ile olan bütünleşmesini sağlamak	<b>Hedef-1</b> Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak
	<b>Hedef-2</b> Üniversite tarafından verilen sertifikalı eğitim sayısını arttırmak
	<b>Hedef-3</b> Üniversite dışı kurumlarla (STK, belediye vb.) yürütülen ortak faaliyet sayısını arttırmak
	<b>Hedef-4</b> Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısını arttırmak
<b>Stratejik Amaç-5</b> ➤ Üniversitenin fiziksel, teknolojik ve insan kaynakları altyapısını tamamlamak ve güçlendirmek	<b>Hedef-1</b> Yerleşkelerin fiziksel altyapı olanaklarını tamamlamak ve iyileştirmek
	<b>Hedef-2</b> Üniversitenin bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
	<b>Hedef-3</b> Üniversitede nitelikli akademik ve idari personel sayısını arttırmak
	<b>Hedef-4</b> Üniversite yerleşkelerinin ekolojik denge gözetilerek yeşil ve sosyal alan altyapılarını düzenlemek

#### 1.4. Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

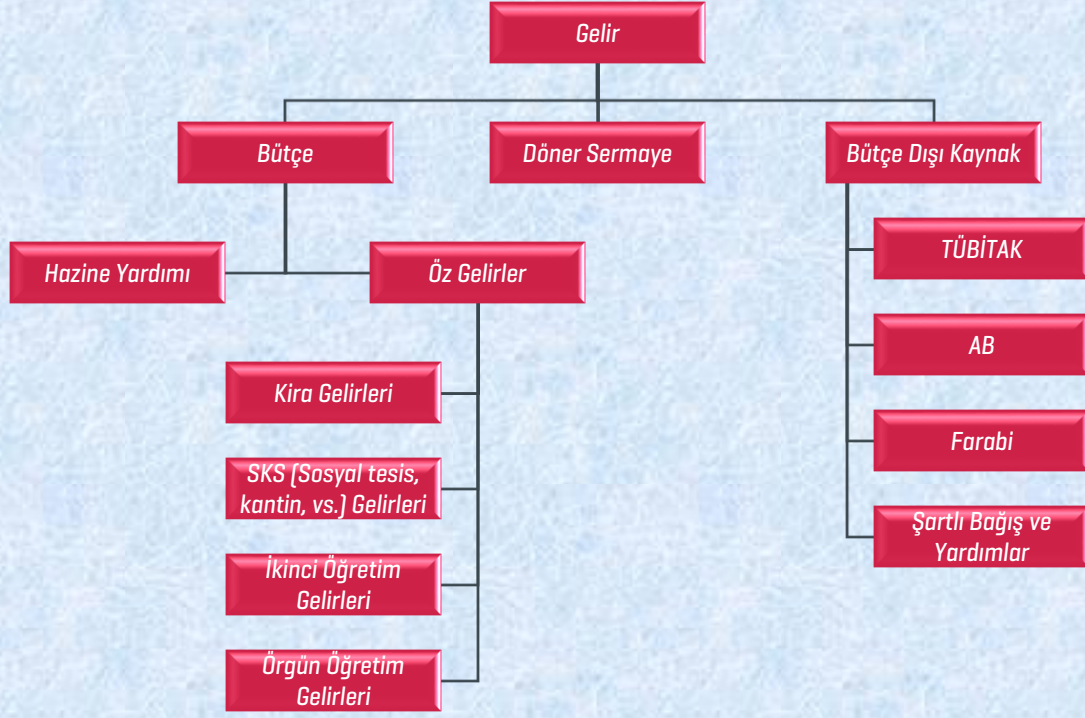




Üniversitemizin 2019 yılı yatırım projelerinin finansman kaynağına göre dağılımı Tablo 1'de gösterilmiştir.

**Tablo 1. 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı**

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2019 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları		
			Özel Bütçe		
			Hazine	Öz gelir	Toplam
Eğitim (Yükseköğretim)	2019H03-3441	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	₺500.000,00	-	₺500.000,00
	2019H03-3442	Muhtelif İşler Projesi	₺5.500.000,00	-	₺5.500.000,00
	2019H03-3443	Yayın Alımı Projesi	₺500.000,00	-	₺500.000,00
	2016H03-2681	Derslik ve Merkezi Birimler	₺26.150.000,00	-	₺26.150.000,00
	2016H03-2682	Kampüs Altyapısı	₺1.000.000,00	-	₺1.000.000,00
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)	2017H05-3604	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	₺4.000.000,00	-	₺4.000.000,00
DKH (Teknolojik Araştırma)	2017K12-15021	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	₺5.467.840,00	-	₺5.467.840,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>₺43.117.840,00</b>	<b>-</b>	<b>₺43.117.840,00</b>

2019 yılında yatırım projelerine ilişkin olarak, aktarma ve ekleme dahil tahsis edilen ödenek dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

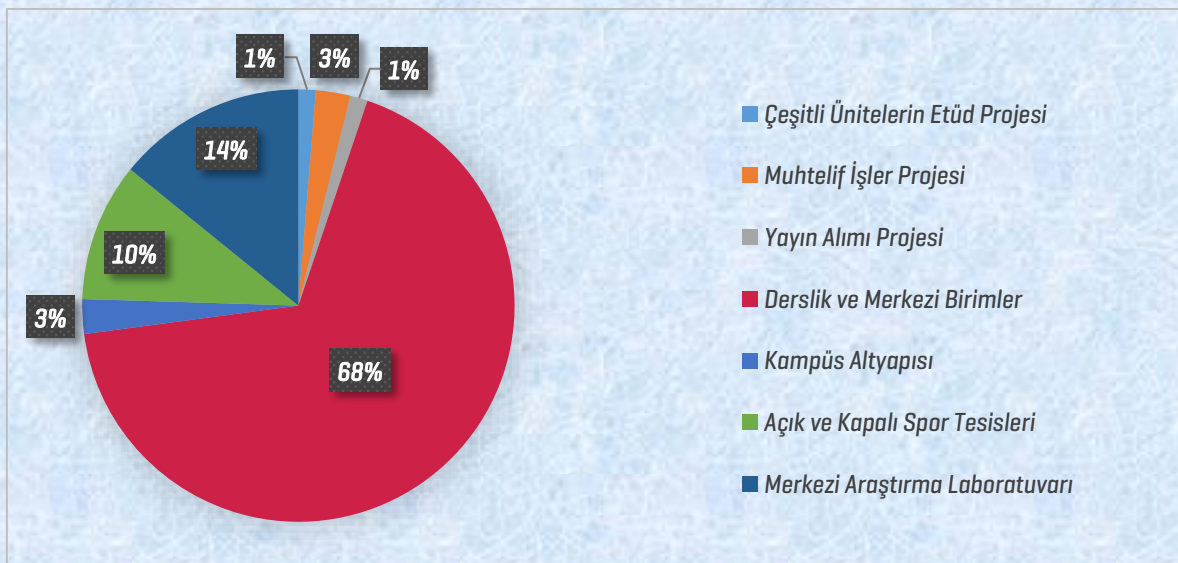

2019 yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları Tablo 2’de gösterilmiştir.

**Tablo 2. 2019 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları**

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı%
06.1	Mamul Mal Alımı	₺7.000.000	₺2.967.840	₺0	₺9.967.840	₺8.616.625	86,44
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	₺500.000	₺0	₺0	₺500.000	₺213.221	42,64
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	₺15.750.000	₺15.900.000	₺0	₺31.650.000	₺30.366.140	95,94
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	₺1.000.000	₺0	₺0	₺1.000.000	₺780.600	78,06
06	Sermaye Giderleri	₺24.250.000	₺18.867.840	₺0	₺43.117.840	₺39.976.586	92,71

2018 ve 2019 yılı yatırım harcamalarının gerçekleşme oranları tablo 3’te gösterilmiştir.

**Tablo 3. 2018 ve 2019 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu**

Proje Adı	2018 Yılı Yatırım Proje Bilgileri			2019 Yılı Yatırım Proje Bilgileri		
	Toplam Ödenek	2018 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı%	Toplam Ödenek	2019 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı%
<b>Eğitim Sektörü</b>	₺49.862.000	₺40.276.008	80,77	₺33.650.000	30.852.033	91,69
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	₺500.000	₺30.090	6,02	₺500.000	₺5.900	1,18
Derslik ve Merkezi Birimler	₺35.962.000	₺34.528.881	96,01	₺26.150.000	₺25.908.532	99,08
Kampüs Altyapısı	₺6.000.000	₺2.335.912	38,93	₺1.000.000	₺794.994	79,50
Muhtelif İşler	₺6.650.000	₺2.695.604	40,54	₺5.500.000	₺3.662.821	66,59
Yayın Alımı	₺750.000	₺685.521	91,42	₺500.000	₺479.785	95,96
<b>Spor Sektörü</b>	₺7.635.000	₺7.621.829	99,83	₺4.000.000	₺3.656.898	91,42
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	₺7.635.000	₺7.621.829	99,83	₺4.000.000	₺3.656.898	91,42
<b>DHK-Teknolojik Araştırma Sektörü</b>	₺5.200.000	₺2.232.160	42,93	₺5.467.840	₺5.467.840	100
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	₺5.200.000	₺2.232.160	42,93	₺5.467.840	₺5.467.840	100
<b>Genel Toplam</b>	₺62.697.000	₺50.129.997	79,96	₺43.117.840	₺39.976.586	92,71



### 1.5. Mevcut Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz hizmetlerini toplam 1.597.671,12 m<sup>2</sup>'lik yerleşke alanı üzerindeki 96.317,19 m<sup>2</sup>'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu açık alanların detayları Tablo 4'te verilmiştir.

**Tablo 4. Taşınmaz Durumu (Açık Alan)**

Sıra No	Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu [m <sup>2</sup> ]			2018	2019
		Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan [m <sup>2</sup> ]	Toplam Alan [m <sup>2</sup> ]
1	Merkez Yerleşke	-	798.311,84	-	790.794,83	798.311,84
2	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Yerleşkesi	-	10.000,23	-	10.000,23	10.000,23
3	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Yerleşkesi	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Tepe Yerleşke	85.216,03	104.563,29	-	189.779,32	189.779,32
5	Karayılan Yerleşkesi	23.615,08	-	-	23.615,08	23.615,08
6	Kuzuculu Yerleşkesi	-	556.860,00	-	556.860,00	556.860,00
7	Sarıseki Yerleşkesi	-	9.104,65	-	-	9.104,65
Genel Toplam		108.831,11	1.478.840,01	10.000,00	1.581.049,46	1.597.671,12

Üniversitemizin hizmet sunduğu kapalı alanların detayları Tablo 5'te verilmiştir.

**Tablo 5. Taşınmaz Durumu (Kapalı Alan)**

Sıra No	Yerleşke Adı	Hizmet Biriminin Adı	Yapım Yılı	Toplam Alan (m <sup>2</sup> )
1	Merkez Yerleşke	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	2009	15.113,39
		Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina (Makine Mühendisliği Hizmet Binası)	2012	8.284,00
		Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	2014	14.984,00
		Merkezi Kütüphane	2019	10.390,42
		Merkezi Yemekhane	2019	8.777,38
		Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi	2014	3.493,00
		Açık Spor Tesisleri	2012	6.487,00
2	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Yerleşkesi	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi	-	2.500,00
3	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı	2007	5.712,00
		İdari Bina	2007	464
4	Tepe Yerleşke	İskenderun Meslek Yüksekokulu	1990	9.976,00
		Kapalı Spor Salonu	1990	2.250,00
		Makine Bölümü Atölyesi	1990	460
		Otomotiv Bölümü Atölyesi	1990	310
		İnşaat Bölümü Atölyesi	1990	535
5	Kuzuculu Yerleşkesi	Dört Yol Meslek Yüksekokulu	2001	6.581,00
Genel Toplam				96.317,19

## 1.6. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında;** 2018 yılında başlanılan Merkez Kampüs 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması hizmet alımı 2019 yılında tamamlanmıştır.

**Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;** İhaleleri 2018 yılında yapılan ve yine aynı yıl içerisinde tamamlanan: İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi, Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali ve İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşlerine ilişkin kesin hesap ödemeleri 2019 yılında yapılmıştır. Yine aynı proje kapsamında: İSTE Stadyumu Altyapısı Kapsamında Saha Düzenlemesi, İSTE Göleti Kuyu Açılması ve Sulama Sistemi ve Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşlerine 2019 yılında başlanılarak tamamlanmıştır. İhalesi 2019 yılında yapılan Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşine ilişkin sözleşme ve yer teslimi işlemi aynı yapılmış olmakla birlikte yapım çalışmaları 2020 yılına kalmıştır.

**Muhtelif İşler Projesi kapsamında;** Üniversitemiz Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinin eğitim akreditasyonu kapsamında Fakülte hizmet binasında Köprü Üstü Simülasyon Merkezi yapılarak hizmete açılmıştır. Yine Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı Denizcilik Fakültesinde hizmet dışı kalan su deposu yapılarak hizmete alınmıştır. Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Elektrik Tesisatı Tadilatı, Çevre Aydınlatma işleri, İSTE Merkez Kampüsü Çeşitli Birimlerinde bulunan asansörler ile Dörtüyl Meslek Yüksekokulunda bulunan asansörlerin yenileme işleri tamamlanmıştır.

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İskenderun Meslek Yüksekokulu Makine Atölyesinde ihtiyaç konusu, onarım ve tadilat işleri ihale edilerek, yer teslimi yapılmıştır. Bu çalışmalardan Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülen büyük onarım çalışmaları 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılmış, İskenderun Meslek Yüksekokulu Makine Atölyesinde yürütülen çalışmalar 2020 yılına kalmıştır.

Televizyon, Dalış Başlığı ve Hava Kompresörü, Akıllı Kütüphane Sistemi ve Cihaz, Elektrikli Araç, Büro Mobilyası, Telsiz, Laboratuvar Malzemesi, Konteyner, Otomatik Tanımlama Sistemi Cihaz alımı yapılmıştır.

Ayrıca Üniversitemiz sistemlerinin lisans güncellemeleri ve yazılım alım işlemleri tamamlanmıştır.

**Merkezi Derslik ve Birimler Projesi kapsamında;** 2017 yılında ihalesi yapılan Merkezi Yemekhane, Merkezi Kütüphane hizmet binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Aynı proje kapsamında yer alan Mimarlık Fakültesi hizmet binası tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmiş olup, bu hizmet binasının geçici kabul ve hizmete alma işlemleri 2020 yılında yapılmıştır. Bu proje kapsamında yer alan Merkezi Derslik projesine ise, 2019 yılında ödenek sağlanamadığından başlanılmamıştır.



2019 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 6'da sunulmuştur.

**Tablo 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu**

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Proje No	2019H03-3441
Hedef	Yapılan İş
Merkez Kampüs İmar Planının Hazırlanarak, kampüsün 3194 sayılı imar Kanunu Uyarınca yapılaşma çalışmaları kapsamında yasal altyapısının tamamlanması	Merkez Kampüs İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı

2019 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 7'de sunulmuştur.

**Tablo 7. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu**

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	
Proje No	2016H03-2681
Hedef	Yapılan İş
Mimarlık Fakültesi Yapım İşinin Tamamlanarak Hizmete Açılması	Mimarlık Fakültesi hizmet binası tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmiş olup, bu hizmet binasının geçici kabul ve hizmete alma işlemleri 2020 yılında yapılacaktır.
Merkezi Kütüphane Yapım İşinin Tamamlanarak Hizmete Açılması	Merkezi Kütüphane hizmet binası 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Merkezi Yemekhane Yapım İşinin Tamamlanarak Hizmete Açılması	Merkezi Yemekhane hizmet binası 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 8'de sunulmuştur.

**Tablo 8. Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu**

Kampüs Altyapısı Projesi	
Proje No	2016H03-2682
Hedef	Yapılan İş
Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi Yapılması	İSTE Göleti Su Kuyusu Açılmaları, Sulama Sistemi Yapılmıştır.
	Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi kapsamında, 2.844 metrekare beton parke ile açık meydan düzenlemesi yapılmıştır.
	Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşleri kapsamında beton parke ve bordür yapılmış, ayrıca yürüyüş yolu yapımına devam edilmiştir.
Merkez Kampüs Saha Düzenlemesi Yapılması	İSTE Stadyumu Altyapısı Kapsamında Saha Düzenlemesi yapılmıştır.

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 9'da sunulmuştur.

**Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu (Bakım-Onarım)**

Muhtelif İşler Projesi (Bakım-Onarım)	
Proje No	2019H03-3442
Hedef	Yapılan İş
Köprü Üstü Simülasyon Merkezi Yapımı	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi tarafından yürütülen eğitim çalışmalarının uluslararası akreditasyonunun sağlanması amacıyla Fakülte hizmet binasında yapılan tadilat çalışması ile Köprü Üstü Simülasyon Merkezi yapılarak hizmete açılmıştır.
Barbaros Hayrettin GİDF Su Deposu Onarımı Yapım İşİ	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi hizmet binasında gayri faal hale gelen su deposu yapılan onarım çalışması yenilerek yeniden hizmete açılmıştır.
Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-1	Üniversitemiz kampüslerinde ve hizmet binalarında bulunan elektrik tesisatlarında meydana gelen arızalar giderilerek, birimlerin hizmete açık tutulması sağlanmıştır.
Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin aktif olarak hizmete girmesi ile birlikte, hizmet binasının elektrik tesisat altyapısında bir kısım tadilat ve yenileme çalışması yapılmıştır.
Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-2	Üniversitemiz kampüslerinde ve hizmet binalarında bulunan elektrik tesisatlarında meydana gelen arızalar giderilerek, birimlerin hizmete açık tutulması sağlanmıştır.
Çevre Aydınlatma	Üniversitemiz kampüslerinde ve hizmet binalarının çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu birimlerde ortaya çıkan ek ihtiyaçlar giderilmekle birlikte, arıza meydana gelen aydınlatma araçları onararak hizmetin devamı sağlanmıştır.
İSTE Merkez Kampüsü Çeşitli Birimlerinde Bulunan asansörlerinde Revizyon Yapım İşİ	Üniversitemiz Merkez Kampüsünde bulunan insan asansörün Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca yapılan periyodik muayene sonucu TS EN 81 - 80 standardı: Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kurallarına göre tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda mevcut asansörün ilgili standarda uygun hale getirilmesi için gerekli tadilat çalışmaları yapılarak hizmetin devamı sağlanmıştır.
Dörtüyl MYO Asansörlerinde Revizyon Yapım İşİ	Üniversitemiz Dörtüyl Meslek Yüksekokulunda bulunan insan asansörün Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca yapılan periyodik muayene sonucu TS EN 81 - 80 standardı: Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kurallarına göre tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda mevcut asansörün ilgili standarda uygun hale getirilmesi için gerekli tadilat çalışmaları yapılarak hizmetin devamı sağlanmıştır.
Merkezi Kütüphane Fotoselli Kapı ve Alüminyum Doğrama Yapım İşİ	2019 yılında hizmete açılan Merkezi Kütüphane hizmet binasında, kullanıma başlanmasıyla ortaya çıkan ek ihtiyaçlar yapılan tadilat çalışması giderilmiştir.
Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Kalarifer Sistemi Bakım ve Onarımı	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı konser salonunun ısıtmasını sisteminde meydana gelen arıza, yapılan onarım ve tadilat çalışmaları ile giderilerek binalarda yürütülen hizmetlerin devamı sağlanmıştır.
Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden gelen onarım ve tadilat talepleri; yapılan projelendirme çalışması sonrasında ihale edilerek çalışmalar tamamlanmıştır.
İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım	İskenderun Meslek Yüksekokulu Makine Atölyesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, onarım ve tadilat çalışmaları yapılarak giderilmiştir.

2019 yılı Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat) Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 10'da sunulmuştur.

**Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu (Makine-Teçhizat)**

Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	
Proje No	2019H03-3442
Hedef	Yapılan İş
Makine ve Teçhizat Alımı	Televizyon Alımı
	Denizcilik Meslek Yüksekokuluna Dalış Başlığı ve Hava Kompresörü Alımı
	Akıllı Kütüphane Sistemi ve Cihaz Alımı
Taşıt Alımı	Elektrikli Araç Alımı
Mefruşat Alımı	Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak üzere Büro Mobilyası Alımı
	DMO Büro Mobilyası Alımı
	DMO Büro Mobilyası Alımı
Üniversitemiz güvenlik tedbirlerinin artırılması	R/V İSTE Araştırma Gemisine 1 Eylül 2017 tarihli ve 26440 sayılı resmi gazetede yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi cihazının gemilere donatılmasına ve özelliklerine dair tebliğ hükümlerine göre ilgili cihazın alımı
	Telsiz Alım İşİ
Araştırma Geliştirme Demirbaş Alımı	Laboratuvar Malzemesi
Öğrencilere Alanlar Yapmak	Konteyner Alımı

2019 yılı Muhtelif İşler (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 11'de sunulmuştur.

**Tablo 11. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)**

Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)	
Proje No	2019H03-3442
Hedef	Yapılan İş
Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılan web otomasyonları, yazılım uygulamaları v.b program lisans ve lisans güncellemelerinin tamamlanması.	Üniversitemiz sistemleri ile ağının güvenliğini sağlamak amacı ile kullanılan Güvenlik Duvarı cihazının URL Filtreleme lisansının 1yıl süreliğine uzatılması, Microsoft Kampüs Lisansının satın alınarak kullanılan cihazlar için İşletim Sistemi ve Ofis yazılımı temini
	Üniversite ve bağlı birimlerince kullanılmak üzere gerekli olan yazılım programları satın alımı



2019 yılı Yayın Alım Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 12’de sunulmuştur.

**Tablo 12. Yayın Alım Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu**

Yayın Alım Projesi	
Proje No	2019H03-3443
Hedef	Yapılan İş
Basılı Yayın Alımı	2549 Adet Basılı Yayın Alımı 19. Madde
	5369 Adet Basılı Yayın Alımı 21/f. Madde

2019 yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 13’de sunulmuştur.

**Tablo 13. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu**

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	
Proje No	2017H05-3604
Hedef	Yapılan İş
Kapalı Spor Kompleksi Çalışmalarının %95 oranında tamamlanması	Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşleri 2017 yılı Aralık ayında ihale edilerek, çalışmalara 2018 yılı ocak ayında başlamıştır. Bununla birlikte 2019 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle çalışmalar durdurulmuş, yılsonunda sağlanan ilave ödenekle birlikte çalışmalara devam edilmiştir. Kapalı Spor Kompleksi yapım işleri kapsamında 2019 yılı sonu itibarıyla fiziki ilerleme %65 oranına ulaşmıştır.

2019 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 14’de sunulmuştur.

**Tablo 14. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler Tablosu**

Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Proje No	2017K12-15021
Hedef	Yapılan İş
Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine Laboratuvar Malzemesi Alımı	3 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı
	Taramalı Elektron Mikroskobuna ait KDV Ödemesi (Ankara Gümrük Müdürlüğü)
	X-Işını Difraktometre Cihazına ait KDV Ödemesi (Ankara Gümrük Müdürlüğü)
	X-Işını Difraktometre Cihazı Alımı
	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Güç Kaynağı Alımı
	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Fırın Alımı
	X-Işını Difraktometre Cihazı Alımı(%10 Akreditif kapatma)
	Numune Kaplama Cihazı Alımı
%10 Akreditif Serbest Bırakma (Taramalı Elektron Mikroskobu Değer Artımı)	

## 1.7. 2019 Yılı Genel Yatırım Uygulama Durumu

2019 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için ₺24.250.000 ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödenek toplamı ₺43.117.840'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten harcama ₺39.976.586 yapılmış, harcanmayan ₺3.141.254 ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Yapılan harcamanın ödeneğe oranı % 92,71'dir.

## 2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. DEVAM EDEN PROJELER

#### 2.1.1. Eğitim - Yükseköğretim Sektörü

##### a. Kampüs Altyapısı Projesi

2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 15'te sunulmuştur.

**Tablo 15. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

Proje No: 2016H03-2682 Kampüs Altyapısı				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşİ	Peyzaj	17.09.2018 - 30.11.2018	100
2	Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşİ	Kanalizasyon Hattı, Su İsale Hattı	18.09.2018 - 15.01.2019	100
3	İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşİ	Kampüs İçi Yol	23.07.2018 - 19.12.2018	100
4	İSTE Stadyumu Altyapısı Kapsamında Saha Düzenlemesi	Peyzaj	30.04.2019 - 06.05.2019	100
5	İSTE Göleti Kuyu Açılması ve Sulama Sistemi Yapım İşİ	Peyzaj	05.08.2019 - 07.08.2019	100
6	Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşİ	Kampüs İçi Yol ve Peyzaj	28.08.2019 - 25.12.2019	100
7	Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Peyzaj	16.12.2019 - 14.01.2019	100

2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşine ilişkin bilgiler Tablo 16'da sunulmuştur.

**Tablo 16. İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi	01.08.2018
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺489.844,00
Sözleşme Tarihi	13.09.2018
Yer Teslim Tarihi	17.09.2018
İşin Süresi	75 gün
İş Bitim Tarihi	30.11.2018
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibarıyla)	₺489.844,00
Fiziki Gerçekleşme	%100



2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 17'de sunulmuştur.

**Tablo 17. Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi	05.07.2018
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺980.511,00
Sözleşme Tarihi	13.09.2018
Yer Teslim Tarihi	18.09.2018
İşin Süresi	120 gün
İş Bitim Tarihi	15.01.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibarıyla)	₺980.511,00
Fiziki Gerçekleşme	%100



2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 18'de sunulmuştur.

**Tablo 18. İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi	11.06.2018
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺892.224,00
Sözleşme Tarihi	19.07.2018
Yer Teslim Tarihi	23.07.2019
İşin Süresi	150 gün
İş Bitim Tarihi	19.12.2018
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺892.224,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan İSTE Stadyumu Altyapısı Kapsamında Saha Düzenlemesi Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 19'da sunulmuştur.

**Tablo 19. İSTE Stadyumu Altyapısı Kapsamında Saha Düzenlemesi Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	30.04.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺40.082,00
Sözleşme Tarihi	30.04.2019
Yer Teslim Tarihi	30.04.2019
İşin Süresi	7 gün
İş Bitim Tarihi	06.05.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺40.082,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan İSTE Gölet'i Kuyu Açılması ve Sulama Sistemi Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 20'de sunulmuştur.

**Tablo 20. İSTE Gölet'i Kuyu Açılması ve Sulama Sistemi Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	05.08.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺56.714,00
Sözleşme Tarihi	05.08.2019
Yer Teslim Tarihi	05.08.2019
İşin Süresi	3 gün
İş Bitim Tarihi	07.08.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺56.714,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 21’de sunulmuştur.

**Tablo 21. Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi	25.07.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺399.401,00
Sözleşme Tarihi	27.08.2019
Yer Teslim Tarihi	28.08.2019
İşin Süresi	25.12.2019
İş Bitim Tarihi	120 gün
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺301.120,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 22’de sunulmuştur.

**Tablo 22. Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi	30.10.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺88.500,00
Sözleşme Tarihi	11.12.2019
Yer Teslim Tarihi	16.12.2019
İşin Süresi	30 gün
İş Bitim Tarihi	14.01.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺0,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

#### **b. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

2019 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 23’te sunulmuştur.

**Tablo 23. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

Proje No: 2019H03-2681 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Mimarlık Fakültesi Yapım İş	Eğitim (16985 m <sup>2</sup> )	23.08.2017- 30.03.2020	99
2	Merkezi Kütüphane Yapım İş	Kütüphane (11.500 m <sup>2</sup> )	23.08.2017- 09.04.2019	100
3	Merkezi Yemekhane Yapım İş	Sosyal Donatı (5.000 m <sup>2</sup> )	23.08.2017- 27.03.2019	100



2019 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Mimarlık Fakültesi Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 24'de sunulmuştur.

**Tablo 24. Mimarlık Fakültesi Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükölüğü (Kapalı Alan)	16.985 m <sup>2</sup>
İhale Tarihi	07.04.2017
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺30.657.000,00
Sözleşme Tarihi	23.08.2017
Yer Teslim Tarihi	08.09.2017
İşin Süresi	933 gün
İş Bitim Tarihi	30.03.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibarıyla)	₺29.712.751,00
Fiziki Gerçekleşme	% 99





2019 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 25'te sunulmuştur.

**Tablo 25. Merkezi Kütüphane Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükölçü (Kapalı Alan)	10.140 m <sup>2</sup>
İhale Tarihi	03.05.2017
İhale Bedeli (KDV Dahil)	₺25.602.739,00
Sözleşme Tarihi	23.08.2017
Yer Teslim Tarihi	06.09.2017
İş Süresi	580 gün
İş Bitim Tarihi	09.04.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibarıyla)	₺25.067.030,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100





2019 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Merkezi Yemekhane Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 26'da sunulmuştur.

**Tablo 26. Merkezi Yemekhane Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyüküğü (Kapalı Alan)	4.957 m <sup>2</sup>
İhale Tarihi	06.07.2017
İhale Bedeli (KDV Hariç)	₺15.865.850,00
Sözleşme Tarihi	23.08.2017
Yer Teslim Tarihi	06.09.2017
İşin Süresi	540 gün
İş Bitim Tarihi	27.03.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺15.865.850,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100





## 2.1.2. Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

### a. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2019 yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 27’de sunulmuştur.

**Tablo 27. Kapalı Spor Kompleksi Yapım İş Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

Proje No: 2017H05-3604 Kapalı Spor Kompleksi				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	<b>Kapalı Spor Kompleksi Yapım İş</b>	Spor Kompleksi	29.01.2018 - 09.06.2020	65

2019 yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yapılan Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 28’te sunulmuştur.

**Tablo 28. Kapalı Spor Kompleksi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü [Kapalı Alan]	7.203 m <sup>2</sup> [887 Seyirci Kapasiteli]
İhale Tarihi	08.12.2017
İhale Bedeli [K.D.V. Dahil]	₺20.090.922,00
Sözleşme Tarihi	23.01.2018
Yer Teslim Tarihi	29.01.2018
İşin Süresi	863 gün
İş Bitim Tarihi	09.06.2020
Yapılan Ödeme Tutarı [31.12.2019 itibarıyla]	₺11.278.728,00
Fiziki Gerçekleşme	% 65





### 2.1.3. DKH- Teknolojik Araştırma Sektörü

#### a. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

2019 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 29'da sunulmuştur.

**Tablo 29. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

Proje No:2017K12-15021 Merkezi Araştırma Laboratuvarı				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Taramalı Elektron Mikroskopuna ait KDV Ödemesi [Ankara Gümrük Müdürlüğü]	Laboratuvar Malzemesi Alımı	4.02.2019- 5.02.2019	100
2	X-Işını Difraktometre Cihazına ait KDV Ödemesi [Ankara Gümrük Müdürlüğü]	Laboratuvar Malzemesi Alımı	27.03.2019- 29.03.2019	100
3	X-Işını Difraktometre Cihazı Alımı	Laboratuvar Malzemesi Alımı	27.03.2019- 19.04.2019	100
4	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Güç Kaynağı Alımı	Laboratuvar Malzemesi Alımı	26.03.2019- 4.07.2019	100
5	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Fırın Alımı	Laboratuvar Malzemesi Alımı	7.05.2019- 4.07.2019	100
6	X-Işını Difraktometre Cihazı Alımı[%10 Akreditif kapatma]	Laboratuvar Malzemesi Alımı	27.03.2019- 7.10.2019	100
7	Numune Kaplama Cihazı Alımı	Laboratuvar Malzemesi Alımı	4.09.2019- 16.09.2019	100
8	%10 Akreditif Serbest Bırakma [Taramalı Elektron Mikroskobu Değer Artımı]	Laboratuvar Malzemesi Alımı	10.05.2019-13.11.2019	100
9	3 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı	Laboratuvar Malzemesi Alımı	28.06.2019-19.11.2019	100

2019 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yapılan X-Işını Difraktometre Cihazı Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 30'da sunulmuştur.

**Tablo 30. X-Işını Difraktometre Cihazı Alımı İş Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	16.10.2018
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺785.863,00
Sözleşme Tarihi	23.11.2018
İşin Süresi	2 yıl
İş Bitim Tarihi	23.11.2020
Yapılan Ödeme Tutarı [31.12.2019 itibarıyla]	₺785.863,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yapılan Fırın Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 31’de sunulmuştur.

**Tablo 31. Fırın Alımı İş Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	26.12.2018
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺472.000,00
Sözleşme Tarihi	14.02.2019
İşin Süresi	2 yıl
İş Bitim Tarihi	14.02.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺472.000,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yapılan 3 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 32’de sunulmuştur.

**Tablo 32. 3 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı İş Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	28.06.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺1.215.400,00
Sözleşme Tarihi	09..09.2019
İşin Süresi	2 yıl
İş Bitim Tarihi	15.09.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺1.215.400,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yapılan Taramalı Elektron Mikroskobu Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 33’te sunulmuştur.

**Tablo 33. Taramalı Elektron Mikroskobu Alımı İş Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	16.10.2018
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺2.357.589,00
Sözleşme Tarihi	12.11.2018
İşin Süresi	60 gün
İş Bitim Tarihi	13.01.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺2.357.589,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

## 2.2. TAMAMLANAN PROJELER

### 2.2.1. Eğitim – Yükseköğretim Sektörü

#### a. Çeşitli Ürünlerin Etüt Projesi

2019 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 34'te sunulmuştur.

**Tablo 34. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

Proje No: 2019H03-3441 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Merkez Kampüs İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı	Etüt-Proje	2018-2019	100

#### b. Muhtelif İşler Projesi

2019 yılı Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat) Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 35'te sunulmuştur.

**Tablo 35. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler (Makine-Teçhizat)**

Proje No: 2019H03-3442 Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Televizyon Alımı	Cihaz Alımı	14.02.2019-28.02.2019	100
2	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Laboratuvar Malzemesi	7.01.2019-5.03.2019	100
3	R/V İSTE Araştırma Gemisine 1 Eylül 2017 tarihli ve 26440 sayılı resmi gazetede yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi cihazının gemilere donatılmasına ve özelliklerine dair tebliğ hükümlerine göre ilgili cihazın alımı	Makine- Cihaz Alımı	19.03.2019-8.04.2019	100
4	Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak üzere Büro Mobilyası Alımı	Mefruşat Alımı	15.04.2019-26.04.2019	100
5	DMO Büro Mobilyası Alımı	Mefruşat Alımı	30.04.2019-30.07.2019	100
6	DMO Büro Mobilyası Alımı	Mefruşat Alımı	2.05.2019-19.09.2019	100
7	Konteyner Alımı		13.05.2019-21.05.2019	100
8	Telsiz Alım İşİ	Cihaz Alımı	26.06.2019-1.07.2019	100
9	Denizcilik Meslek Yüksekokuluna Dalış Başlığı ve Hava Kompresörü Alımı	Makine Cihaz Alımı	11.03.2019-6.08.2019	100
10	Akıllı Kütüphane Sistemi ve Cihaz Alımı	Cihaz Alımı	25.06.2019-20.11.2019	100
11	Elektrikli Araç Alımı	Taşıt Alımı	25.11.2019-31.12.2019	100



2019 yılı Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat) Projesi kapsamında yapılan Denizcilik Meslek Yüksekokuluna Dalış Başlığı ve Hava Kompresörü Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 36'da sunulmuştur.

**Tablo 36. Denizcilik Meslek Yüksekokuluna Dalış Başlığı ve Hava Kompresörü Alımı İş Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	11.03.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺348.100,00
Sözleşme Tarihi	15.06.2019
İşin Süresi	24 ay
İş Bitim Tarihi	15.06.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibarıyla)	₺348.100,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat) Projesi kapsamında yapılan Akıllı Kütüphane Sistemi ve Cihaz Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 37'de sunulmuştur.

**Tablo 37. Akıllı Kütüphane Sistemi ve Cihaz Alımı İş Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	23.07.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺542.800,00
Sözleşme Tarihi	27.08.2019
İşin Süresi	24 ay
İş Bitim Tarihi	27.08.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibarıyla)	₺542.800,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım - Onarım) Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 38’te sunulmuştur.

**Tablo 38. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler (Bakım - Onarım)**

Proje No: 2019H03-3442 Muhtelif İşler (Bakım Onarım)				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Köprü Üstü Simülasyon Merkezi Yapımı	Bakım-Onarım-Tadilat	08.02.2019 - 08.03.2019	100
2	Barbaros Hayrettin GİDF Su Deposu Onarımı Yapım İşİ	Bakım-Onarım-Tadilat	04.03.2019 - 03.04.2019	100
3	Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-1	Bakım-Onarım-Tadilat	27.07.2019 - 05.08.2019	100
4	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ	Bakım-Onarım-Tadilat	09.09.2019 - 16.09.2019	100
5	Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-2	Bakım-Onarım-Tadilat	10.09.2019 - 15.09.2019	100
6	Çevre Aydınlatma Yapım İşİ	Bakım-Onarım-Tadilat	22.10.2019 - 01.11.2019	100
7	İSTE Merkez Kampüsü Çeşitli Birimlerinde Bulunan Asansörlerinde Revizyon Yapım İşİ	Bakım-Onarım-Tadilat	13.12.2019 - 17.12.2019	100
8	Dörtüyl MYO Asansörlerinde Revizyon Yapım İşİ	Bakım-Onarım-Tadilat	10.12.2019 - 19.12.2019	100
9	Merkezi Kütüphane Fotoselli Kapı ve Alüminyum Doğrama Yapım İşİ	Bakım-Onarım-Tadilat	16.12.2019 - 19.12.2019	100
10	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Kalorifer Sistemi Bakım ve Onarımı	Bakım-Onarım-Tadilat	13.12.2019 - 20.12.2019	100
11	Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	Bakım-Onarım-Tadilat	15.11.2019 - 30.12.2019	100
12	İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım	Bakım-Onarım-Tadilat	17.12.2019 - 14.02.2020	100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Köprü Üstü Simülasyon Merkezi Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 39'de sunulmuştur.

**Tablo 39. Köprü Üstü Simülasyon Merkezi Yapımı İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	06.02.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺88.500,00
Sözleşme Tarihi	08.02.2019
Yer Teslim Tarihi	08.02.2019
İşin Süresi	30 gün
İş Bitim Tarihi	08.03.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺88.500,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Barbaros Hayrettin GİDF Su Deposu Onarımı Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 40'te sunulmuştur.

**Tablo 40. Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Su Deposu Onarımı Yapım İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	04.03.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺39.235,00
Sözleşme Tarihi	04.03.2019
Yer Teslim Tarihi	04.03.2019
İşin Süresi	30 gün
İş Bitim Tarihi	03.04.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺39.235,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100



2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-1 İşİne ilişkin proje bilgileri Tablo 41'de sunulmuştur.

**Tablo 41. Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-1 İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	05.07.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺40.700,00
Sözleşme Tarihi	24.07.2019
Yer Teslim Tarihi	24.07.2019
İşin Süresi	6 gün
İş Bitim Tarihi	05.08.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺40.700,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-2 İşİne ilişkin proje bilgileri Tablo 42'de sunulmuştur.

**Tablo 42. Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-2 İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	06.09.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺31.919,00
Sözleşme Tarihi	06.09.2019
Yer Teslim Tarihi	10.09.2019
İşin Süresi	5 gün
İş Bitim Tarihi	15.09.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺31.919,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİne ilişkin proje bilgileri Tablo 43'de sunulmuştur.

**Tablo 43. Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	09.09.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺40.622,00
Sözleşme Tarihi	09.09.2019
Yer Teslim Tarihi	09.09.2019
İşin Süresi	7 gün
İş Bitim Tarihi	16.09.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺40.622,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Çevre Aydınlatma Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 44'te sunulmuştur.

**Tablo 44. Çevre Aydınlatma Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	22.10.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺58.083,00
Sözleşme Tarihi	22.10.2019
Yer Teslim Tarihi	22.10.2019
İşin Süresi	10 gün
İş Bitim Tarihi	01.11.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺58.083,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan İSTE Merkez Kampüsü Çeşitli Birimlerinde Bulunan Asansörlerinde Revizyon Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 45'te sunulmuştur.

**Tablo 45. İSTE Merkez Kampüsü Çeşitli Birimlerinde Bulunan Asansörlerinde Revizyon Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	22.10.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺11.440,00
Sözleşme Tarihi	13.12.2019
Yer Teslim Tarihi	13.12.2019
İşin Süresi	5 gün
İş Bitim Tarihi	17.12.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺11.440,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Dört Yol MYO Asansörlerinde Revizyon Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 46'da sunulmuştur.

**Tablo 46. Dört Yol MYO Asansörlerinde Revizyon Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	10.12.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺17.051,00
Sözleşme Tarihi	10.12.2019
Yer Teslim Tarihi	10.12.2019
İşin Süresi	10 gün
İş Bitim Tarihi	19.12.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺17.051,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100



2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Fotoselli Kapı ve Alüminyum Doğrama Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 47’de sunulmuştur.

**Tablo 47. Merkezi Kütüphane Fotoselli Kapı ve Alüminyum Doğrama Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	16.12.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺103.906,00
Sözleşme Tarihi	16.12.2019
Yer Teslim Tarihi	16.12.2019
İşin Süresi	4 gün
İş Bitim Tarihi	19.12.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺103.906,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Kalarifer Sistemi Bakım ve Onarımı Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 48’te sunulmuştur.

**Tablo 48. Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Kalarifer Sistemi Bakım ve Onarımı Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu**

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi (Doğrudan Temin)	13.12.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺40.350,00
Sözleşme Tarihi	13.12.2019
Yer Teslim Tarihi	13.12.2019
İşin Süresi	10 gün
İş Bitim Tarihi	20.12.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺40.350,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 49'da sunulmuştur.

**Tablo 49. Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi	30.10.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺347.676,00
Sözleşme Tarihi	14.12.2019
Yer Teslim Tarihi	05.12.2019
İşin Süresi	45 gün
İş Bitim Tarihi	30.12.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺308.793,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bakım-Onarım) Projesi kapsamında yapılan İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarımı Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 50'de sunulmuştur.

**Tablo 50. İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarımı Yapım İş Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	-
İhale Tarihi	30.10.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺116.422,00
Sözleşme Tarihi	13.12.2019
Yer Teslim Tarihi	17.12.2019
İşin Süresi	60 gün
İş Bitim Tarihi	14.02.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺0,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100



2019 yılı Muhtelif İşler (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 51’de sunulmuştur.

**Tablo 51. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)**

Proje No: 2019H03-3442 Muhtelif İşler (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Renkli Fotokopi Baskı Makinesi ve Lazer Yazıcı Alımı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	02.05.2019-07.05.2019	100
2	Masaüstü Bilgisayar Seti ve Projeksiyon Cihazları Alımı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	04.10.2019-13.11.2019	100
3	Kablosuz Ağ Erişim Cihazları Alımı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	14.10.2019-20.12.2019	100
4	Yedekleme Ünitesi Disk Alımı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	18.09.2019-27.11.2019	100

2019 yılı Muhtelif İşler (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Projesi kapsamında yapılan Bilgi Sistemleri Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık, Teknik Açıklık Testleri ve SOME Eğitimi Hizmet Alımı İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 52’de sunulmuştur.

**Tablo 52. Bilgi Sistemleri Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık, Teknik Açıklık Testleri ve SOME Eğitimi Hizmet Alımı İş Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	15.03.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺87.320,00
Sözleşme Tarihi	16.04.2019
İşin Süresi	240 gün
İş Bitim Tarihi	20.12.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibarıyla)	₺87.320,00
Fiziki Gerçekleşme	%100

### c. Yayın Alımı Projesi

2019 yılı Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 53’te sunulmuştur.

**Tablo 53. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

Proje No: 2019H03-3443 Yayın Alımı				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Basılı Yayın Alımı	Yayın Alımı	01.01.2019-31.12.2019	% 100

2019 yılı Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan Basılı Yayın Alımı 19. Madde İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 54’te sunulmuştur.

**Tablo 54. Basılı Yayın Alımı 19. Madde İşİ Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	30.09.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺234.589,86
Sözleşme Tarihi	30.10.2019
İşin Süresi	180 gün
İş Bitim Tarihi	30.04.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺234.589,86
Fiziki Gerçekleşme	%100

2019 yılı Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan Basılı Yayın Alımı 21. Madde (f) Bendi İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 55’te sunulmuştur.

**Tablo 55. Basılı Yayın Alımı 21. Madde (f) Bendi İşİ Proje Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	03.12.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	₺174.716,34
Sözleşme Tarihi	13.12.2019
İşin Süresi	180 gün
İş Bitim Tarihi	13.06.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2019 itibariyle)	₺174.716,34
Fiziki Gerçekleşme	%100



## 2.3. Hibe Yatırım Projeleri

### 2.3.1. Hibe Yatırım Projeleri Kapsamında Yapılan Faaliyetler

#### a. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası

Üniversitemiz ve hayırsever Nuri ÜYSEN arasında imzalan protokol ile Merkez Kampüste Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası'nın yapımına karar verilmiştir. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası'nın yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanılmış olup, 2020 yılında yapım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası Yapım İşine ilişkin proje bilgileri Tablo 56'da sunulmuştur.

**Tablo 56. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	1.520,00 m <sup>2</sup>
Bağışçı	Nuri ÜYSEN
Yapım Maliyeti	₺2.166.000,00 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Birim Fiyatları İle)
İşe Başlama Tarihi	27.07.2017
İş Bitiş Tarihi	-
Durum	Ek Protokol kapsamında süre verilmiş olup, devam ediyor.



## 2.4. Tamamlanan Projeler Listesi

### a. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2019 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 57’de sunulmuştur.

**Tablo 57. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler**

Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2016H03-2681	Merkezi Kütüphane	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Merkezi Yemekhane	

### b. Kampüs Altyapısı Projesi

2019 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 58’de sunulmuştur.

**Tablo 58. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler**

Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2016H03-2682	İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşİ	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşİ	
	İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşİ	
	İSTE Stadyumu Altyapısı Kapsamında Saha Düzenlemesi	
	İSTE Göleti Kuyu Açılması ve Sulama Sistemi Yapım İşİ	
	Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşİ	



### c. Merkezi Arařtırma Laboratuvarı Projesi

2019 yılı Merkezi Arařtırma Laboratuvarı projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere iliřkin bilgiler Tablo 59'da sunulmuřtur.

**Tablo 59. Merkezi Arařtırma Laboratuvarı Kapsamında Tamamlanan Projeler**

Baęlı Olduęu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluř
2017K12-1502	Taramalı Elektron Misroskobuna ait KDV Ödemesi (Ankara Gümrük Müdürlüęü)	İskenderun Teknik Üniversitesi
	X-Iřını Difraktometre Cihazına ait KDV Ödemesi (Ankara Gümrük Müdürlüęü)	
	X-Iřını Difraktometre Cihazı Alımı	
	Bilim ve Teknoloji Arařtırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüęüne Güç Kaynaęı Alımı	
	Bilim ve Teknoloji Arařtırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüęüne Fırın Alımı	
	X-Iřını Difraktometre Cihazı Alımı(%10 Akreditif kapatma)	
	Numune Kaplama Cihazı Alımı	
	%10 Akreditif Serbest Bırakma (Taramalı Elektron Mikroskobu Deęer Artımı)	
3 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı		

### d. Çeřitli Ünitelerin Etüt Projesi

2019 yılı Çeřitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere iliřkin bilgiler Tablo 60'ta sunulmuřtur.

**Tablo 60. Çeřitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler**

Baęlı Olduęu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluř
2019H03-3441	Merkez Kampüs İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi



### e. Muhtelif İşler Projesi

2019 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 61'de sunulmuştur.

**Tablo 61. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler**

Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2019H03-3442 (Makine- Teçhizat)	Televizyon Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Laboratuvar Malzemesi Alımı	
	R/V İSTE Araştırma Gemisine 1 Eylül 2017 tarihli ve 26440 sayılı resmi gazetede yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi cihazının gemilere donatılmasına ve özelliklerine dair tebliğ hükümlerine göre ilgili cihazın alımı	
	Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak üzere Büro Mobilyası Alımı	
	DMO Büro Mobilyası Alımı	
	DMO Büro Mobilyası Alımı	
	Konteyner Alımı	
	Telsiz Alım İşİ	
	Denizcilik Meslek Yüksekokuluna Dalış Başlığı ve Hava Kompresörü Alımı	
	Akıllı Kütüphane Sistemi ve Cihaz Alımı	
	Elektrikli Araç Alımı	
	Renkli Fotokopi Baskı Makinesi ve Lazer Yazıcı Alımı	
	Masaüstü Bilgisayar Seti ve Projeksiyon Cihazları Alımı	
	Kablosuz Ağ Erişim Cihazları Alımı	
	Yedekleme Ünitesi Disk Alımı	
2019H03-3442 (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)	Güvenlik Duvarı cihazı URL Filtreleme lisansı güncellemesi	
	Microsoft Lisansı	
	Öğrenci İşleri Web Otomasyonu Güncellemesi	
	Antivirüs Yazılımı Alımı	
Üniversite Birimlerine Yazılım Programı Alımı		
2019H03-3442 (Bakım-Onarım)	Köprü Üstü Simülasyon Merkezi Yapımı	
	Barbaros Hayrettin GİDF Su Deposu Onarımı Yapım İşİ	
	Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-1	
	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ	
	Çeşitli Birimlerde Elektrik Tesisatı Tadilatı Yapım İşİ-2	
	Çevre Aydınlatma Yapım İşİ	
	İSTE Merkez Kümpüsü Çeşitli Birimlerinde Bulunan Asansörlerinde Revizyon Yapım İşİ	
	Dârtıyol MYO Asansörlerinde Revizyon Yapım İşİ	
	Merkezi Kütüphane Fotoselli Kapı ve Alüminyum Doğrama Yapım İşİ	
	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Kalorifer Sistemi Bakım ve Onarımı	
Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ		

## 2.5. Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporları

Merkezi Kütüphane Yapım İşine ait Proje Tamamlanma Raporu Tablo 62'de sunulmuştur.

**Tablo 62. Merkezi Kütüphane Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri					Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2016H03-2681					
Proje Adı	Merkezi Kütüphane					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim/Merkezi Derslik ve Birimler					
Proje Amacı	Öğrenci, akademik personel ve diğer paydaşlara hizmet sunabilecek; eğitim-öretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve kültürel etkinliklerin yapılmasına imkan sağlayan bir hizmet birimi oluşturmak.					
Proje Yeri	İskenderun/Hatay					
Karakteristiği	Kütüphane (11.500 m <sup>2</sup> )					
Fiziki Hedefi	10.140 m <sup>2</sup> hizmet bina					
Başlama-Bitiş Tarihi	06.09.2017-09.04.2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi	23.08.2017		İhale Sözleşme Bedeli		₺25.602.739,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
₺25.602.739,00						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2016						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkanları artırılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkanları artırılmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

Merkezi Yemekhane Yapım İşine ait Proje Tamamlanma Raporu Tablo 63'te sunulmuştur.

**Tablo 63. Merkezi Yemekhane Yapım İşİ Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
<b>Proje No</b>	2016H03-2681					
<b>Proje Adı</b>	Merkezi Yemekhane					
<b>Sektör/Alt Sektör</b>	Eğitim-Yüksek Öğretim/Merkezi Derslik ve Birimler					
<b>Proje Amacı</b>	Öğrenci, akademik personel ve diğer paydaşlara hizmet sunabilecek nitelik ve nicelikte, yemeğin hazırlanmasının ve sunumunun aynı yerde yapılabilmesi; ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılmasına hizmet edebilecek bir hizmet binası yapmak.					
<b>Proje Yeri</b>	İskenderun/Hatay					
<b>Karakteristiği</b>	Sosyal Donatı (5.000 m <sup>2</sup> )					
<b>Fiziki Hedefi</b>	4.957 m <sup>2</sup> hizmet binası					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	06.09.2017-27.03.2019					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	23.08.2017		İhale Sözleşme Bedeli		₺15.865.850,00	
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
₺15.865.850,00						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
<b>Programa Alındığı Yıl</b>						
<b>2016</b>						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda</b>	Beslenme ve sosyal fiziki altyapı imkânları artırılmıştır.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları</b>	Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkânları artırılmıştır.					
<b>Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşmıştır.					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	-					



Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu  
Tablo 64'te sunulmuştur.

**Tablo 64. Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
<b>Proje No</b>	2019H03-3442					
<b>Proje Adı</b>	Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi					
<b>Sektör/Alt Sektör</b>	Eğitim-Yüksek Öğretim/Muhtelif İşler					
<b>Proje Amacı</b>	Araştırma ve eğitim binalarının hizmete hazır halde tutulması ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre kapasite artışı ile fonksiyonel değişiklik yapısı					
<b>Proje Yeri</b>	İskenderun/Hatay					
<b>Karakteristiği</b>	Büyük Onarım					
<b>Fiziki Hedefi</b>	-					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	15.11.2019- 30.12.2019					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	14.12.2019		İhale Sözleşme Bedeli		₺347.676,00	
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	₺347.676,00					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
<b>Programa Alındığı Yıl</b>						
<b>2019</b>						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda</b>	Hizmetin devamlılığının sağlanması, kapasite artışı ve ek fonksiyon kazandırılması.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları</b>	Hizmetin devamlılığının sağlanması, kapasite artışı ve ek fonksiyon kazandırılması.					
<b>Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	-					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	-					

Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu Tablo 65'te sunulmuştur.

**Tablo 65. Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
<b>Proje No</b>	2016H03-2682					
<b>Proje Adı</b>	Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi					
<b>Sektör/Alt Sektör</b>	Eğitim-Yüksek Öğretim/Kampüs Altyapısı					
<b>Proje Amacı</b>	Merkez Kampüs içerisinde peyzaj düzenlmesi ve beton parke ile yol kaplaması yapılması					
<b>Proje Yeri</b>	İskenderun/Hatay					
<b>Karakteristiği</b>	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı					
<b>Fiziki Hedefi</b>	-					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	28.08.2019 - 25.12.2019					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	27.08.2019		İhale Sözleşme Bedeli		₺399.401,00	
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	₺399.401,00					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
<b>Programa Alındığı Yıl</b>						
<b>2016</b>						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda</b>	Kampüs içi yol yapımı ve peyzaj düzenlemesi					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları</b>	Kampüs içi yol yapımı ve peyzaj düzenlemesi					
<b>Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	İklimsel sorunlarla karşılaşmıştır.					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	-					

Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu Tablo 66'da sunulmuştur.

**Tablo 66. Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
<b>Proje No</b>	2016H03-2682					
<b>Proje Adı</b>	Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşi					
<b>Sektör/Alt Sektör</b>	Eğitim-Yüksek Öğretim/Kampüs Altyapısı					
<b>Proje Amacı</b>	Merkez Kampüs çevre duvarının tamamlanarak, kampüs güvenliğinin sağlanması, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebekesinin genişletilmesi.					
<b>Proje Yeri</b>	İskenderun/Hatay					
<b>Karakteristiği</b>	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı					
<b>Fiziki Hedefi</b>	-					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	18.09.2018-15.01.2019					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	13.09.2018		İhale Sözleşme Bedeli		₺980.511,00	
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	₺980.511,00					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
<b>Programa Alındığı Yıl</b>						
<b>2016</b>						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda</b>	Merkez Kampüs çevre duvarının tamamlanarak, kampüs güvenliğinin sağlanması, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebekesinin genişletilmesi.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları</b>	Merkez Kampüs çevre duvarının tamamlanarak, kampüs güvenliğinin sağlanması, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebekesinin genişletilmesi.					
<b>Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	İklimsel sorunlarla karşılaşmıştır.					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	-					



### 3. 2019 YILI YATIRIM PROGRAMIYLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER

Çok yıllı proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesinin; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olduğu düşünülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin [1] fıkrasında; "21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz" denilmektedir. Bu durumun; Kamu İhale Kurulu'nun görüşü gereken hallerde, ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olduğu, ayrıca aciliyet arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Firmaların yüksek ihale tenzilatları nedeniyle işin yapım aşamasında güçlükler yaşanmaktadır. Döviz fiyatlarında olan dalgalanmalar nedeniyle başta inşaat demiri olmak üzere özellikle elektrik ve mekanik tesisat fiyatlarında olan beklenmeyen artışlar, inşaat maliyetlerinin artışına neden olmaktadır.

Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan Üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca hızlı karşılanması, bu Üniversitelerin fiziksel kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini sağlayacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna yönelik bazı değişiklikler yapılmasının sorunun çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir.

Üniversitemizin 2019 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu Tablo 67'de gösterilmiştir.

**Tablo 67. 2019 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (\*1000 TL.)**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Yıl Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	Toplam
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Haberleşme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	6	-	₺114.805	-	-	₺47.898	-	-	₺21.750	-	-	₺15.900(+)	-	-	₺34.508
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devlet Kamu Hizmetleri (DKH)	1	-	₺9.400	-	-	₺2.232	-	-	₺2.500	-	-	₺2.968(+)	-	-	₺5.468
DKH-İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DKH-Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Genel Toplam</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>₺124.205</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₺50.130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₺24.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₺26.197(+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>₺39.976</b>

# İSTE

teknoversite



**İSKENDERUN TEKNİK**  
**ÜNİVERSİTESİ**

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Merkez Kampüs 31200 İskenderun, Hatay  
T: 0 [326] 613 56 00 | F: 0 [326] 613 56 13  
[www.iste.edu.tr](http://www.iste.edu.tr)
