

## İÇİNDEKİLER

<b>1. GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>3</b>
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	3
1.2- Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi .....	4
1.3- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	5
1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	7
1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	7
1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	7
<b>2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI .....</b>	<b>8</b>
2.1 Devam Eden Projeler.....	8
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri .....	8
2.2 Tamamlanan Projeler.....	11
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi .....	11
2.2.2 Proje Tamamlanma Raporu .....	11
<b>3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK .....</b>	<b>14</b>

## TABLO DİZİNİ

<b>Tablo 1-</b> 2016 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar.....	3
<b>Tablo 2-</b> Taşınmaz Durumu.....	5
<b>Tablo 3-</b> İnşaatı Devam Eden-Tamamlanan Projeler .....	6
<b>Tablo 4-</b> Bina Bakım-Onarım Giderleri .....	8
<b>Tablo 5-</b> Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları .....	9
<b>Tablo 6-</b> Bilgisayar Alımları.....	9
<b>Tablo 7-</b> Laboratuvar Cihazı Alımları .....	10
<b>Tablo 8-</b> Taşıt Alımları .....	10
<b>Tablo 9-</b> Tamamlanan Projelerin Listesi .....	11
<b>Tablo 10-</b> Proje Tamamlanma Raporu .....	12
<b>Tablo 11-</b> Proje Tamamlanma Raporu .....	13
<b>Tablo 12-</b> 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özeti .....	15

## GRAFİKLER

<b>Grafik 1-</b> Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılımı.....	4
---	---

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 2016 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı;

A- Özel Bütçe

1. Hazine Yardımı
2. Öz Gelir
3. Bağış

Üniversitemizin 2016 yılına ait proje, ödenek ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir.


2016 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar

Tablo 1

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2016 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları			
			Özel Bütçe			Toplam
			Hazine	Öz gelir	Bağış	
Eğitim-Yükseköğretim	2016H032670	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.700.000,00
	2016H032700	Muhtelif İşler Projesi	6.800.000,00	80.000,00	0,00	6.880.000,00
	2016H032710	Yayın Alımı Projesi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2016H032680	Derslik ve Merkezi Birimler	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2016H032690	Kampüs Altyapısı	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Genel Toplam			14.000.000,00	80.000,00	200.000,00	14.280.000,00

2016 yılında yatırım projelerine ilişkin olarak, aktarma ve ekleme dahil tahsis edilen ödenek dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

## Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği

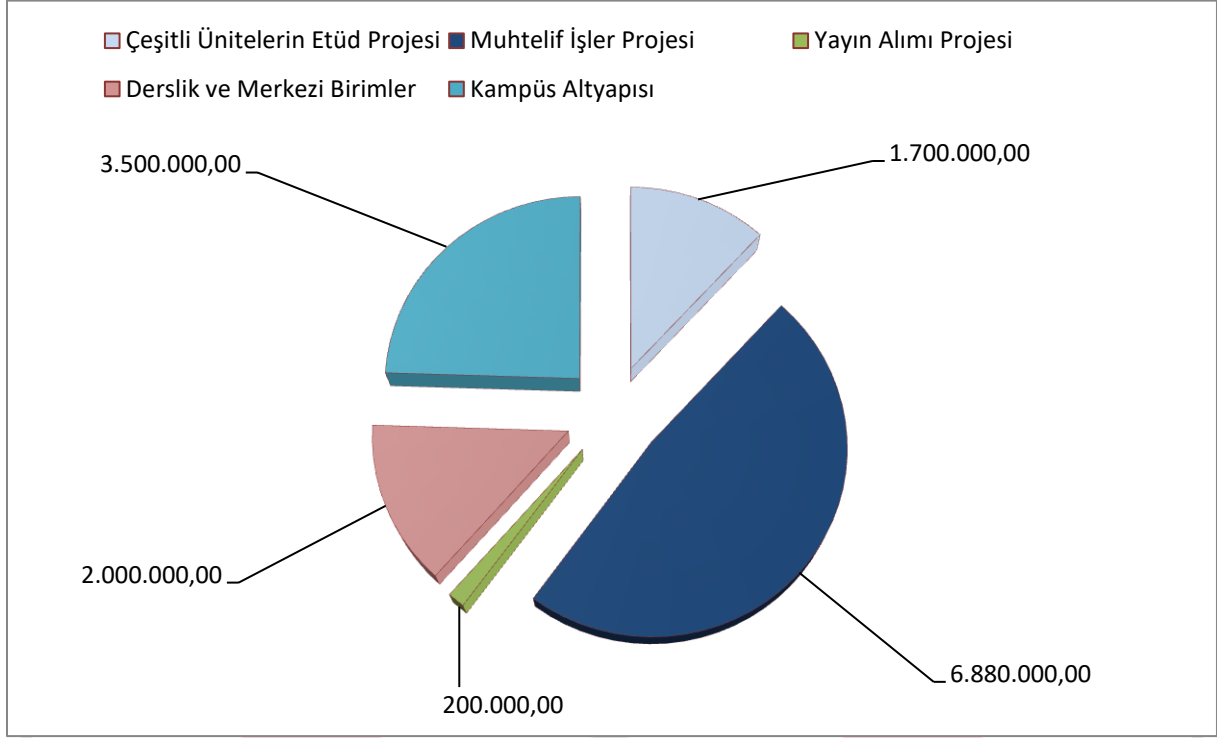

### 1.2- Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi

Üniversite; 6 Fakülte, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 4 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Bu birimler, hizmetlerini toplam 1.671.813,69 m<sup>2</sup>'lik yerleşke alanı üzerindeki 98.140 m<sup>2</sup>'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitenin hizmet sunduğu açık ve kapalı alanların detayları Tablo 2'de verilmiştir.

**Taşınmaz Durumu****Tablo 2**

Mevcut Yerleşkeler		Mülkiyet Durumu	Açıklama	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Yerleşke Alanı (m <sup>2</sup> )
Merkezi Yerleşkesi	Hazine	Hazine	Kampüs Yerleşkesi	34.432,00	790.794,83
	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi				
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı				
	Açık Spor Tesisleri				
Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi		Hazine		2.500,00	10.000,00
Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı		Hazine		10.000,00	10.000,00
İskenderun Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi		Üniversite	104.563,29 m <sup>2</sup> Hazine Mülkiyeti	19.240,00	210.694,29
Dörtüol Meslek Yüksekokulu		Hazine		6.581,00	626.709,26
<b>Genel Toplam</b>				<b>98.140,00</b>	<b>1.671.813,46</b>

**1.3- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**

2016 yılında Kampüs Alt Yapı yapım projesi kapsamında 2 ihale, Muhtelif İşler-Büyük Onarım yapım projesi kapsamında 1 olmak üzere toplamda 3 yapım işine ait ihale gerçekleştirilmiştir. İhalesi yapılan üç yapım işi de yıllara sâri olduğundan 2016 yılında başlanılan yapım işi çalışmalarına 2017 yılında devam edilmektedir.

Bunun dışında Etüt-Proje İşleri yatırım kalemi kapsamında dört adet ihale yapılmış olup, bu çalışmalardan ikisi tamamlanmış, ikisinin çalışmaları 2017 yılına uzamıştır.

**İnşaatı Devam Eden-Tamamlanan Projeler****Tablo 3**

Sıra No	Projenin Adı	Karakteristiği	Başlama ve Hedeflenen Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı
<b>1</b>	<b>2016H032670 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi</b>			
<b>1.1</b>	Kampüs Master Planı Planlama ve Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alımı	Etüt-Proje	22.06.2016- 22.07.2016	% 100
<b>1.2</b>	Kampüs Master Planı Kapsamında Mimari Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alım İşİ	Etüt-Proje	21.07.2016- 21.08.2016	% 100
<b>1.3</b>	Merkez Kampüs Master Planı Maketinin Hazırlanması ve Merkezi Kütüphane Binası Proje Hizmeti Alımı	Etüt-Proje	15.12.2016- 13.02.2017	-
<b>1.4</b>	Mimarlık Fakültesi ve Merkezi Yemekhane Proje Hazırlama	Etüt-Proje	15.02.2016- 29.01.2017	-
<b>2</b>	<b>2016H032680 Muhtelif İşler Projesi</b>			
<b>2.1</b>	İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Binası İnşaat Bakım Onarım Yapım İşİ	Bakım-Onarım- Tadilat	01.12.2016- 29.01.2017	-
<b>3</b>	<b>2016H032690 Kampüs Altyapısı</b>			
<b>3.1</b>	Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşİ	Alt Yapı	16.09.2016- 03.04.2017	33,34
<b>3.2</b>	Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapım İşİ	Alt Yapı	20.12.2017- 29.03.2017	-
<b>Genel Toplam</b>				<b>33,33</b>

**1.3.1- 2016H032670 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi**

Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi kapsamında; 2016 yılı içerisinde “Kampüs Master Planı Planlama ve Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alımı” kapsamında Üniversitemiz Merkez Yerleşkenin “Kampüs Master Planı” projesi hazırlanmıştır.

Ayrıca Üniversitemiz Master Planı içerisinde yapımı planlanan: Mimarlık Fakültesi, Merkezi Yemekhane ve Merkezi Kütüphane avan projeleri hazırlanmıştır.

### **1.3.2- 2016H032700 Muhtelif İşler Projesi**

“Muhtelif İşler” projesi kapsamında; 2016 yılı yatırım programına dahil edilen “Bina Bakım-Onarım, Bilgisayar, Taşıt, Makine Teçhizat ve Mefruşat” ile ilgili mal ve hizmet alımları yapılmıştır.

### **1.3.3- 2016H032710 Yayın Alımları Projesi**

“Yayın Alımları” projesi çerçevesinde 2016 yılı yatırım programına dahil edilen Basılı Yayın Alımı kapsamında 10.938 Adet teknik ve sosyal kitap alımı yapılmıştır.

### **1.3.4- 2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2016 yılında yatırım programına dahil edilen herhangi bir alt proje bulunmamaktadır.

### **1.3.5- 2016H032690 Kampüs Altyapısı Projesi**

“Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak; 2016 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanılan “Kampüs Çevre Duvarı” yapım işinin, 2016 yılı sonu itibariyle % 33,4 tamamlanmış ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.

“Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak, 2016 yılında yatırım programına dahil edilen ve ihalesi yapılan “Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu” yapım işinin, 2017 yılında çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

## **1.4- 2016 yılı Yatırım Uygulamaları**

### **1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu**

2016 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 11.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödenek toplamı 14.280.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 4.582.402,79 TL harcama yapılmış, harcanmayan 9.697.597,21 TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneye oranı % 32,08'dir.

### **1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar**

Çok yıllık proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesi; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin (I) fıkrasında; “21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Bu durum; Kamu İhale Kurulu'nun görüşü gereken

hallerde, ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca aciliyet arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil etmektedir.

## 2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1 Devam Eden Projeler

#### 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

##### 2.1.1.1- 2016H030170 Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi

“Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi” için, 2016 yılı bütçesinden 200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 1.700.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 391.170,00 TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 1.308.830,00 TL tutarındaki ödenek tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneye oranı % 23,01’dir.

##### 2.1.1.2- 2016H030180 Muhtelif İşler

Muhtelif işler için, 2016 yılı bütçesinden 6.800.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 6.880.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 3.093.855,68 TL harcama yapılmış, harcanmayan 3.786.144,32 TL ise yıl sonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneye oranı % 44,96’dir.

#### Bina Bakım-Onarım Giderleri

Tablo 4

Yapılan İşin Adı	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Diğer Giderler Bakım-Onarımı	3.015.000,00	267.622,39	%8,88
<b>Toplam</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>267.622,39</b>	<b>%8,88</b>

2016 yılı bütçesinden binaların bakım ve onarım giderleri için, 3.015.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 267.622,39 TL’si harcanmış, harcanmayan 2.747.377,61 TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneye oranı % 8,88’dir.



**Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları****Tablo 5**

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Büro Mefruşat Alımı	2.323.000,00	349.797,59	%49,39
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları		12.359,32	
Diğer Mefruşat Alımları		257.262,96	
Büro Makinaları Alımları		45.267,16	
Diğer Makine Teçhizat Alımları		482.705,02	
<b>Toplam</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>1.147.392,05</b>	<b>%49,39</b>

2016 yılı bütçesinden makine, teçhizat ve mefruşat alımları için, 2.323.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 1.147.392,05 TL'si; fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile idari birimlerin ihtiyacı olan büro mefruşat alımı, sosyal tesis mefruşatı alımları, diğer mefruşat alımları, büro makinaları alımları ve diğer makine teçhizat alımlarına harcanmış, harcanmayan 1.175.607,95 TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 49,39'dur.

**Bilgisayar Alımları****Tablo 6**

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Bilgisayar alımları	630.000,00	629.391,79	%99,90
Bilgisayar Yazılımı Alımları	241.000,00	240.580,00	%99,82
<b>Toplam</b>	<b>871.000,00</b>	<b>869.971,79</b>	<b>%99,88</b>

2016 yılı bütçesinden bilgisayar alımı için, 871.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 869.971,79 TL'si harcanmış, harcanmayan 1.028,21 TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 99,88'dir.

**Laboratuvar Cihazı Alımları****Tablo 7**

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Laboratuvar Cihazı Alımları	36.000	35.164,00	97,68
<b>Toplam</b>	<b>36.000</b>	<b>35.164,00</b>	<b>97,68</b>

2016 yılı bütçesinden laboratuvar cihaz alımları kapsamında, 36.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 35.164,00 TL'si harcanmış, harcanmayan 836,00 TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 97,68'dir.

**Taşıt Alımları****Tablo 8**

Alınan Taşıtın Cinsi	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Kara Taşıtı Alımları	678.000,00	677.192,31	%99,83
Diğer Taşıt Alımları	97.000,00	96.513,14	
<b>Toplam</b>	<b>775.000,00</b>	<b>773.705,45</b>	<b>%99,83</b>

2016 yılı bütçesinden taşıt alımları için, 775.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 773.705,45 TL'si harcanmış, harcanmayan 8.214,00 TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 99,83'dür.

**2.1.1.3- 2016H032710 Yayın Alımları**

2016 yılı bütçesinden basılı yayın alımlarına 200.000,00 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 199.998,16 TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 1,84 TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 99,99'dur.

**2.1.1.4- 2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler**

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2016 yılında yatırım programına dahil edilen herhangi bir alt proje bulunmamaktadır.

### 2.1.1.5- 2016H032690 Kampüs Altyapısı

“Kampüs Altyapısı” projesi kapsamında, 2016 yılı bütçesinden 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 3.500.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 897.378,95 TL harcama yapılmış, harcanmayan 2.603.000,00 TL ise yıl sonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 25,64’dür.

## 2.2 Tamamlanan Projeler

### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Tablo 10

Bağlı Olduğu Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2016H032670 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Kampüs Master Planı Planlama ve Tasarım Hizmetleri Alımı İşi	T.C. İskenderun Teknik Üniversitesi
2016H032670 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Kampüs Master Planı Kapsamında Mimari Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alımı İşi	T.C. İskenderun Teknik Üniversitesi

2016 yılında ihale süreci tamamlanarak, yapımına başlanılan “Çeşitli Ünitelerin” yapımı işi, 2016 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır.

### 2.2.2 Proje Tamamlanma Raporu

2016 yılı içinde tamamlanan projelerin detay bilgileri aşağıdaki “Projenin Yatırım Programı Parametreleri” başlıklı tablolarda verilmiştir.

**Tablo 10**

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri</b>						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
<b>Proje No</b>	2016H032670					
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Kampüs Master Planı Kapsamında Mimari Tasarım Hizmetleri Projesi)					
<b>Sektör/Alt Sektör</b>	Eğitim - Yüksek Öğretim					
<b>Proje Amacı</b>	Yatırım Programına Esas 3 Binaların Binaların Avan Projelerinin Hazırlanması					
<b>Proje Yeri</b>	İskenderun/Hatay					
<b>Karakteristiği</b>	Etüt-Proje					
<b>Fiziki Hedefi</b>	55.000,00 m <sup>2</sup> Avan Proje Hizmeti					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2016-2016					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	21.07.2016	İhale Sözleşme Bedeli (KDV Hariç)		169.500,00 TL		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama</b>						
Programa Alındığı Yıl	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları						
Yapılan İşler- Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

**Tablo 11**

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri</b>						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2016H032670					
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Kampüs Master Planı Planlama ve Tasarım Hizmetleri Projesi)					
<b>Sektör/Alt Sektör</b>	Eğitim - Yüksek Öğretim					
<b>Proje Amacı</b>	Merkez Kampüs (84 Hektar) Alanın Master Planının Hazırlanması					
<b>Proje Yeri</b>	İskenderun/Hatay					
<b>Karakteristiği</b>	Etüt-Proje					
<b>Fiziki Hedefi</b>	84 Hektar Alanın Master Planının Hazırlanması					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2016-2016					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	22.06.2016	İhale Sözleşme Bedeli (KDV Hariç)		162.000,00 TL		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama</b>						
Programa Alındığı Yıl	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda</b>						
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları</b>						
<b>Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

### **3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK**

Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması,

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

## 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özeti

**Kurum Adı** : İskenderun Teknik Üniversitesi  
**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

**Tablo 12 (Bin TL)**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Yılı Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5	0	23.000	0	0	0	0	0	11.500	0	0	14.280	0	0	4.582
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
İktisadi															
Sosyal															
<b>Toplam</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.582</b>
