

2020 Yılı

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu



2021 - İskenderun



Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamının yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

23 Nisan 2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kendine özgü bir eğitim/öğretim/araştırma ekosistemi (TEKNOVERSİTE) oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyip tekniğe ve teknolojiye odaklanmış ve Endüstri 4.0'a eklemlenen bir üniversite olmuştur.

Bu bağlamda bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunarak, inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci maddesi gereğince hazırlanması gereken 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda; yatırım proje uygulamaları, sonuçları, ödenekleri, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ve karşılaşılan sorunlara yer verilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için gereken özveriye gösteren tüm idari ve akademik personelimize teşekkür eder, 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Prof. Dr. Tolga DEPCI
Rektör

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1. Kuruluş Tarihçesi	1
1.2. Akademik ve İdari Birimler.....	1
1.3. Misyon ve Vizyon	2
1.4. Temel Değerlerimiz.....	3
1.5. Amaç ve Hedefler.....	3
2. YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
3. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	8
4. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	10
4.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	10
4.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	10
4.3. Kampüs Altyapı Projesi.....	10
4.4. Muhtelif İşler Projesi	11
4.5. Yayın Alım Projesi	11
4.6. Açık ve Kapalı Spor Projesi	12
4.7. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	12
5. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	12
5.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	12
5.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu	13
5.3. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı ...	13
5.4. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	14
5.5. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı (Makine-Teçhizat)	14
5.6. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri).....	15
5.7. Yayın Alımları Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	15

5.8. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	16
5.9. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	16
6. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	17
6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	17
6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar	17
7. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI	18
7.1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü Projeleri	18
7.1.1. Kampüs Alt Yapısı.....	18
7.1.2. Muhtelif İşler (Büyük Bakım-Onarım).....	22
7.1.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	28
7.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	30
7.2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	32
7.2.1. Kapalı Spor Kompleksi Projesi.....	32
7.3. DHK-Teknolojik Araştırma Sektörü	33
7.3.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi.....	33
7.4. Hibe Yatırım Projeleri	33
7.4.1. Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası	33
8. TAMAMLANAN PROJELER LİSTESİ.....	34
8.1. Kampüs Altyapısı Projesi	34
8.2. Muhtelif İşler Projesi	34
8.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	35
8.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	35
9. YAPIM İŞİ PROJE TAMAMLANMA RAPORLARI.....	36
9.1. Mimarlık Fakültesi Projesi	36
9.2. Merkezi Kütüphane Projesi	37
10. ÖNERİLER.....	38

TABLOLAR

Tablo 1. 2020 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı	5
Tablo 2. 2020 Yılı Bütçe Verilerine Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı	6
Tablo 3. 2019 ve 2020 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Verileri	7
Tablo 4. Taşınmazlara Ait Açık Alan ve Mülkiyet Türü Bilgisi	8
Tablo 5. Taşınmazlara Ait Kapalı Alan Bilgisi	9
Tablo 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu	12
Tablo 7. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu	13
Tablo 8. Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu	13
Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Bakım- Onarım)	14
Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Makine- Teçhizat).....	14
Tablo 11. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)	15
Tablo 12. Yayın Alımları Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu	15
Tablo 13. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu	16
Tablo 14. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu	16
Tablo 15. Sektör Bazında Ödenek Durum Bilgisi.....	17
Tablo 16. Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	19
Tablo 17. Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşine Ait Bilgiler.....	19
Tablo 18. Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşine Ait Bilgiler	20
Tablo 19. İSTE Bisiklet Yolu Yapım İşine Ait Bilgiler.....	20
Tablo 20. Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşine Ait Bilgiler	21
Tablo 21. Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapım İşine Ait Bilgiler	21
Tablo 22. İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşine Ait Bilgiler	22
Tablo 23. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	22
Tablo 24. Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşine Ait Bilgiler.....	23

Tablo 25. İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım Yapım İşine Ait Bilgiler	24
Tablo 26. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşine Ait Bilgiler.....	24
Tablo 27. Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilat Yapım İşine Ait Bilgiler.....	25
Tablo 28. Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşine Ait Bilgiler	25
Tablo 29. Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşine Ait Bilgiler	26
Tablo 30. Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi Yapım İşine Ait Bilgiler.....	26
Tablo 31. İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi Yapım İşine Ait Bilgiler	27
Tablo 32. İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşine Ait Bilgiler	27
Tablo 33. İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım İşine Ait Bilgiler.....	28
Tablo 34. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	28
Tablo 35. Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı Yapım İşine Ait Bilgiler.....	29
Tablo 36. Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı Yapım İşine Ait Bilgiler.....	29
Tablo 37. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	30
Tablo 38. Mimarlık Fakültesi Yapım İşine Ait Bilgiler.....	30
Tablo 39. Merkezi Kütüphane Yapım İşine Ait Bilgiler.....	31
Tablo 40. Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşine Ait Bilgiler ...	31
Tablo 40. Kapalı Spor Kompleksi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	32
Tablo 42. Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşine Ait Bilgiler.....	32
Tablo 43. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	33
Tablo 44. Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası Yapım İşine Ait Bilgiler	33
Tablo 45. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler	34
Tablo 46. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler.....	34
Tablo 47. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler.....	35
Tablo 48. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler	35
Tablo 49. Mimarlık Fakültesi Yapım İşine Ait Tamamlama Raporu	36
Tablo 50. Merkezi Kütüphane Yapım İşine Ait Tamamlama Raporu	37
Tablo 51. 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL).....	39

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluş Tarihçesi

Üniversitemiz 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6640 sayılı Kanun ve 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek-160 maddesi ile kurulmuştur.

1.2. Akademik ve İdari Birimler

Üniversitemiz akademik birimleri 7 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokul, 1 konservatuvar ve 7 enstitü, idari birimler ise Genel Sekreterliğe bağlı 10 birimden oluşmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 8 koordinatörlük faaliyet göstermektedir.

Fakülteler

- ✓ Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
- ✓ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
- ✓ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- ✓ Mimarlık Fakültesi
- ✓ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- ✓ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- ✓ Turizm Fakültesi

Yüksekokul

- ✓ Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

- ✓ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
- ✓ Dörtyol Meslek Yüksekokulu
- ✓ Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- ✓ Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
- ✓ İskenderun Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Konservatuvar

- ✓ Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı

Enstitüler

- ✓ Bilişim Enstitüsü
- ✓ Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
- ✓ Demir-Çelik Enstitüsü
- ✓ Enerji Enstitüsü
- ✓ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- ✓ Sosyal Bilimler Enstitüsü
- ✓ Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü

Genel Sekreterliğe Bağlı İdari Birimler

- ✓ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- ✓ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- ✓ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- ✓ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- ✓ Personel Daire Başkanlığı
- ✓ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- ✓ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- ✓ Hukuk Müşavirliği
- ✓ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

- ✓ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Koordinatörlükler

- ✓ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü
- ✓ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
- ✓ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
- ✓ Çocuk Üniversitesi Koordinatörlüğü
- ✓ İş Dünyası ile Entegrasyon (İDE) Genel Koordinatörlüğü
- ✓ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü
- ✓ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
- ✓ Uzaktan Bilgisayarlı Öğretim Merkezi (UBÖM) Koordinatörlüğü

1.3. Misyon ve Vizyon

Misyon

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin misyonu; “bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmek” olarak belirlenmiştir.

Vizyon

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin vizyonu; “Dörtlü Sarmal Modeli: Üniversite-sanayi-kamu-toplum” bütünleşmesini sağlayarak Türkiye'nin inovasyon odaklı kalkınma modeline katkı sağlayan, değer katan, tercih edilen, insanı ve inovasyonu önceleyen bir ‘Teknoversite’ olmak” olarak belirlenmiştir.

1.4. Temel Değerlerimiz

- ✓ Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlke ve Değerlerine Bağlılık
- ✓ Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık
- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ Etik Değerlere Bağlılık
- ✓ Girişimcilik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Sosyal Sorumluluk
- ✓ Paydaş Odaklılık
- ✓ Hesap Verilebilirlik
- ✓ Çevreye Duyarlılık

1.5. Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1- Eğitim - Öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak

Hedef-1 Mezun öğrenci sayısını ve mezunların mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğini arttırmak, mezunlarla iletişimi güçlendirmek

Hedef-2 Üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası etkinlik (sempozyum, kongre, sergi, konser vb.) sayısını arttırmak

Hedef-3 Bölümlerin doluluk oranlarını arttırmak

Hedef-4 Akredite bölüm ve laboratuvar sayısını arttırmak

Hedef-5 Kütüphane kaynaklarını arttırmak

Stratejik Amaç 2- Bilimsel araştırma kapasitesini ve sanayi ile çalışma kabiliyetini güçlendirmek

Hedef-1 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak

Hedef-2 Üniversite fikri mülkiyet hakları çalışmalarını etkinleştirmek

Hedef-3 Akademisyen ve öğrencilerin araştırma desteklerinden daha fazla faydalanmasını sağlamak

Hedef-4 Üniversite sanayi ortaklı proje ve etkinlik sayısını arttırmak

Hedef-5 Akademisyen ve öğrencilerin şirketleşme sayılarını artırmak

Stratejik Amaç 3- Uluslararası işbirliklerini ve hareketliliğini artırmak

Hedef-1 Üniversitedeki yurtdışı doktoralı ve yabancı öğretim elemanı sayısını arttırmak

Hedef-2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak

Hedef-3 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak

Hedef-4 Üniversite araştırma faaliyetlerinde aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısını arttırmak

Hedef-5 Üniversitenin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini arttırmak

Stratejik Amaç 4- Üniversitenin toplum ile olan bütünleşmesini sağlamak

Hedef-1 Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak

Hedef-2 Üniversite tarafından verilen sertifikalı eğitim sayısını arttırmak

Hedef-3 Üniversite dışı kurumlarla (STK, belediye vb.) yürütülen ortak faaliyet sayısını arttırmak

Hedef-4 Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısını arttırmak

Stratejik Amaç 5- Üniversitenin fiziksel, teknolojik ve insan kaynakları altyapısını tamamlamak ve güçlendirmek

Hedef-1 Yerleşkelerin fiziksel altyapı olanaklarını tamamlamak ve iyileştirmek


Hedef-2 Üniversitenin bilgi işlem altyapısını güçlendirmek

Hedef-3 Üniversitede nitelikli akademik ve idari personel sayısını arttırmak

Hedef-4 Üniversite yerleşkelerinin çevre dengesi gözetilerek yeşil ve sosyal alan altyapılarını düzenlemek

2. YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.




Üniversitemizin 2020 yılı yatırım projelerinin finansman kaynağına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Üniversitemize 2020 yılında 24.750.000 ₺ hazine yardımı gerçekleşmiş olup, 3.500.000 ₺ ise likit karşılığı ödenek ekleme yöntemi ile toplam yatırım ödeneği 28.250.000 ₺’ye ulaşılmıştır. Ayrıca Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 300.000 ₺ Muhtelif İşler Projesinde 4.500.000 ₺ Kampüs Altyapısı Projesinde 1.200.000 ₺ olmak üzere toplam 6.000.000 ₺ projeler arası aktarım yöntemi ile Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine aktarılmıştır.

Tablo 1. 2020 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2020 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları				
			Özel Bütçe				
			Hazine	Öz Gelir	Eklenen	Düşülen	Toplam
Eğitim (Yükseköğretim)	2020H03-151506	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	400.000 ₺	-	-	300.000 ₺	100.000 ₺
	2020H03-151521	Muhtelif İşler	12.000.000 ₺	-	-	4.500.000 ₺	7.500.000 ₺
	2020H03-151508	Yayın Alımları	500.000 ₺	-	-	-	500.000 ₺
	2016H03-2681	Derslik ve Merkezi Birimler	5.180.912 ₺	-	-	-	5.180.912 ₺
	2020H03-151514	Kampüs Altyapısı	2.169.088 ₺	-	-	1.200.000 ₺	969.088 ₺
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)	2017H05-3604	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.500.000 ₺	-	9.500.000 ₺	-	12.000.000 ₺
DHK (Teknolojik Araştırma)	2017K12-15021	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000.000 ₺	-	-	-	2.000.000 ₺
Genel Toplam			24.750.000 ₺	-	9.500.000 ₺	6.000.000 ₺	28.250.000 ₺

Grafik 1. 2020 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı

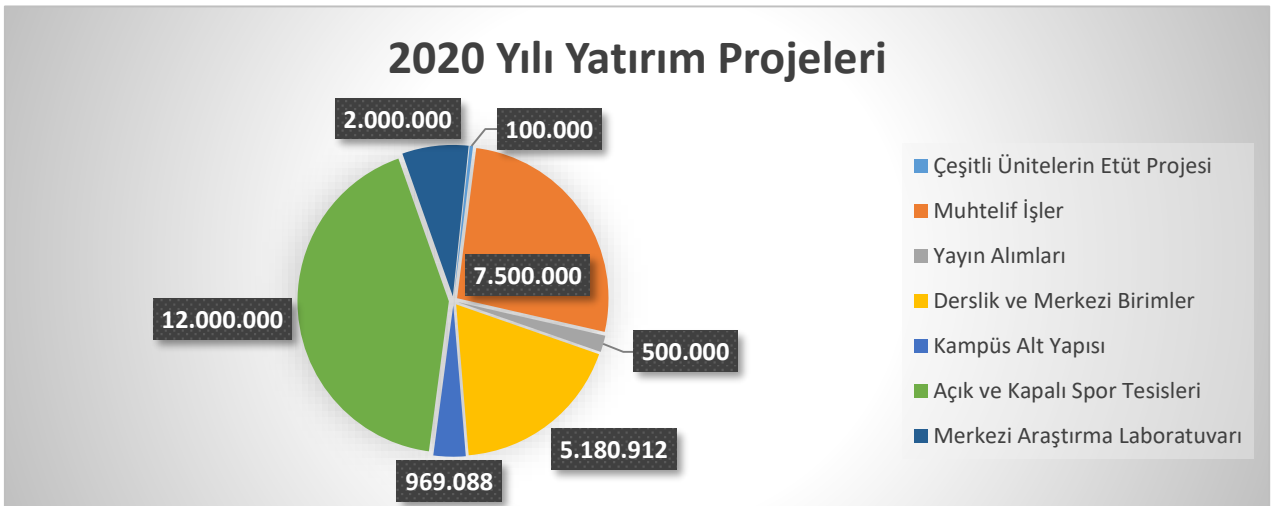


Üniversitemizin 2020 yılı yatırım harcamalarının bütçe verilerine göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2020 Yılı Bütçe Verilerine Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı

Eko. Kod	Gider Türü	2020 KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	12.000.000 ₺	0 ₺	4.535.000 ₺	7.465.000 ₺	5.977.281 ₺	49,96
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	500.000 ₺	177.904 ₺	35,58
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.250.000 ₺	8.000.000 ₺	0 ₺	18.250.000 ₺	10.654.746 ₺	77,49
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0 ₺	35.000 ₺	0 ₺	35.000 ₺	28.814 ₺	82,33
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺	546.275 ₺	27,31
06	Sermaye Giderleri	24.750.000 ₺	3.535.000 ₺	4.535.000 ₺	28.250.000 ₺	17.385.020 ₺	61,54

Grafik 2. 2020 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı

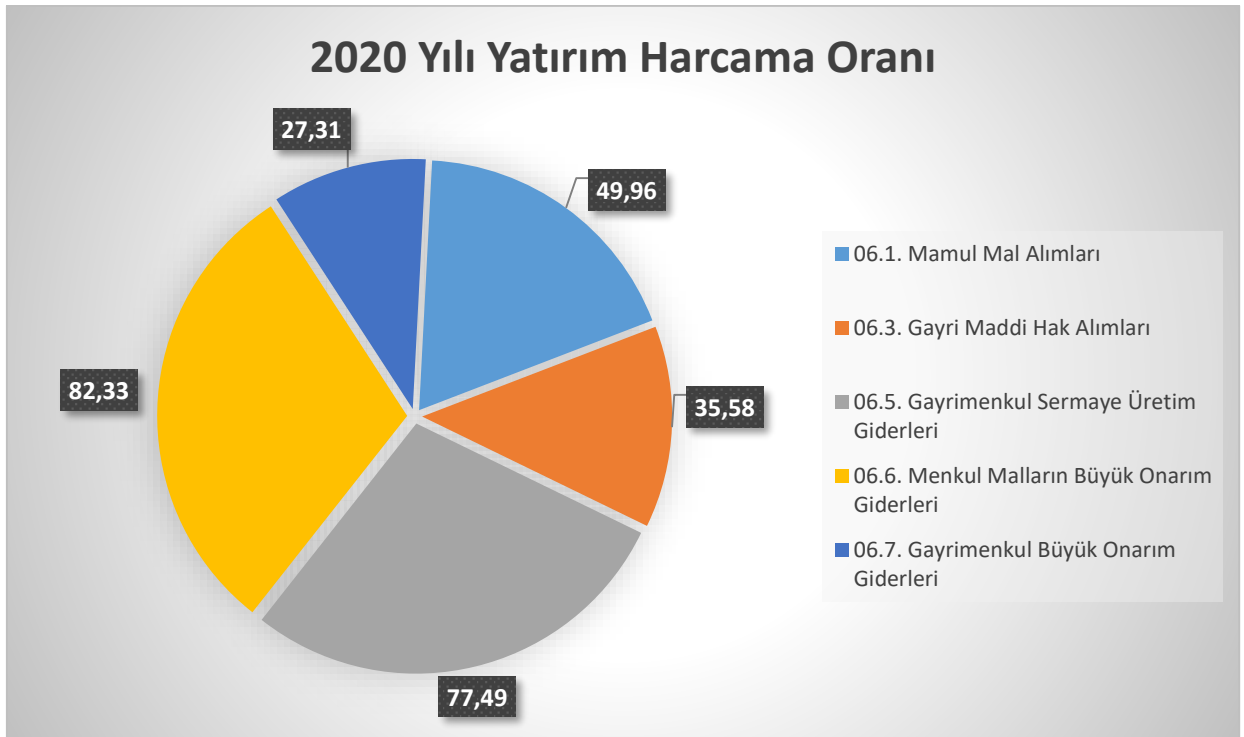

2019 ve 2020 yılı yatırım harcamalarının gerçekleşme oranları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. 2019 ve 2020 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Verileri

Proje Adı	2019 Yılı Yatırım Proje Bilgileri			2020 Yılı Yatırım Proje Bilgileri		
	Toplam Ödenek	2019 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	2020 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı
Eğitim (Yükseköğretim Sektörü)	33.650.000 ₺	30.852.033 ₺	91,69	14.250.000 ₺	8.840.989 ₺	62,04
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000 ₺	5.900 ₺	1,18	100.000 ₺	56.640 ₺	14,16
Derslik ve Merkezi Birimler	26.150.000 ₺	25.908.532 ₺	99,08	5.180.912 ₺	1.977.613 ₺	56,64
Kampüs Altyapısı	1.000.000 ₺	794.994 ₺	79,50	969.088 ₺	776.604 ₺	80,14
Muhtelif İşler	5.500.000 ₺	3.662.821 ₺	66,59	7.500.000 ₺	5.543.551 ₺	73,41
Yayın Alımı	500.000 ₺	479.785 ₺	95,96	500.000 ₺	486.581 ₺	97,32
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor Sektörü)	4.000.000 ₺	3.656.898 ₺	91,42	12.000.000 ₺	7.843.889 ₺	65,37
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.000.000 ₺	3.656.898 ₺	91,42	12.000.000 ₺	7.843.889 ₺	65,37
DHK (Araştırma Sektörü)	7.700.000 ₺	6.945.722 ₺	90,20	2.000.000 ₺	700.142 ₺	35,01
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	7.700.000 ₺	6.945.722 ₺	90,20	2.000.000 ₺	700.142 ₺	35,01
Genel Toplam	45.350.000 ₺	41.454.653 ₺	91,41	28.250.000 ₺	17.385.020 ₺	61,54

3. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemiz hizmetlerini toplam 1.597.671 m²'lik yerleşke alanı üzerindeki 111.186 m²'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu açık alanların detayları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Taşınmazlara Ait Açık Alan ve Mülkiyet Türü Bilgisi

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²)			2019	2020
	Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m ²)	Toplam Alan (m ²)
Merkez Yerleşke	-	798.311	-	798.311	798.311
Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı	-	10.000	-	10.000	10.000
Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi	-	-	10.000	10.000	10.000
Tepe Yerleşke	85.216	104.563	-	189.779	189.779
Karayılan Yerleşkesi	23.615	-	-	23.615	23.615
Kuzuculu Yerleşkesi	-	556.860	-	556.860	556.860
Sarıseki Yerleşkesi	-	9.104	-	9.104	9.104
Toplam	108.831	1.478.840	10.000	1.597.671	1.597.671

Üniversitemize ait taşınmazların kapalı alan bilgisi Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Taşınmazlara Ait Kapalı Alan Bilgisi

Yerleşke	Hizmet Birimi	Yapım Yılı	Toplam Alan (m ²)
Merkez Yerleşke	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	2019	15.113
	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Ek Bina)	2012	8.455
	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	2014	12.698
	Mimarlık Fakültesi	2020	17.380
	Kütüphane Bilgi Keşif Merkezi	2019	10.140
	Gastronomi ve Fuar Merkezi	2019	8.689
	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi	2014	3.253
	Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü	2020	85
	Açık Spor Tesisleri	2012	6.487
Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Yerleşkesi	Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi	-	2.741
Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Yerleşkesi	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı	2007	5.540
	İdari Bina	2007	474
İskenderun Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	İskenderun Meslek Yüksekokulu	1990	10.981
	Kapalı Spor Salonu	1990	2.250
	Makine Bölümü Atölyesi	1990	460
	Otomotiv Bölümü Atölyesi	1990	310
	İnşaat Bölümü Atölyesi	1990	535
Dörtüol Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	Dörtüol Meslek Yüksekokulu	2001	5.591
Genel Toplam			111.186

4. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

4.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Merkez Kampüs içerisinde bulunan bina, tesis, ana ve ara yollar, galeri hatları, peyzaj alanları, dikili ağaçlar ile diğer fiziki birimlerin sayısal verilerinin okuması yapılarak hali hazır haritası yapılmış ve yine aynı çalışma kapsamında Merkez Kampüsün eğitim ve yükseklik bilgilerinin yer aldığı plankotesi hazırlanmıştır. Merkez Kampüs alt yapısının kapsamında yapımı planlanan doğal gaz dağıtım sisteminin uygulama projeleri hizmet alımı yoluyla hazırlanmıştır.

4.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2020 yılı yatırım programında dört proje yer almaktadır. Bu projelerden Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi ilk defa 2020 yılında yatırım programına alınmış, Mimarlık Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Merkezi Derslik projeleri önceki yatırım programlarında yer almaktadır.

Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi projesi yapım işi ihalesi 2020 yılında yapılmış olup, yüklenici ile aynı yıl içerisinde sözleşme imzalanarak yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. Yapım işine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, yapım işi sözleşmesi uyarınca projenin 27/05/2021 tarihinde tamamlanarak, muayene ve kabul işlemleri sonrasında hizmete alınması planlanmaktadır.

İhalesi 2017 yılında yapılan Mimarlık Fakültesi hizmet binası 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. İhalesi 2017 yılında yapılan Merkezi Kütüphane hizmet binası 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Merkezi Kütüphane yapım işine ilişkin kesin hesap ödemesi 2020 yılında yapılmış olup, söz konusu proje tamamlanmıştır. Merkezi Derslik projesi 2020 yılında da yatırım programında yer alan, devam eden projeler arasında olup, bu projeye iz ödenek ile programda yer verilmiştir. Merkezi Derslik projesi için 2020 yılında ödenek sağlanmadığından ihalesi yapılamamıştır.

4.3. Kampüs Altyapı Projesi

İhalesi 2019 yılında yapılan ve aynı yıl çalışmaları tamamlanan: Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşleri ve Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin kesin hesap ödemeleri 2020 yılında yapılmıştır.

İhalesi 2020 yılında başlanılan: İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet Yolu Yapım İşleri, Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşleri, Merkez Kampüs Anayol Güzergahlarında Bordür Yapılması yapım işleri aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Merkez Kampüs alt yapısının kapsamında yapımı planlanan doğal gaz dağıtım sisteminin yapına ilişkin hazırlanan, İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşi 2020 yılında ihale edilmiş ve yüklenici ile sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır. Doğal gaz dağıtım sistemi 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak sisteminin hizmete alınması planlanmaktadır.

4.4. Muhtelif İşler Projesi

İhalesi 2019 yılında yapılan: Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi ile İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım yapım işlerinin kesin hesap ödemeleri 2020 yılında yapılmıştır.

Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşi, Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşi, Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi Yapım İşi, İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi, İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşi ile İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım İşleri 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

2020 yılında ihalesi yapılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi ile Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşine ilişkin sözleşme ve yer teslim işlemleri 2020 yılında yapılarak bu yapım işleri kapsamındaki imalat çalışmalarına başlanılmıştır. Yukarıda bahse konu olan yapım işleri 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2020 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Arazi Ölçüm Cihazı Alımı, Merkezi Yemekhane Binasına Mobilya, Modüler Bantlı Konveyör Alımı, Büro Malzemesi, Yangın Söndürmeye Yönelik Malzeme, Merkezi Yemekhane Mutfak Ekipmanları, Yol Süpürme Makinesi, Traktör, Taşınabilir Bilgisayar ve Lazer Yazıcı, İletişim Ünitesi ve Tam Yüz Maskesi, Paravan, Kompakt Arşiv Dolabı, 4 Grup Cihaz ve Laboratuvar Malzemesi, 73 Kalem Makine ve Cihaz alımları gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Dijital Kürsü Alımı, Sunucu Alımı Makine, Çift Yüzlü Kart Yazıcı Alımı, Bilgisayar-Kabinet-Güç Kaynağı-Yazıcı Alımı, Switch Alımı Makine, Masaüstü Bilgisayar ve Yazıcı Alımı, Hardisk ve Yedekleme Ünitesi alımları gerçekleştirilmiştir.

4.5. Yayın Alım Projesi

Yayın Alımları Projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde 4 ayı elektronik veri tabanı alımı gerçekleştirilmiş ve karşılığında 486.581 ₺ ödeme yapılmıştır.

4.6. Açık ve Kapalı Spor Projesi

Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşi 2017 yılı Aralık ayında ihale edilerek, çalışmalara 2018 yılı ocak ayında başlanılmıştır. Kapalı Spor Kompleksi yapım işi kapsamında 2020 yılı sonu itibariyle fiziki ilerleme %79 oranına ulaşmıştır. Bahse konu olan projenin 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

4.7. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında gerçekleştirilen 2 adet alt proje yer almaktadır. İlgili projeler kapsamında Üniversitemizin Araştırma ve Laboratuvar ihtiyacını karşılamak amacı ile Makine-Teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

5. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

5.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2020 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje No	2020H03-151506
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
İlgili Proje Kapsamında Harita ve Plankote Hazırlama işinin yapılması planlanmıştır.	2 adet etüt-proje hizmeti gerçekleştirilmiştir.

5.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

2020 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 7’de sunulmuştur.

Tablo 7. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Proje No	2016H03-2681
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Mimarlık Fakültesinin yapılması	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Merkezi Kütüphanenin yapılması	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezinin yapılması	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.3. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2020 yılı Kampüs Altyapısı Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8. Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Kampüs Altyapısı Projesi
Proje No	2020H03-151514
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Merkez Kampüs bünyesinde peyzaj düzenlemeleri ve yol yapımı	Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi
Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Merkezi Kütüphanenin çevre düzenlemesinin yapılması	Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Merkez Kampüs içerisinde bisiklet yolunun yapılması	İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet Yolu Yapım İşi
Merkez Kampüs içerisinde muhtelif yol döşeme işinin yapılması	Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşi
Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Merkez Kampüs bünyesinde bordür yapımı	Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapılması
Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Merkez Kampüs bünyesinde doğalgaz altyapı çalışmalarının yapılması	İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşi

5.4. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2020 yılı Muhtelif İşler Projesi (Bakım-Onarım) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 9’da sunulmuştur.

Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Bakım-Onarım)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2020H03-151521
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz bünyesinde bulunan binaların ödenek limitleri dahilinde bakım ve onarımlarının yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.5. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı (Makine-Teçhizat)

2020 yılı Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 10’da sunulmuştur.

Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Makine-Teçhizat)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2020H03-151479
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz birimleri makine, teçhizat, bilgisayar, yazılım, altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.6. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

2020 yılı Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2020H032680
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılan web otomasyonları, yazılım uygulamaları vb. program lisans ve lisans güncellemelerinin yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.7. Yayın Alımları Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı

2020 yılı Yayın Alımları Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 12’de sunulmuştur.

Tablo 12. Yayın Alımları Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Yayın Alımları Projesi
Proje No	2020H03-151477
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Elektronik Yayın Alımları	Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu Elektronik Yayın Alımları gerçekleştirilmiştir.

5.8. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2020 yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 13’de sunulmuştur.

Tablo 13. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
Proje No	2017H05-3604
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz kampüs yerleşkesinde Kapalı Spor Kompleksi yapım işinin tamamlanması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

5.9. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2020 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 14’de sunulmuştur.

Tablo 14. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	DHK (Teknolojik Araştırma)
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Proje No	2017K12-15021
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite

6. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

2020 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 24.750.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş olup, 3.500.000 ₺ ödenek eklemesi ile kullanılabilir ödenek 28.250.000 ₺'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 17.385.020 ₺ harcama yapılmış, harcanmayan 10.864.980 ₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Yapılan harcamanın ödeneğe oranı % 61,54'tür.

Tablo 15. Sektör Bazında Ödenek Durum Bilgisi

Sektör	2020 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları				
	Özel Bütçe				
	Ödenek	Eklenen	Düşülen	Toplam	Harcama
Eğitim (Yükseköğretim)	20.250.000 ₺	-	6.000.000 ₺	14.250.000 ₺	8.840.989 ₺
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)	2.500.000 ₺	9.500.000 ₺	-	12.000.000 ₺	7.843.889 ₺
DHK (Teknolojik Araştırma)	2.000.000 ₺	-	-	2.000.000 ₺	700.142 ₺
Genel Toplam	24.750.000 ₺	9.500.000 ₺	6.000.000 ₺	28.250.000 ₺	17.385.020 ₺

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlıklı 25 inci maddesinde; “...*Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir...*” denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir

takım aksaklıklarla karşılaşılabilir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

a. Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.

b. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.

c. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.

d. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.

7. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

7.1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü Projeleri

7.1.1. Kampüs Alt Yapısı

2020 yılı içerisinde Kampüs Altyapı Projesi kapsamında 6 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 1.077.722 ₺ kümülatif hakkeş ödemesi yapılmıştır.

Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 16'da verilmiştir.

Tablo 16. Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi	Kampüs İçi Yol ve Peyzaj Düzenlemesi	28.08.2019 25.12.2019	100
Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	Peyzaj Düzenlemesi	25.12.2019 14.01.2020	100
İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet Yolu Yapım İşi	Kampüs İçi Yol Yapım İşi	05.08.2020 30.03.2020	100
Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşi	Kampüs İçi Yol Yapım İşi	23.03.2020 30.03.2020	100
Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapım İşi	Çevre Düzenlemesi	16.03.2020 30.03.2020	100
İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşi	Doğalgaz Altyapısı	04.12.2020 03.03.2021	100

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşine ilişkin bilgiler Tablo 17’de sunulmuştur.

Tablo 17. Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	25.07.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	399.401 ₺
Sözleşme Tarihi	27.08.2019
Yer Teslim Tarihi	28.08.2019
İşin Süresi	120 (Gün)
İş Bitim Süresi	25.12.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	392.445 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 18’de verilmiştir.

Tablo 18. Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	30.10.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	107.900 ₺
Sözleşme Tarihi	11.12.2019
Yer Teslim Tarihi	16.12.2019
İşin Süresi	30 (Gün)
İş Bitim Süresi	14.01.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	107.900 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet Yolu Yapım İşine ait bilgiler Tablo 19’da verilmiştir.

Tablo 19. İSTE Bisiklet Yolu Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	05.08.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	108.047 ₺
Sözleşme Tarihi	05.08.2020
Yer Teslim Tarihi	05.09.2020
İşin Süresi	30 (Gün)
İş Bitim Süresi	18.08.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	108.047 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 20’de verilmiştir.

Tablo 20. Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	23.03.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	110.796 ₺
Sözleşme Tarihi	23.03.2020
Yer Teslim Tarihi	23.03.2020
İşin Süresi	8 (Gün)
İş Bitim Süresi	30.03.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	110.796 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapım İşine ait bilgiler Tablo 21’de verilmiştir.

Tablo 21. Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	16.03.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	104.314 ₺
Sözleşme Tarihi	16.03.2020
Yer Teslim Tarihi	16.03.2020
İşin Süresi	20 (Gün)
İş Bitim Süresi	30.03.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	104.314 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 22’de verilmiştir.

Tablo 22. İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	03.11.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	453.237 ₺
Sözleşme Tarihi	03.12.2020
Yer Teslim Tarihi	04.12.2020
İşin Süresi	90 (Gün)
İş Bitim Süresi	03.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	254.220 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

7.1.2. Muhtelif İşler (Büyük Bakım-Onarım)

2020 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi kapsamında 10 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 855.069 ₺ kümülatif hakkediş ödemesi yapılmıştır.

Tablo 23. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	Büyük Onarım	15.11.2019 30.12.2019	100
İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım	Büyük Onarım	17.12.2019 14.02.2020	100
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	Büyük Onarım	01.12.2020 30.03.2021	50
Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşİ	Büyük Onarım	21.12.2020 05.03.2021	50
Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşİ	Büyük Onarım	11.02.2020 14.02.2020	100
Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşİ	Büyük Onarım	09.03.2020 23.03.2020	100

Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi Yapım İşi	Büyük Onarım	19.03.2020 23.03.2020	100
İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi Yapım İşi	Büyük Onarım	19.03.2020 23.03.2020	100
İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşi	Büyük Onarım	06.05.2020 12.05.2020	100
İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım İşi	Büyük Onarım	02.12.2020 16.12.2020	100

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşine ait bilgiler Tablo 24’te verilmiştir.

Tablo 24. Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	30.10.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	347.676,00 ₺
Sözleşme Tarihi	14.12.2019
Yer Teslim Tarihi	05.12.2019
İşin Süresi	45 (Gün)
İş Bitim Süresi	30.12.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	309.048 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım Yapım İşine ait bilgiler Tablo 25’de verilmiştir.

Tablo 25. İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	30.10.2019
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	121.299 ₺
Sözleşme Tarihi	13.12.2019
Yer Teslim Tarihi	17.12.2019
İşin Süresi	60 (Gün)
İş Bitim Süresi	14.02.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	121.299 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşine ait bilgiler Tablo 26’da verilmiştir.

Tablo 26. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	19.10.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	873.318 ₺
Sözleşme Tarihi	27.11.2020
Yer Teslim Tarihi	01.12.2020
İşin Süresi	120 (Gün)
İş Bitim Süresi	30.03.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	83.702 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	40

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 27’de verilmiştir.

Tablo 27. Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilat Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	13.11.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	379.159 ₺
Sözleşme Tarihi	16.12.2020
Yer Teslim Tarihi	21.12.2020
İşin Süresi	75 (Gün)
İş Bitim Süresi	30.03.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	0 ₺
Fiziki Gerçekleşme	40

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 28’de verilmiştir.

Tablo 28. Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	11.02.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	52.006 ₺
Sözleşme Tarihi	11.02.2020
Yer Teslim Tarihi	11.02.2020
İşin Süresi	2 (Gün)
İş Bitim Süresi	14.02.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	52.006 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 29’da verilmiştir.

Tablo 29. Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	11.02.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	52.699 ₺
Sözleşme Tarihi	09.03.2020
Yer Teslim Tarihi	09.03.2020
İşin Süresi	7 (Gün)
İş Bitim Süresi	16.03.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	52.699 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 30’da verilmiştir.

Tablo 30. Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	19.03.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	93.750 ₺
Sözleşme Tarihi	19.03.2020
Yer Teslim Tarihi	19.03.2020
İşin Süresi	6 (Gün)
İş Bitim Süresi	23.03.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	93.750 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 31’de verilmiştir.

Tablo 31. İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	19.03.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	71.390 ₺
Sözleşme Tarihi	19.03.2020
Yer Teslim Tarihi	19.03.2020
İşin Süresi	6 (Gün)
İş Bitim Süresi	23.03.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	71.390 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşine ait bilgiler Tablo 32’de verilmiştir.

Tablo 32. İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	06.05.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	34.513 ₺
Sözleşme Tarihi	06.05.2020
Yer Teslim Tarihi	06.05.2020
İşin Süresi	6 (Gün)
İş Bitim Süresi	12.05.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	34.513 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 33’de verilmiştir.

Tablo 33. İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	02.12.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	36.662 ₺
Sözleşme Tarihi	02.12.2020
Yer Teslim Tarihi	02.12.2020
İşin Süresi	14 (Gün)
İş Bitim Süresi	16.12.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	36.662 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

7.1.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2020 yılı içerisinde Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 2 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 31.12.2020 tarihi itibari ile toplam 56.640 ₺ proje hakkediş ödemesi yapılmıştır.

Tablo 34. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı	Etüt-Proje	12.02.2020 28.02.2020	100
İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Uygulama Projesi Hazırlama Hizmet Alımı	Etüt-Proje	27.05.2020 30.06.2020	100

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 35’te verilmiştir.

Tablo 35. Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	12.02.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	21.240 ₺
Sözleşme Tarihi	12.02.2020
Yer Teslim Tarihi	12.02.2020
İşin Süresi	30 (Gün)
İş Bitim Süresi	28.02.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	21.240 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Uygulama Projesi Hazırlama Hizmet Alımına ait bilgiler Tablo 36’da verilmiştir.

Tablo 36. Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	13.05.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	35.400 ₺
Sözleşme Tarihi	27.05.2020
Yer Teslim Tarihi	12.02.2020
İşin Süresi	30 (Gün)
İş Bitim Süresi	30.06.2020
Yapılan Ödeme Tutarı	35.400 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

7.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2020 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 4 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 56.787.436 ₺ kümülatif hakkeciş ödemesi yapılmıştır.

Tablo 37. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
Mimarlık Fakültesi	Eğitim (16.985 m ²)	2016-2021	100
Merkezi Kütüphane	Kütüphane (11.500 m ²)	2017-2020	100
Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi	Eğitim (16.985 m ²)	2020-2021	40
Merkezi Derslik	Eğitim (16.985 m ²)	2018-2022	-

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Mimarlık Fakültesi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 38’de verilmiştir.

Tablo 38. Mimarlık Fakültesi Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	07.04.2017
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	36.655.000 ₺
Sözleşme Tarihi	23.08.2017
Yer Teslim Tarihi	08.09.2017
İşin Süresi	933 (Gün)
İş Bitim Süresi	17.01.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	30.593.418 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Yapım İşine ait bilgiler Tablo 39’da verilmiştir.

Tablo 39. Merkezi Kütüphane Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	03.05.2017
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	25.602.524 ₺
Sözleşme Tarihi	23.08.2017
Yer Teslim Tarihi	06.09.2017
İşin Süresi	580 (Gün)
İş Bitim Süresi	09.04.2019
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	25.602.524 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 40’ta verilmiştir.

Tablo 40. Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	21.08.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	3.697.000 ₺
Sözleşme Tarihi	21.08.2020
Yer Teslim Tarihi	30.09.2020
İşin Süresi	240 (Gün)
İş Bitim Süresi	27.05.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	591.494 ₺
Fiziki Gerçekleşme (%)	40

7.2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

7.2.1. Kapalı Spor Kompleksi Projesi

Üniversitemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Sektörü kapsamında yürütülen Kapalı Spor Kompleksi Projesi Yapım İşinin %79'u tamamlanmış olup, ilgili proje kapsamında 19.122.617 ₺ kümülatif hakkeş ödemesi yapılmıştır.

Kapalı Spor Kompleksi Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 41'de verilmiştir.

Tablo 40. Kapalı Spor Kompleksi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
Kapalı Spor Kompleksi	Spor Kompleksi (6.500 m ²)	29/01/2018 03/01/2021	79

Kapalı Spor Kompleksi Projesi kapsamında yapılan Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 42'de verilmiştir.

Tablo 42. Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşine Ait Bilgiler

İhale Tarihi	08/12/2017
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	20.090.922 ₺
Sözleşme Tarihi	23.01.2018
Yer Teslim Tarihi	29/01/2018
İşin Süresi	1.077 (Gün)
İş Bitim Süresi	03/01/2021
Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı)	19.122.617 ₺
Fiziki Gerçekleşme	79

7.3. DHK-Teknolojik Araştırma Sektörü

7.3.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

2020 yılı içerisinde Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında; 2 alt proje ile Makine ve Teçhizat alımı gerçekleştirilmiş olup, ilgili alt projeler nezdinde toplam 700.142,07 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Tablo 43. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Alt Proje	2020 Yılı Harcaması	İhale Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
4 Grup Cihaz ve Laboratuvar Malzemesi Alımı	158.261 ₺	12.10.2020	100
73 Kalem Makine ve Cihaz Alımı	541.880 ₺	30.09.2020	100

7.4. Hibe Yatırım Projeleri

7.4.1. Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası

Üniversitemiz ve hayırsever Nuri ÜYSEN arasında imzalan protokol ile Merkez Kampüste Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası'nın yapımına karar verilmiştir. Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası'nın yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanılmış olup, 2021 yılında projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Tablo 44. Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası Yapım İşine Ait Bilgiler

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	1.520 m ²
Bağışçı	Nuri ÜYSEN
Yapım Maliyeti	2.166.000 ₺
İşe Başlama Tarihi	27.07.2017
İş Bitiş Tarihi	-
Durum	Ek Protokol kapsamında süre verilmiş olup, yapım işi devam etmektedir.

8. Tamamlanan Projeler Listesi

8.1. Kampüs Altyapısı Projesi

2020 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 45’de sunulmuştur.

Tablo 45. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2020H03-151514 Kampüs Altyapısı	Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	
	İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet Yolu Yapım İşi	
	Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşi	
	Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapım İşi	
	İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşi	

8.2. Muhtelif İşler Projesi

2020 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 46’te sunulmuştur.

Tablo 46. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2020H03-151521 Muhtelif İşler	Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
	İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım	
	Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşi	
	Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşi	
	Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi Yapım İşi	
	İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi Yapım İşi	
	İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşi	
	İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım İşi	

8.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2020 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 47’de sunulmuştur.

Tablo 47. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2016H03-2681 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
	İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Uygulama Projesi Hazırlama Hizmet Alımı	

8.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 48’de sunulmuştur.

Tablo 48. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2016H03-2681 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	Mimarlık Fakültesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Merkezi Kütüphane	

9. Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporları

9.1. Mimarlık Fakültesi Projesi

Mimarlık Fakültesine Yapım İşine ait Proje Tamamlama Raporu Tablo 49'da sunulmuştur.

Tablo 49. Mimarlık Fakültesi Yapım İşine Ait Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H03-2681					
Proje Adı	Mimarlık Fakültesi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim Merkezi Derslik ve Birimler					
Proje Amacı	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi					
Proje Yeri	İskenderun/Hatay					
Karakteristiği	Eğitim (16.985 m2)					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	08.09.2017-17.01.2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi	23.08.2017	İhale Sözleşme Bedeli		36.655.000 ₺		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	36.655.000,00 ₺					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla					
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2017		3.890.875 ₺			3.890.875 ₺	
2018		11.534.213 ₺			11.534.213 ₺	
2019		14.287.663 ₺			14.287.663 ₺	
2020		880.667 ₺			880.667 ₺	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkanları artırılmıştır					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkanları artırılmıştır					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

9.2. Merkezi Kütüphane Projesi

Merkezi Kütüphane Yapım İşine ait Proje Tamamlama Raporu Tablo 49'da sunulmuştur.

Tablo 50. Merkezi Kütüphane Yapım İşine Ait Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H03-2681					
Proje Adı	Merkezi Kütüphane					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim Merkezi Derslik ve Birimler					
Proje Amacı	Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi					
Proje Yeri	İskenderun/Hatay					
Karakteristiği	Kütüphane (11.500 m2)					
Fiziki Hedefi	10.140 m2 hizmet binası					
Başlama-Bitiş Tarihi	06.09.2017-09.04.2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi	23.08.2017		İhale Sözleşme Bedeli	25.659.000 ₺		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
25.659.000,00 ₺						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2017		4.022.974 ₺			4.022.974 ₺	
2018		13.896.403 ₺			13.896.403 ₺	
2019		7.147.653 ₺			7.147.653 ₺	
2020		591.494 ₺			591.494 ₺	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkanları artırılmıştır					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkanları artırılmıştır					
Yapılan İşler- Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Merkezi Kütüphane Yapım işi 2019 yılında tamamlanarak aynı yıl geçici kabulü yapılmıştır. Yapım işinin kesin hesap ödemesi 2020 yılında yapılmıştır.					

10. ÖNERİLER

Çok yıllı proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesinin; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olduğu düşünülmektedir. Firmaların yüksek ihale tenzilatları nedeniyle işin yapım aşamasında güçlükler yaşanmaktadır. Döviz fiyatlarında olan dalgalanmalar nedeniyle başta inşaat demiri olmak üzere özellikle elektrik ve mekanik tesisat fiyatlarında olan beklenmeyen artışlar, inşaat maliyetlerinin artışına neden olmaktadır. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan Üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca hızlı karşılanması, bu Üniversitelerin fiziksel kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini sağlayacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna yönelik bazı değişiklikler yapılmasının sorunun çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir.

Tablo 51. 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Yıl Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	Toplam
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Haberleşme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	6	-	136.609	-	-	110.359	-	-	22.750	-	-	26.250	-	-	16.685
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devlet Kamu Hizmetleri (DKH)	1	-	9.700	-	-	6.946	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	700
DKH-İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DKH-Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	7	-	146.309	-	-	122.773	-	-	24.750	-	-	28.250	-	-	17.385



2021 - İskenderun
