

2023 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2024 - İskenderun



Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamının yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

23 Nisan 2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kendine özgü bir eğitim/öğretim/araştırma ekosistemi (TEKNOVERSİTE) oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyip tekniğe ve teknolojiye odaklanmış ve Endüstri 4.0'a eklenilen bir üniversite olmuştur.

Bu bağlamda bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunarak, inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci maddesi gereğince hazırlanması gereken 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda; yatırım proje uygulamaları, sonuçları, ödenekleri, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ve karşılaşılan sorunlara yer verilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için gereken özveriyi gösteren tüm idari ve akademik personelimize teşekkür eder, 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Prof. Dr. Tolga DEPCI
Rektör

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1. Kuruluş Tarihçesi.....	1
1.2. Akademik ve İdari Birimler.....	1
1.3. Misyon ve Vizyon.....	3
1.4. Temel Değerlerimiz.....	3
1.5. Amaç ve Hedefler.....	4
2. YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	5
3. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ.....	9
4- 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI .10	
4.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında;.....	10
4.2. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;.....	10
4.3. Muhtelif İşler Projesi kapsamında;.....	10
4.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;.....	11
5. 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI .12	
5.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	12
5.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu.....	12
5.3. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı ..	13
5.4. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	13
5.6. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)	14
5.7. Yayın Alımları Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı	15
5.8. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	15
6. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	16
6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	16

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar	16
7. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI	17
7.1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	17
7.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri.....	17
7.1.2. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım)	20
7.1.3. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat).....	22
7.1.4. Muhtelif İşler Projesi (Yazılım-Donanım).....	22
7.1.5. Yayın Alımı Projesi	23
7.1.6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	24
7.1.7. Kampüs Altyapısı Projesi.....	26
7.2. DHK Sosyal Sektörü (Teknolojik Araştırma).....	27
7.2.1. Merkezi Araştırma Merkezi	27
8. Tamamlanan Projeler Listesi	29
8.2. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım)	29
8.3. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat).....	30
8.4. Muhtelif İşler Projesi (Yazılım-Donanım)	30
8.5. Yayın Alım Projesi.....	31
8.6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	31
8.7. Kampüs Altyapı Projesi.....	32
9. ÖNERİLER.....	32

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluş Tarihçesi

Üniversitemiz 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6640 sayılı Kanun ve 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek-160 maddesi ile kurulmuştur.

1.2. Akademik ve İdari Birimler

Üniversitemiz akademik birimleri 7 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokul, 1 konservatuvar ve 1 enstitü, idari birimler ise Genel Sekreterliğe bağlı 10 birimden oluşmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde 8 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 13 koordinatörlük faaliyet göstermektedir.

Fakülteler

- ✓ Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
- ✓ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
- ✓ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- ✓ Mimarlık Fakültesi
- ✓ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- ✓ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- ✓ Turizm Fakültesi

Yüksekokul

- ✓ Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

- ✓ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
- ✓ Dört Yol Meslek Yüksekokulu
- ✓ Dört Yol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- ✓ Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
- ✓ İskenderun Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Konservatuvar

- ✓ Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı

Enstitüler

- ✓ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Genel Sekreterliğe Bağlı İdari Birimler

- ✓ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- ✓ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- ✓ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- ✓ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- ✓ Personel Daire Başkanlığı
- ✓ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- ✓ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- ✓ Hukuk Müşavirliği
- ✓ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

- ✓ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Koordinatörlükler

- ✓ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
- ✓ Bologna Koordinatörlüğü
- ✓ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
- ✓ Eğitim – Öğretim Koordinatörlüğü
- ✓ Engelsiz Birim Koordinatörlüğü
- ✓ İşletmede Mesleki Eğitim Genel Koordinatörlüğü
- ✓ Kalite Koordinatörlüğü
- ✓ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
- ✓ Proje Destek Koordinatörlüğü

- ✓ Sıfır Atık Koordinatörlüğü
- ✓ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü
- ✓ Uzaktan Bilgisayarlı Öğretim Merkezi (UBÖM) Koordinatörlüğü
- ✓ YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü

1.3. Misyon ve Vizyon

Misyon

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin misyonu; "bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmek" olarak belirlenmiştir.

Vizyon

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin vizyonu; "Dörtlü Sarmal Modeli: Üniversite-sanayi- kamu-toplum" bütünleşmesini sağlayarak Türkiye'nin inovasyon odaklı kalkınma modeline katkı sağlayan, değer katan, tercih edilen, insanı ve inovasyonu önceleyen bir "Teknoersite olmak" olarak belirlenmiştir.

1.4. Temel Değerlerimiz

- ✓ Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlke ve Değerlerine Bağlılık
- ✓ Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık
- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ Etik Değerlere Bağlılık
- ✓ Girişimcilik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Sosyal Sorumluluk
- ✓ Paydaş Odaklılık
- ✓ Hesap Verilebilirlik

1.5. Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak	
Hedef 1	Mezun öğrenci sayısını ve mezunların mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğini arttırmak, mezunlarla iletişimi güçlendirmek
Hedef 2	Üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası etkinlik (sempozyum, kongre, sergi, konser vb.) sayısını arttırmak
Hedef 3	Bölümlerin doluluk oranlarını arttırmak
Hedef 4	Akredite bölüm ve laboratuvar sayısını arttırmak
Hedef 5	Kütüphane kaynaklarını arttırmak
Stratejik Amaç 2. Bilimsel araştırma kapasitesini ve sanayi ile çalışma kabiliyetini güçlendirmek	
Hedef 1	Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak
Hedef 2	Üniversite fikri mülkiyet hakları çalışmalarını etkinleştirmek
Hedef 3	Akademisyen ve öğrencilerin araştırma desteklerinden daha fazla faydalanmasını sağlamak
Hedef 4	Üniversite sanayi ortaklı proje ve etkinlik sayısını arttırmak
Hedef 5	Akademisyen ve öğrencilerin şirketleşme sayılarını artırmak
Stratejik Amaç 3. Uluslararası işbirliklerini ve hareketliliğini artırmak	
Hedef 1	Üniversitedeki yurtdışı doktoralı ve yabancı öğretim elemanı sayısını arttırmak
Hedef 2	Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak
Hedef 3	Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak
Hedef 4	Üniversite araştırma faaliyetlerinde aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısını arttırmak
Hedef 5	Üniversitenin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini arttırmak

Stratejik Amaç 4. Üniversitenin toplum ile olan bütünleşmesini sağlamak	
Hedef 1	Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak
Hedef 2	Üniversite tarafından verilen sertifikalı eğitim sayısını arttırmak
Hedef 3	Üniversite dışı kurumlarla (STK, belediye vb.) yürütülen ortak faaliyet sayısını arttırmak
Hedef 4	Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısını arttırmak
Stratejik Amaç 5. Üniversitenin fiziksel, teknolojik ve insan kaynakları altyapısını tamamlamak ve güçlendirmek	
Hedef 1	Yerleşkelerin fiziksel altyapı olanaklarını tamamlamak ve iyileştirmek
Hedef 2	Üniversitenin bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Hedef 3	Üniversitede nitelikli akademik ve idari personel sayısını arttırmak
Hedef 4	Üniversite yerleşkelerinin ekolojik denge gözetilerek yeşil ve sosyal alan altyapılarını düzenlemek

2. YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.




Şekil 1. Finansman Kaynakları

Üniversitemizin 2023 yılı yatırım projelerinin finansman kaynağına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Üniversitemize 2023 yılında 41.502.000₺ hazine yardımı gerçekleşmiş olup, Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesine 8.754.000₺, Muhtelif İşler Projesine 57.527.000₺, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 5.000.000₺, Merkezi Araştırma Projesine 6.000.000₺ ekleme yapılmış ve Muhtelif İşler Projesinden 277.000₺ düşülmüştür. 2023 Yılı Yatırım Projelerinin toplam bütçesi 118.506.000₺ olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1. 2023 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2023 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları				
			Özel Bütçe				
			Hazine	Öz Gelir	Eklenen	Düşülen	Toplam
Eğitim (Yükseköğretim)	2021H03-167624	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri	500.000₺	-	8.754.000₺	-	9.254.000₺
	2021H03-167629	Muhtelif İşler	15.000.000₺	-	57.527.000₺	277.000₺	72.250.000₺
	2021H03-167626	Yayın Alımları	2.500.000₺	-	-	-	2.500.000₺
	2016H03-2681	Derslik ve Merkezi Birimler	16.000.000₺	-	5.000.000₺	-	21.000.000₺
	2020H03-151514	Kampüs Altyapısı	6.000.000₺	-	-	-	6.000.000₺
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)	2017H05-3604	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.500.000₺	-	-	-	1.500.000₺
DHK (Teknolojik Araştırma)	2017K12-15021	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000₺	-	6.000.000₺	-	6.002.000₺
Genel Toplam			41.502.000₺	-	77.281.000₺	277.000₺	118.506.000₺

Grafik 1. 2023 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı

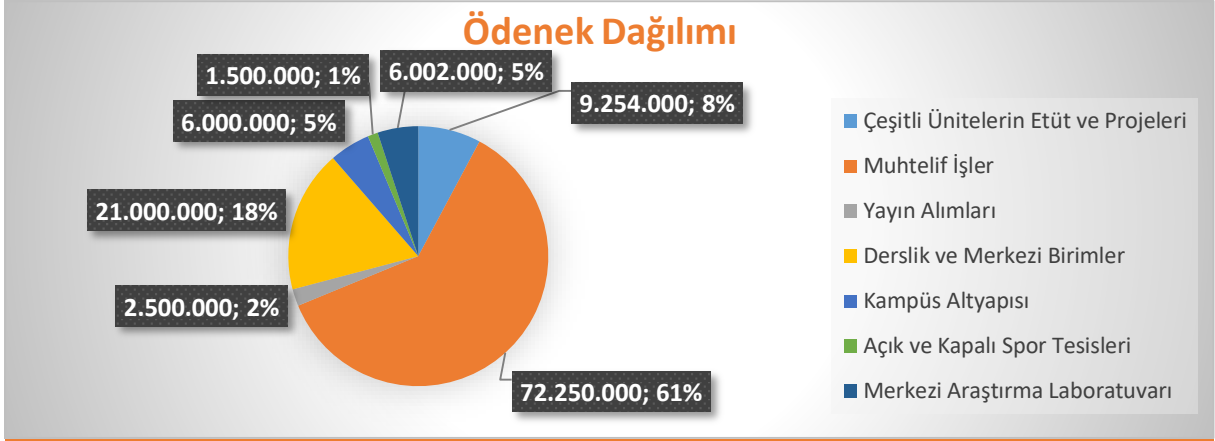

Üniversitemizin 2023 yılı yatırım harcamalarının bütçe verilerine göre dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2023 Yılı Bütçe Verilerine Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı

Eko. Kod	Gider Türü	2023 KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	10.002.000₺	10.725.000₺	152.000₺	20.575.000₺	13.802.799₺	67
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	800.000₺	-	125.000₺	675.000₺	674.388₺	99
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	22.500.000₺	14.404.000₺	-	36.904.000₺	3.550.941₺	9
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	200.000₺	152.000₺	-	352.000₺	331.709₺	94
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	8.000.000₺	52.000.000₺	-	60.000.000₺	37.557.934₺	62
06	Sermaye Giderleri	41.502.000₺	77.281.000₺	277.000₺	118.506.000₺	55.917.771₺	47

Grafik 2. 2023 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı



2022 ve 2023 yılı yatırım harcamalarının gerçekleşme oranları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. 2022 ve 2023 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Verileri

Proje Adı	2022 Yılı Yatırım Proje Bilgileri			2023 Yılı Yatırım Proje Bilgileri		
	Toplam Bütçe	2022 Yılı Harcaması	Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Bütçe	2023 Yılı Harcaması	Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim (Yüksek Öğretim)	43.136.539₺	32.263.937₺	75	111.004.000₺	49.915.769₺	45
Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	50.000₺	-	-	9.254.000₺	766.500₺	8
Muhtelif İşler	10.500.000₺	8.830.110₺	84	72.250.000₺	46.971.759₺	65
Yayın Alımı	1.000.000₺	144.116₺	14	2.500.000₺	38.016₺	2
Derslik ve Merkezi Birimler	28.586.539₺	21.871.420₺	76	6.000.000₺	2.139.494₺	36
Kampüs Altyapısı	3.000.000₺	1.418.291₺	47	21.000.000₺	-	-
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor Sektörü)	1.500.000₺	950.149₺	63	1.500.000₺	-	-
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.500.000₺	950.149₺	63	1.500.000₺	-	-
DHK (Teknolojik Araştırma)	1.000.000₺	1.000.000₺	100	6.002.000₺	6.002.000₺	100
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000.000₺	1.000.000₺	100	6.002.000₺	6.002.000₺	100
Genel Toplam	45.636.539₺	34.214.086₺	75	118.506.000₺	55.917.769₺	47

3. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemiz hizmetlerini toplam 1.497.024 m²'lik yerleşke alanı üzerindeki 110.709 m²'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu açık alanların detayları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Taşınmazlara Ait Açık Alan ve Mülkiyet Türü Bilgisi

Sıra No	Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²)			2023
		Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m ²)
1	Merkez Yerleşke	-	759.272,28	-	759.272,28
2	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi	-	10.000,23	-	10.000,23
3	Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yerleşkesi	-	10.000,00	-	10.000,00
4	İskenderun Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	85.216,03	61.480,90	-	146.696,93
5	Dörtüol Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	556.860,00	-	556.860,00
6	Sarıseki Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	9.104,65	-	9.104,65
7	Arsuz Piriçlik	-	5.090,71	-	5.090,71
Genel Toplam		85.216,03	1.411.808,77	-	1.497.024,80

Üniversitemize ait taşınmazların kapalı alan bilgisi Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Taşınmazlara Ait Kapalı Alan Bilgisi

Sıra No	Yerleşke Adı	Hizmet Biriminin Adı	Yapım Yılı	Toplam Alan (m ²)
1	Merkez Yerleşke	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	2014	14.984,00
		Mimarlık Fakültesi	2020	17.600,00
		Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	2009	15.113,39
		Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina (Makine Mühendisliği Hizmet Binası)	2012	8.284,00
		Kütüphane Bilgi Keşif Merkezi	2019	10.390,42
		Gastronomi ve Fuar Merkezi	2019	8.777,38
		Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi	2014	3.493,00
		Açık Spor Tesisleri	2012	6.487,00

Sıra No	Yerleşke Adı	Hizmet Biriminin Adı	Yapım Yılı	Toplam Alan (m ²)
1	Merkez Yerleşke	Kapalı Spor Tesisleri	2022	7.203,00
		Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM)	2022	4.000,00
		Nejla ÜYSEN Bilgi Teknolojileri Merkezi	2022	1.500,00
		İSTE Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi	2022	120,00
2	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı	2007	5.712,00
		İdari Bina	2007	464,00
3	Dört Yol Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	Dört Yol Meslek Yüksekokulu	2001	6.581,00
Genel Toplam				110.709,19

4- 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

4.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında;

2023 yılında yaşanan deprem nedeniyle hasar gören binaların güçlendirme ve onarım işleri ile yıkılan binaların yeniden inşasına yönelik etüt-plan-proje çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda: Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binasının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi, İskenderun Meslek Yüksekokulu Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı, İMYO Yerleşkesi İmar ve Parselasyon Uygulama Dosyası Hazırlama Hizmet Alımı işleri yapılmıştır.

4.2. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;

Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2022 yılı sonunda ihale edilen İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşleri yaşanan deprem nedeniyle sekteye uğramış olsa da yıl içinde çalışmalara yeniden başlanılarak, çalışmalar yıl içerisinde bitirilmiştir. Yine aynı proje kapsamında deprem nedeniyle hasar gören altyapının onarımına yönelik çalışmalar yapılmış ve ivedilikle tamamlanmıştır.

4.3. Muhtelif İşler Projesi kapsamında;

Daire Başkanlığımız 2023 yılı çalışmalarının yoğunluğunu deprem nedeniyle onarım ihtiyacı ortaya çıkan bina ve tesislerin onarımı oluşturmuştur. Bu bağlamda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin onarımına yönelik başlatılan çalışmalar

2023 yılı sonunda tamamlanarak hizmet binası, derslik ve diğer eğitim alanları yeniden kullanımı açılmıştır. Bu proje kapsamında kesin hesap ödemeleri yapılmıştır.

4.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;

İhalesi 2020 yılında yapılan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşi yüklenici tarafından sözleşmede öngörülen süre içerisinde tamamlanmamış olup, yüklenicinin sözleşmesi fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilmiştir. Yapılan tasfiye işlemi sonrasında Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezinin tamamlanması amacıyla ikmal ihalesine çıkılmış, ancak düzenlenen ihaleye herhangi bir teklif gelmediğinden iptal edilmiştir. Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi ikmalinin 2024 yılında ihale edilerek tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz yatırım programına 2021 yılında alınan Hangar ve Atölyeler Binası 2022 yılı sonunda tamamlanmış ve geçici kabul işlemlerine başlanılmıştır. Bununla birlikte geçici kabul işlemleri sırasında meydana gelen deprem afeti tüm diğer çalışmalar gibi Hangar ve Atölyeler Binasının geçici kabul işlemlerini sekteye uğratmıştır. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz yatırım programına 2023 yılında alınan Teknik Birimler Hizmet Binasına yönelik proje çalışmaları tamamlanamadığından, bu yatırım çalışması 2024 yılına kalmıştır.

5. 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

5.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2023 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje No	2023H03-212401
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binasının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
İskenderun Meslek Yüksekokulu Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
İMYO Yerleşkesi İmar ve Parselasyon Uygulama Dosyası Hazırlama Hizmet Alımı	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

2023 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Proje No	2016H03-2681
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Hangar ve Atölyeler Binası	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Teknik Birimler Hizmet Binası	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.3. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2023 yılı Kampüs Altyapısı Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8. Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Proje No	2020H03-151514
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşİ	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Depremde Hasar Gören Su Kuyularının Yerine Yeni Kuyu Açılması Yapım İşİ	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.4. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2023 yılı Muhtelif İşler Projesi (Bakım-Onarım) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Bakım-Onarım)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2023H03-212397
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
İSTE Çeşitli Birimlerde Deprem Hasarı Onarımı Yapılması Yapım İşİ	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
İste Çeşitli Bakım Onarım ve Tadilat 2022-1 Yapım İşİ	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir
Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşİ	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir

5.5. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı (Makine-Teçhizat)

2023 yılı Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 10'da sunulmuştur.

Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Makine-Teçhizat)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2021H03-167629
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz birimleri makine, teçhizat, bilgisayar, yazılım, altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.6. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

2023 yılı Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 11'de sunulmuştur.

Tablo 11. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2023H03-186464
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılan web otomasyonları, yazılım uygulamaları vb. program lisans ve lisans güncellemelerinin yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.7. Yayın Alımları Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı

2023 yılı Yayın Alımları Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 12’de sunulmuştur.

Tablo 12. Yayın Alımları Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Yayın Alımları Projesi
Proje No	2021H03-167626
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Veri Tabanı Aboneliği	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.8. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2023 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 13’de sunulmuştur.

Tablo 13. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu

Sektör	DHK (Teknolojik Araştırma)
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Proje No	2017K12-15021
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı mal ve malzeme alımı	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

6. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

2023 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 41.502.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup, 77.281.000₺ ödenek eklemiş ve 277.000₺ ödenek düşülmüş olup toplam kullanılabilir ödenek 118.506.000₺'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 54.917.769₺ harcama yapılmış, harcanmayan 63.588.231₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Yapılan harcamanın ödeneğe oranı % 46'dır.

Tablo 14. Sektör Bazında Ödenek Durum Bilgisi

Sektör	2023 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları				
	Özel Bütçe				
	Ödenek	Eklenen	Düşülen	Toplam	Harcama
Eğitim (Yükseköğretim)	40.000.000 ₺	71.281.000 ₺	277.000 ₺	111.004.000 ₺	49.915.769 ₺
Eğitim (Bedensel Eğitimi ve Spor)	1.500.000 ₺	-	-	1.500.000 ₺	-
DHK (Teknolojik Araştırma)	2.000 ₺	6.000.000 ₺	-	6.002.000 ₺	6.002.000 ₺
Genel Toplam	41.502.000 ₺	77.281.000 ₺	277.000 ₺	118.506.000 ₺	54.917.769 ₺

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlıklı 25 inci maddesinde; "...Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir..." denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

işğında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

a. Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.

b. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.

c. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.

d. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.

7. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

7.1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü

7.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri

2023 yılında yaşanan deprem nedeniyle hasar gören binaların güçlendirme ve onarım işleri ile yıkılan binaların yeniden inşasına yönelik etüt-plan-proje çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda: Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binasının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi, İskenderun Meslek Yüksekokulu Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı, İMYO Yerleşkesi İmar ve Parselasyon Uygulama Dosyası Hazırlama Hizmet Alımı işleri yaptırılmış olup detaylar Tablo 15 'te verilmiştir.

Tablo 15. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binasının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi	Etüt-Proje	01.09.2023 20.11.2023	100
İskenderun Meslek Yüksekokulu Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı	Etüt-Proje	30.05.2023 04.07.2023	100
İMYO Yerleşkesi İmar ve Parselasyon Uygulama Dosyası Hazırlama Hizmet Alımı	Etüt-Proje	10.11.2023 31.12.2023	100

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi kapsamında hazırlanan “Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binasının Güçlendirme Projeleri” yapım işine ait bilgiler Tablo 16’da verilmiştir.

Tablo 16. Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binasının Güçlendirme Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	01.09.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	78.000 ₺
Sözleşme Tarihi	01.09.2023
Yer Teslim Tarihi	01.09.2023
İşin Süresi	20 Gün
İş Bitim Tarihi	20.11.2023
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibarıyla)	78.000 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi kapsamında hazırlanan “İskenderun Meslek Yüksekokulu Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporlarının” yapım işine ait bilgiler Tablo 17’de verilmiştir.

Tablo 17. İskenderun Meslek Yüksekokulu Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporları Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	30.05.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	412.500 ₺
Sözleşme Tarihi	30.05.2023
Yer Teslim Tarihi	30.05.2023
İşin Süresi	20 Gün
İş Bitim Tarihi	04.07.2023
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibarıyla)	412.500 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi kapsamında hazırlanan “İMYO Yerleşkesi İmar ve Parselasyon Uygulama Dosya Hazırlanması” yapım işine ait bilgiler Tablo 18’de verilmiştir.

Tablo 18. İMYO Yerleşkesi İmar ve Parselasyon Uygulama Dosya Hazırlanması Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	10.11.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	276.000 ₺
Sözleşme Tarihi	10.11.2023
Yer Teslim Tarihi	01.09.2023
İşin Süresi	52 Gün
İş Bitim Tarihi	31.12.2023
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibarıyla)	276.000 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

7.1.2. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım)

2023 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım) Kapsamında 3 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 64.047.866 ₺ hak ediş ödemesi yapılmıştır.

Tablo 19. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	İSTE Çeşitli Birimlerde Deprem Hasarı Onarımı Yapılması Yapım İşİ	Gayrimenkul Büyük Onarım	05.09.2023 03.12.2023	100
2	İste Çeşitli Bakım Onarım ve Tadilat 2022-1 Yapım İşİ	Kesin Hesap Ödemesi	29.06.2022 29.09.2022	100
3	Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşİ	Kesin Hesap Ödemesi	29.01.2018 24.03.2021	100

2023 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında "İSTE Çeşitli Birimlerde Deprem Hasarı Onarımı Yapım İşine" ait bilgiler Tablo 20'de verilmiştir.

Tablo 20. İSTE Çeşitli Birimlerde Deprem Hasarı Onarım Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	07.08.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	40.564.782 ₺
Sözleşme Tarihi	01.09.2023
Yer Teslim Tarihi	05.09.2023
İşin Süresi	90 Gün
İş Bitim Tarihi	03.12.2023
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibarıyla)	37.528.881 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

2023 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında “Çeşitli Bakım Onarım ve Tadilat 2022-1 Yapım İşine” ait bilgiler Tablo 21’de verilmiştir.

Tablo 21. Çeşitli Bakım Onarım ve Tadilat 2022-1 Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	14.06.2022
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	1.533.377₺
Sözleşme Tarihi	28.06.2022
Yer Teslim Tarihi	29.06.2022
İşin Süresi	90 Gün
İş Bitim Tarihi	29.09.2022
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	1.533.377₺
Fiziki Gerçekleşme	100

2023 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında “Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşine” ait bilgiler Tablo 22’de verilmiştir.

Tablo 22. Kapalı Spor Kompleksi Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	08.12.2017
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	24.985.608 ₺
Sözleşme Tarihi	23.01.2018
Yer Teslim Tarihi	29.01.2018
İşin Süresi	1.077 Gün
İş Bitim Tarihi	24.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	24.985.608 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

7.1.4. Muhtelif İşler Projesi (Yazılım-Donanım)

2023 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 19 adet alım gerçekleştirilmiş olup, 6.495.638 ₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 23. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Dizüstü Bilgisayar Alımı	Makine - Teçhizat	25.04.2023 25.04.2023	100
2	Kabinet Alımı	Makine - Teçhizat	10.11.2023 10.11.2023	100
3	Yedekleme Ünitesi Alımı	Makine - Teçhizat	04.09.2023 04.09.2023	100
4	Bilgisayar Monitörü Alımı	Makine - Teçhizat	09.11.2023 09.11.2023	100
5	Bütünleşik Bilgisayar Alımı	Makine - Teçhizat	20.10.2023 20.10.2023	100
6	Switch Alımı	Makine - Teçhizat	24.11.2023 24.11.2023	100
7	Güç Kaynağı Alımı	Makine - Teçhizat	12.12.2023 12.12.2023	100
8	Hardisk Alımı ve Yedekleme Ünitesi	Makine - Teçhizat	23.11.2023 23.11.2023	100
9	Mal ve Malzeme Alımı	Makine - Teçhizat	20.11.2023 20.11.2023	100
10	IP Santral ve IP Telefon Alımı	Makine - Teçhizat	19.10.2023 19.10.2023	100
11	Güvenlik Kamerası Alımı	Makine - Teçhizat	20.10.2023 20.10.2023	100
12	Projeksiyon Alımı	Makine - Teçhizat	24.11.2023 24.11.2023	100
13	Güvenlik duvarı cihazı URL Filtreleme	Yazılım	03.07.2023 03.07.2023	100
14	Lisansı güncellemesi	Yazılım	03.07.2023 03.07.2023	100
15	Öğrenci	Yazılım	03.07.2023 03.07.2023	100
16	Microsoft Üyelik Lisans	Yazılım	03.07.2023 03.07.2023	100
17	Çizim ve Tasarım	Yazılım	03.07.2023 03.07.2023	100
18	Kütüphane Bilgi Otomasyon	Yazılım	03.07.2023 03.07.2023	100
19	Personel Otomasyonu	Yazılım	03.07.2023 03.07.2023	100

2023 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında “Microsoft Eğitim Çözümleri ve Eğitim Lisansı Alımı İşine” ait bilgiler tablo 24’te gösterilmiştir.

Tablo 24. Microsoft Eğitim Çözümleri ve Eğitim Lisansı Alım İşine Ait Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	03.07.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	206.898 ₺
Sözleşme Tarihi	03.07.2023
İşin Süresi	1 Yıl
İş Bitim Tarihi	03.07.2024
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibarıyla)	206.898 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

7.1.5. Yayın Alımı Projesi

2023 yılı içerisinde Yayın Alımı Projesi Kapsamında yazılım alımı gerçekleştirilmiş olup, 38.016 ₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 25. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Piri Keşif Aracı Alımı	Yazılım	01.01.2023 31.12.2023	100

2023 yılı içerisinde Yayın Alımları Projesi Kapsamında gerçekleştirilen “Piri Keşif Aracı Alım İşine” ait bilgiler tablo 26’da gösterilmiştir.

Tablo 26. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Veri Tabanı Alım İşleri Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	01.01.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	38.016 ₺
Sözleşme Tarihi	01.01.2023
İşin Süresi	365 gün
İş Bitim Tarihi	31.12.2023
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibarıyla)	38.016 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

7.1.6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2023 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 3 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 27.537.222 ₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 27. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşİ	Eğitim (1.500 m ²)	2020-2024	59
2	Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşİ	Eğitim (4.000 m ²)	2021-2023	100
3	Teknik Birimler Hizmet Binası	Hizmet Binası (5.000 m ²)	2023-2025	0

2023 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında gerçekleştirilen “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşİne” ait bilgiler tablo 28’de gösterilmiştir.

Tablo 28. Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

Büyüküğü (Kapalı Alan)	1.500 m ²
İhale Tarihi	-
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	-
Sözleşme Tarihi	-
Yer Teslim Tarihi	-
İşin Süresi	-
İş Bitim Tarihi	-
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	2.197.924₺
Fiziki Gerçekleşme	%59

2023 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşine ait bilgiler tablo 29’da gösterilmiştir.

Tablo 29. Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	4.000 m2
İhale Tarihi	05.10.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	25.339.298 ₺
Sözleşme Tarihi	09.11.2021
Yer Teslim Tarihi	12.11.2021
İşin Süresi	360 Gün
İş Bitim Tarihi	06.11.2022
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	22.388.279 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

2023 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında gerçekleştirilen “Teknik Birimler Hizmet Binası Yapım İşine” ait bilgiler tablo 30’da gösterilmiştir.

Tablo 30. Teknik Birimler Hizmet Binası Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

Büyükklüğü (Kapalı Alan)	5.000 m2
İhale Tarihi	-
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	-
Sözleşme Tarihi	-
Yer Teslim Tarihi	-
İşin Süresi	-
İş Bitim Tarihi	-
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	-
Fiziki Gerçekleşme	0

7.1.7. Kampüs Altyapısı Projesi

2023 yılı içerisinde Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında 2 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 3.192.986₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 31. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşİ	Galeri Hattı-Su Hattı-Kanalizasyon	01.12.2022 15.07.2023	100
2	Depremde Hasar Gören Su Kuyularının Yerine Yeni Kuyu Açılması Yapım İşİ	Su Kuyusu	22.02.2023 03.03.2023	100

2023 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen “Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşİne” ait bilgiler tablo 32’de gösterilmiştir.

Tablo 32. Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	07.11.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	3.008.610 ₺
Sözleşme Tarihi	30.11.2022
Yer Teslim Tarihi	01.12.2022
İşin Süresi	225 Gün
İş Bitim Tarihi	15.07.2023
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	2.984.126 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

2023 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen “Depremde Hasar Gören Su Kuyularının Yerine Yeni Kuyu Açılması Yapım İşine” ait bilgiler tablo 33’de gösterilmiştir.

Tablo 33. Depremde Hasar Gören Su Kuyularının Yerine Yeni Kuyu Açılması Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	22.02.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	208.860 ₺
Sözleşme Tarihi	22.02.2023
Yer Teslim Tarihi	22.02.2023
İşin Süresi	10Gün
İş Bitim Tarihi	03.03.2023
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	208.860 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

7.2. DHK Sosyal Sektörü (Teknolojik Araştırma)

7.2.1. Merkezi Araştırma Merkezi

2023 yılı içerisinde Merkezi Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında 2 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 1.250.300₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 34. Merkezi Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Elektromekanik Çekme/Basma Test Cihazı Alım İşİ	Makine - Teçhizat	02.02.2021 02.02.2023	100
2	Simultane Termal Analizör (TC ve DSC Testleri) Sistemi ve Otomatik Yağ Tayin Cihazı	Makine - Teçhizat	12.04.2021 12.04.2023	100

2023 yılı içerisinde Merkezi Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında gerçekleştirilen “Elektromekanik Çekme/Basma Test Cihazı Alım İşine” ait bilgiler tablo 35’de gösterilmiştir.

Tablo 35. Elektromekanik Çekme/Basma Test Cihazı Alımı Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	02.02.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	849.600 ₺
Sözleşme Tarihi	02.02.2021
Yer Teslim Tarihi	02.02.2021
İşin Süresi	1 gün
İş Bitim Tarihi	02.02.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	905.233
Fiziki Gerçekleşme	100

2023 yılı içerisinde Merkezi Araştırma Merkezi Projesi Kapsamında gerçekleştirilen “Simultane Termal Analizör (TC ve DSC Testleri) Sistemi ve Otomatik Yağ Tayin Cihazı Alım İşine” ait bilgiler tablo 36’da gösterilmiştir.

Tablo 36. Simultane Termal Analizör (TC ve DSC Testleri) Sistemi ve Otomatik Yağ Tayin Cihazı Alımı Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	12.04.2023
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	900.000 ₺
Sözleşme Tarihi	12.04.2023
Yer Teslim Tarihi	12.04.2023
İşin Süresi	1 gün
İş Bitim Tarihi	12.04.2023
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2023 itibariyle)	900.000 ₺
Fiziki Gerçekleşme	100

8. Tamamlanan Projeler Listesi

8.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi

2023 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 37'de verilmiştir.

Tablo 37. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167624	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binasının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
	İskenderun Meslek Yüksekokulu Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı	
	İMYO Yerleşkesi İmar ve Parselasyon Uygulama Dosyası Hazırlama Hizmet Alımı	

8.2. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım)

2023 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 38'de verilmiştir.

Tablo 38. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım) Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167629	İSTE Çeşitli Birimlerde Deprem Hasarı Onarımı Yapılması Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
	İste Çeşitli Bakım Onarım ve Tadilat 2022-1 Yapım İşi	
	Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşi	

8.3. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)

2023 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 39'da verilmiştir.

Tablo 39. Muhtelif İşler Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167629	Atatürk Portresi Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Endüstriyel Elektrik Süpürgesi	
	Yıkama Makinesi	
	Çerçevesel Resim	
	Büro Malzemeleri	

8.4. Muhtelif İşler Projesi (Yazılım-Donanım)

2023 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 40'da verilmiştir.

Tablo 40. Muhtelif İşler Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167629	Dizüstü Bilgisayar Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Kabinet Alımı	
	Yedekleme Ünitesi Alımı	
	Bilgisayar Monitörü Alımı	
	Bütünleşik Bilgisayar Alımı	
	Switch Alımı	
	Güç Kaynağı Alımı	
	Hardisk Alımı ve Yedekleme Ünitesi	
	Mal ve Malzeme Alımı	

	IP Santral ve IP Telefon Alımı	
	Güvenlik Kamerası Alımı	
	Projeksiyon Alımı	
	Güvenlik duvarı cihazı URL Filtreleme	
	Lisansı güncellemesi	
	Öğrenci	
	Microsoft Üyelik Lisans	
	Çizim ve Tasarım	
	Kütüphane Bilgi Otomasyon	
	Personel Otomasyonu	

8.5. Yayın Alım Projesi

2023 yılı Yayın Alım Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 41’de verilmiştir.

Tablo 41. Yayın Alım Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167626	Piri Keşif Aracı Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi

8.6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2023 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 42’de verilmiştir.

Tablo 42. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2016H03-2681	Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşİ	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşİ	
	Teknik Birimler Hizmet Binası	

8.7. Kampüs Altyapı Projesi

2023 yılı Kampüs Altyapı Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 43'te verilmiştir.

Tablo 43. Kampüs Altyapı Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2020H03-151521	İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Depremde Hasar Gören Su Kuyularının Yerine Yeni Kuyu Açılması Yapım İşi	

9. ÖNERİLER

Çok yıllık proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesinin; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olduğu düşünülmektedir. Firmaların yüksek ihale teklifleri nedeniyle işin yapım aşamasında güçlükler yaşanmaktadır. Döviz fiyatlarında olan dalgalanmalar nedeniyle başta inşaat demiri olmak üzere özellikle elektrik ve mekanik tesisat fiyatlarında olan beklenmeyen artışlar, inşaat maliyetlerinin artışına neden olmaktadır. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan Üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca hızlı karşılanması, bu Üniversitelerin fiziksel kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini sağlayacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna yönelik bazı değişiklikler yapılmasının sorunun çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir.

Tablo 44. 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Yıl Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim (Yükseköğretim)	5		138.083.152₺			36.083.152₺			40.000.000₺			71.004.000₺			49.915.769₺
Sağlık															
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)	1		5.585.000₺			950.149₺			1.500.000₺			1.500.000₺			-
DKH-İktisadi															
DKH-(Teknolojik Araştırma)	1		21.002.000₺			21.000.000₺			2.000₺			6.002.000₺			6.002.000₺
Genel Toplam															



2023 - İskenderun
