



İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2017 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2018-İskenderun





ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversiteler, toplum için nitelikli insan gücü yetiştiren, bilgiyi üreten, üretilen bilginin çoğalmasını ve yayılmasını sağlayan, toplum için faydalı bir ürüne veya hizmete dönüşmesine imkân veren eğitim/öğretim ve araştırma kurumlarıdır.

İskenderun Teknik Üniversitesi olarak bizim temel hedefimiz, kendine özgü bir eğitim/öğretim ve araştırma modeli oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyen ve teknolojiye odaklanan ‘özgün’ bir Üniversite olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, teknolojiyi takip eden veya tüketen değil, üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen ve özgüveni yüksek bireylerin kendisini yetiştirebileceği ve geliştirebileceği, herkesin kendini bilebileceği ve bulabileceği, proje odaklı bir “ekosistem” oluşturmak arzusundayız. Bu ekosistemi oluşturmak ve hedeflere ulaşmak için yatırımlar yapılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25. maddesinde kamu idarelerinin “Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.” denilmektedir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çerçevesi çizilen yeni mali yönetim sisteminin öngördüğü hesap verme sorumluluğunun temel dokümanlarından biri olan 2017 yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Türkay DERELİ
Rektör

İÇİNDEKİLER

KONU	SAYFA NO
1. GENEL DEĞERLENDİRME	01-08
1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI	01
1.2 KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	03-04
1.3 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	04-08
1.4 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	08
1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu	08
1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	08
2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI	09
2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ	09
2.1.1 Etüd-Proje İşleri	09
2.1.2 Devam Eden Projeler	10-13
2.1.3 Yeni Projeler	13-16
2.2.EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	17
2.2.1 Yeni Projeler	17
2.3. DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	18
2.3.1 Yeni Projeler	18
2.4. HİBE YATIRIM PROJELERİ	18
2.5 TAMAMLANAN PROJELER	19
2.5.1 Tamamlanan Projelerin Listesi	19-21
2.6 PROJE TAMAMLAMA RAPORU	21-26
3-YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK	26-27

TABLO DİZİNİ

TABLO ADI	SAYFA NO
Tablo 1: 2017 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar	01
Tablo 2: Taşınmaz Durumu-(Açık Alan)	03
Tablo 3: Taşınmaz Durumu (Kapalı Alan)	03-04
Tablo 4: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi-Hedeflenen-Gerçekleşen İşler	05
Tablo 5: Derslik ve Merkezi Birimler Hedeflenen-Gerçekleşen İşler	05
Tablo 6: Kampüs Altyapısı Hedeflenen-Gerçekleşen İşler	06
Tablo 7: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Hedeflenen-Gerçekleşen İşler	06
Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Bakım Onarım)	06-07
Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Makine-Teçhizat Alımı)	07-08
Tablo 10: Yayın Alımları Projesi-Hedeflenen-Gerçekleşen İşler	08
Tablo 11: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	09
Tablo 12: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	10
Tablo 13: Mimarlık Fakültesi Yapım İşleri Proje Bilgi Tablosu	10
Tablo 14: Merkezi Kütüphane Yapım İşleri Proje Bilgi Tablosu	11
Tablo 15: Merkezi Yemekhane Yapım İşleri Proje Bilgi Tablosu	12
Tablo 16: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	13
Tablo 17: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	13-14
Tablo 18: Muhtelif İşler (Bakım Onarım) Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	14-15
Tablo 19: İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşleri Bilgi Tablosu	15
Tablo 20: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	16
Tablo 21: Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşleri Bilgi Tablosu	17
Tablo 22: Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası Bilgi Tablosu	18
Tablo 23: Tamamlanan Projeler Listesi	19-21
Tablo 24: Merkez Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporu	22
Tablo 25: Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporu	23
Tablo 26: Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporu	24
Tablo 27: Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Bakım Onarım Yapım İşleri	25
Tablo 28: 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	27

GRAFİK

GRAFİK ADI

SAYFA
NO

Grafik 1: Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği

2

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1- KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI:

Üniversitemiz, 2017 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı;

A- Özel Bütçe

1. Hazine Yardımı
2. Öz Gelir


Üniversitemizin 2017 yılına ait proje, ödenek ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2017 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2017 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları		
			Özel Bütçe		Toplam
			Hazine	Öz gelir	
Eğitim Yükseköğretim	2017H032670	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	657.000,00	0,00	657.000,00
	2017H032680	Muhtelif İşler Projesi	6.773.042,00	0,00	6.773.042,00
	2017H032690	Yayın Alımı Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
	2016H032680	Derslik ve Merkezi Birimler	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	2016H032690	Kampüs Altyapısı	9.365.000,00	0,00	9.365.000,00
Eğitim Bedensel Eğitimi ve Spor	2017H050050	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
DKH Teknolojik Araştırma	2017K121610	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Genel Toplam			33.495.042,00	0,00	33.495.042,00

2017 yılında yatırım projelerine ilişkin olarak, aktarma ve ekleme dahil tahsis edilen ödenek dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği

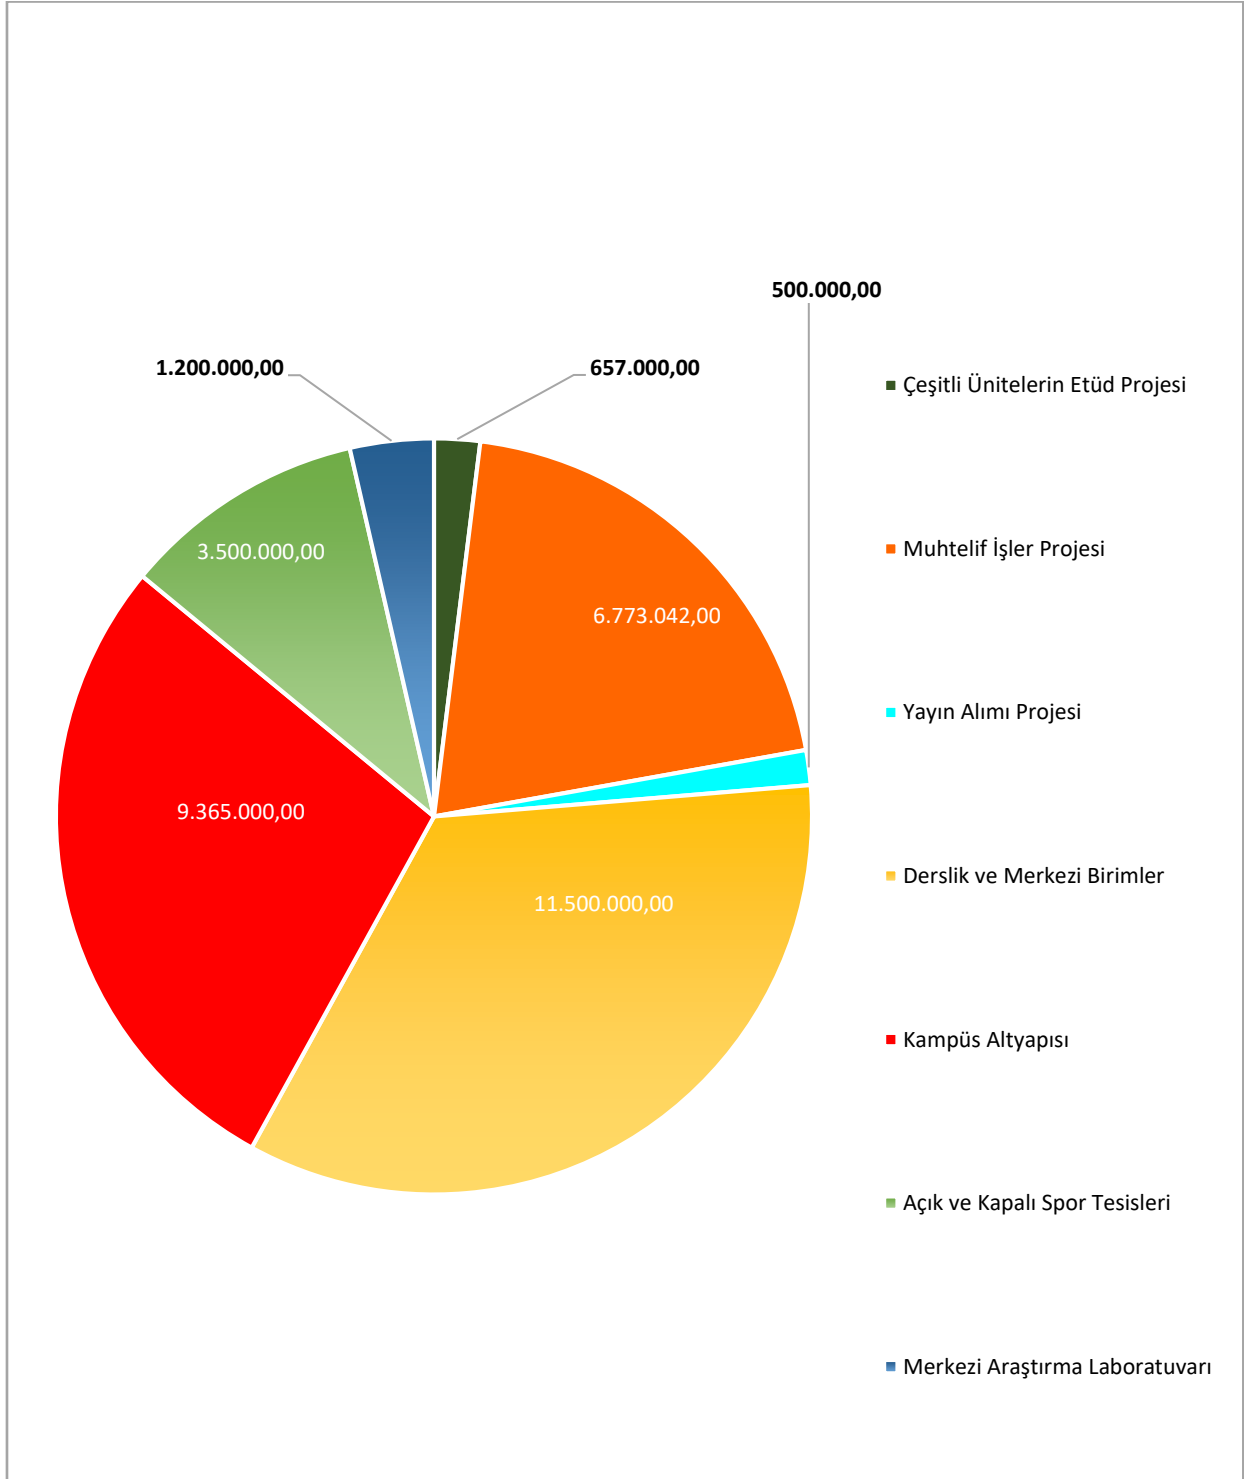

1.2- KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

Üniversite; 5 Fakülte, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 5 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Bu birimler hizmetlerini toplam 1.581.813,69 m²'lik yerleşke alanı üzerindeki 98.140 m²'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitenin hizmet sunduğu açık ve kapalı alanların detayları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2: Taşınmaz Durumu (Açık Alan)

Sıra No	Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²)			2016	2017
		Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m ²)	Toplam Alan (m ²)
1	Merkez Yerleşke	790.794,83	-	-	790.794,83	790.794,83
2	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı	-	10.000,23	-	10.000,23	10.000,23
3	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	İskenderun Meslek Yüksekokulu	85.216,03	104.563,29	-	189.779,32	189.779,32
5	Karayılan Yerleşkesi	23.615,08	-	-	23.615,08	23.615,08
6	Dörtüyük Meslek Yüksekokulu	-	556.860,00	-	556.860,00	556.860,00
TOPLAM		108.831,11	1.462.218,35	10.000,00	1.581.049,46	1.581.049,46

Tablo 3: Taşınmaz Durumu (Kapalı Alan)

Sıra No	Hizmet Biriminin Adı	Toplam Alan (m ²)
1	Merkez Yerleşke	48.361,39
1.1.	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	15.113,39
1.2.	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina (Makine Mühendisliği Hizmet Binası)	8.284,00
1.3.	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	14.984,00
1.4.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.493,00
1.5.	Açık Spor Tesisleri	6.487,00

2	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi	2.500,00
3	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi	6.176,00
3.1.	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvar Binası	5.712,00
3.2.	İdari Bina	474,00
4	Tepe Yerleşkesi	13.531,00
4.1.	İskenderun Meslek Yüksekokulu Binası	9.976,00
4.2.	Kapalı Spor Salonu	2.250,00
4.3.	Makine Bölümü Atölyesi	460,00
4.4.	Otomotiv Bölümü Atölyesi	310,00
4.5.	İnşaat Bölümü Atölyesi	535,00
5	Kuzuculu Yerleşkesi	6.581,00
Genel Toplam		77.149,39

1.3- 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında; Mimarlık Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Merkezi Kütüphane ve Kapalı Spor Kompleksi yapım işi için 3 adet proje ihalesi yapılmıştır. Ayrıca bakım onarım faaliyetleri için 4 adet proje hazırlama hizmet alımı yapılmıştır.

Yayın Alımı Projesi kapsamında; 15.056 adet basılı kitap (teknik kitaplar, sosyal içerikli kitaplar, dini içerikli kitaplar, yerli ve yabancı kaynaklı referans kitapları) satın alınmıştır.

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında; Üniversitemiz Çevre Duvarı yapım işi ve Ana-Giriş Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu yapı işinin ihalesi yapılmış ve projeler tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Elektrikli Araç, Kamyon, İş Makinesi, Otobüs alınmıştır. Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Denizcilik Malzemesi, Büro Mefruşatı, Tefrişatı, EBYS Yazılımı, Turnike Giriş Sistemi ve Network Malzemesi alımı yapılmıştır.

Merkezi Derslik ve Birimler Projesi kapsamında; Mimarlık Fakültesi, Merkezi Yemekhane ve Merkezi Kütüphane yapım işlerinin ihaleleri yapılarak projelerin yapımı devam etmektedir.

2017 yılı Yatırım Projeleriyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları proje bazında aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 4: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Proje No	2017H032670
Hedef	Yapılan İş
Üniversitemiz Master Planı kapsamında yapımı planlanan bina, tesis ve altyapı sistemlerine ilişkin uygulama projelerinin hazırlanması	Merkez Kampüs Master Planı Maketinin Hazırlanması ve Merkezi Kütüphane Binası Uygulama Projesi
	Mimarlık Fakültesi ve Merkezi Yemekhane Uygulama Projesi
	Kapalı Spor Kompleksi ve Kapalı Yüzme Havuzu Uygulama Projeleri ve Teknik İhale Dokümanı ile Yapım İşİ İhalesine Esas Yaklaşık Maliyet Dosyasının Hazırlanması
	Mediko Sosyal Hizmet Binası Uygulama Projesi
	Merkezi Derslik Hizmet Binası Uygulama Projesi
	Merkez Kampüs Altyapı Projesi
	Merkez Kampüs Aydınlatma Projesi
Onarım ve Tadilat Projelerinin Hazırlanması	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Trafo Tadilat Projesi
	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Onarım ve Tadilat Projesi

Tablo 5: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler

Derslik ve Merkezi Birimler	
Proje No	2016H032680
Hedeflenen	Yapılan İş
Mimarlık Fakültesi Yapımı	Mimarlık Fakültesi Yapım İşİ uygulama projeleri tamamlanmış, yapım işİ ihalesi yapılarak yüklenici ile sözleşme imzalanmış ve inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.
Merkezi Kütüphane Yapımı	Merkezi Kütüphane Yapım İşİ uygulama projeleri tamamlanmış, yapım işİ ihalesi yapılarak yüklenici ile sözleşme imzalanmış ve inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.
Merkezi Yemekhane Yapımı	Merkezi Yemekhane Yapım İşİ uygulama projeleri tamamlanmış, yapım işİ ihalesi yapılarak yüklenici ile sözleşme imzalanmış ve inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

Tablo 6: Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler

Kampüs Altyapısı	
Proje No	2016H032690
Hedeflenen	Yapılan İş
Merkez Kampüs Güvenliğinin Arttırılması	Merkez Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşİ
Merkez Kampüs Yürüyüş Yolunun İklim Şartlarına Uygun Hale Getirilmesi	Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapım İşİ
Merkez Kampüs Elektrik Telefon ve Kanalizasyon Altyapısının Yapılması	Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşİ
Kampüs Data Altyapısının Güçlendirilmesi	Fiber Optik Kablo Çekilmesi
Kampüs Otopark Alanlarının Mevcut Kapasitelerinin Arttırılması	Merkez Yerleşke I. Kısım Otopark Sahası Yapım İşİ

Tablo 7: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Proje No	2017H050050
Hedeflenen	Yapılan İş
Kapalı Spor Kompleksi Yapımı	Spor Kompleksi Yapım İşİ uygulama projeleri tamamlanmış, yapım işİ ihalesi yapılarak yüklenici ile sözleşme imzalanmış ve inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Bakım Onarım)

Muhtelif İşler	
Proje No	2017H032680
Hedeflenen	Yapılan İş
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Bakım Onarım ve Tadilatı	Petrol ve Doğalgaz Binası Asma Tavan Yapım İşİ
	Makine Müh. Öğrenci Kulüpleri Odası ve Teknoloji Transfer Ofisi Yapımı
	İSTE Mühendislik Dersliklikleri Ön Cephe Onarımı
	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina Elk. ve Data Tadilatı Yapım işİ

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinin Bakım Onarım ve Tadilatı	İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Binası İnşaat Bakım Onarımı
	Güvenlik Filesi Tadilatı Yapım İşi
	Engelli Platformu Yapım İşi
	Dağıtım Merkezi ve Trafo (Demontaj-Montaj) Taşınması
	Barbaros Hayrettin GİD Çeşitli Tadilat Yapım İşi
	Barbaros Hayrettin GİD Fakülte Binası Doğalgaz İç Tesisat Tadilatı
	Trafo Binası Yapım İşi
	Barbaros Hayrettin GİD Fakülte Binası Çatı Yalıtımı Yapım İşi
	Elektrik Hatları Tadilatı Yapım İşi
	Balkon ve Dış Cephe Yalıtımı Yapım İşi
	Alüminyum Doğrama Yapım İşi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının Bakım Onarım ve Tadilatı	Merkez Kampüs Merkezi Lab. Dağıtım Merkezi Orta Gerilim Elkt. Kablo Hattı Yapım İşi
	Jeneratör ve Trafo (Demontaj-Montaj) Taşınması Yapım İşi
Muhtelif Birimlerde Bakım Onarım ve Tadilat Çalışmaları	Mediko Sosyal Binası Şantiyesine Elektrik Hattı Çekilmesi ve Makine Ek Bina Elektrik Tesisatı Yapım İşi
	Çeşitli Birimlerde Bakım Onarım Yapım İşi
İskenderun Meslek Yüksekokulunun Bakım Onarım ve Tadilatı	İskenderun Meslek Yüksekokulu Dış Cephe Boya Onarımı ile Trafo Tesisi Tadilatı Yapım İşi

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Makine-Teçhizat Alımı)

Muhtelif İşler	
Proje No	2017H032680
Hedeflenen	Yapılan İş
Üniversitemize ait araç sayılarının artırılması	Kamyon Alımı
	Otobüs Alımı
Elektronik Belge Yönetim Sistemine Geçiş	EBYS ve Yazılım Alımı
Üniversitemize ait iş makinaları sayılarının artırılması	İş Makinası Alımı
	Denizcilik Malzemeleri Alımı

Makine ve Teçhizat Alımı (Network, turnike giriş sistemi, büro mefruşat ve tefrişat)	Büro Mefruşat ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı
	Network Malzemesi Alımı
	Tefrişat Alımı (Konteyner)
	Elektrikli Araç Alımı
	Turnike Giriş Sistemi Alımı

Tablo 10: Yayın Alımı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler

Yayın Alımı Projesi	
Proje No	2017H032690
Hedeflenen	Yapılan İş
Üniversitemiz Kütüphanesinin yerli ve yabancı kaynaklı referans kitaplar alımı	Basılı Yayın Alımı (15.056 adet)

1.4- 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

2017 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 26.700.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödenek toplamı 33.495.042,16 TL'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 23.371.393,00-TL harcama yapılmış, harcanmayan 10.123.649,16-TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneye oranı % 69,78'dir.

1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Çok yıllık proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesi; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin (I) fıkrasında; “21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Bu durum; Kamu İhale Kurulu'nun görüşü gereken hallerde, ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca aciliyet arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil etmektedir.

2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

2.1.1- Etüt-Proje İşleri

2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi (2017H032670)

“Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi” için, 2017 yılı bütçesinden 200.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 657.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 650.722,00-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 6.278,00-TL tutarındaki ödenek tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 90,04’dir.

Tablo 11: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

2017H032670 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Merkez Kampüs Master Planı Maketinin Hazırlanması ve Merkezi Kütüphane Binası Uygulama Projesi	Etüt-Proje	15.12.2016 15.02.2017	100
2	Mimarlık Fakültesi ve Merkezi Yemekhane Uygulama Projesi	Etüt-Proje	15.12.2016 31.07.2017	100
3	Kapalı Spor Kompleksi ve Kapalı Yüzme Havuzu Uygulama Projeleri ve Teknik İhale Dokümanı ile Yapım İş İhalesine Esas Yaklaşık Maliyet Dosyasının Hazırlanması	Etüt-Proje	10.02.2017 10.04.2017	100
4	Mediko Sosyal Hizmet Binası Uygulama Projesi	Etüt-Proje	23.05.2017 31.05.2017	100
5	Merkezi Derslik Hizmet Binası Uygulama Projesi	Etüt-Proje	02.02.2017 16.05.2017	100
6	Merkez Kampüs Altyapı Projesi	Etüt-Proje	20.04.2017 15.05.2017	100
7	Merkez Kampüs Aydınlatma Projesi	Etüt-Proje	20.04.2017 20.05.2017	100
8	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Trafo Tadilat Projesi	Etüt-Proje	01.01.2017 31/12/2017	100
9	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Onarım ve Tadilat Projesi	Etüt-Proje	22/03/2017 28/07/2017	100

2.1.2 Devam Eden Projeler

2.1.2.1. Derslik ve Merkezi Birimler (2016H032680)

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi kapsamında; 2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan: Mimarlık Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Merkezi Yemekhane yapım işleri için 11.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kalemi için ilave ödenek talebi yapılmamıştır. Bu proje kaleminden 2017 yılında 10.208.217,54 TL (%88,72) harcama yapılmış, harcanmayan 1.291.782,46 TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir.

Tablo 12: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Merkezi Kütüphane Yapım İşi (11.500m ²)	İnşaat	23.08.2017-09.03.2019	20,33
2	Merkezi Yemekhane Yapım İşi (5.000m ²)	İnşaat	23.08.2017-27.02.2019	18,00
3	Mimarlık Fakültesi Yapım İşi (16.985m ²)	İnşaat	23.08.2017-01.12.2018	14,00

Tablo 13: Mimarlık Fakültesi Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	16.985 m ²
İhale Tarihi	07.04.2017
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	26.786.000,00 TL
Sözleşme Tarihi	23 Ağustos 2017
Yer Teslim Tarihi	08 Eylül 2017
İşin Süresi	450 Gün
İş Bitim Tarihi	01 Aralık 2018
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2017 itibariyle)	3.890.875,33 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 20



Resim 1. Mimarlık Fakültesi

Tablo 14: Merkezi Kütüphane Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	10.140 m ²
İhale Tarihi	03.05.2017
İhale Bedeli (KDV Dahil)	19.147.860,00 TL
Sözleşme Tarihi	23 Ağustos 2017
Yer Teslim Tarihi	06 Eylül 2017
İşi Süresi	550 Gün
İş Bitim Tarihi	09 Mart 2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2017 itibariyle)	4.022.974,02 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 30



Resim 2. Merkezi Kütüphane

Tablo 15: Merkezi Yemekhane Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu

Büyükölüğü (Kapalı Alan)	4.957 m ²
İhale Tarihi	06.07.2017
İhale Bedeli (KDV Hariç)	12.091.460,00 TL
Sözleşme Tarihi	23 Ağustos 2017
Yer Teslim Tarihi	06 Eylül 2017
İŖin Süresi	540 Gün
İŖ Bitim Tarihi	27 Şubat 2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2017 itibariyle)	2.294.368,19 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 25



Resim 3. Merkezi Yemekhane

2.1.2.2. Kampüs Altyapısı (2016H032690)

“Kampüs Altyapısı” projesi kapsamında, 2017 yılı bütçesinden 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 9.365.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 7.683.444,62-TL harcama yapılmış, harcanmayan 1.681.555,38-TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 82,04’dür. Bu proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 16: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

2016H032690 Kampüs Altyapısı				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Merkez Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşi	Altyapı	03.04.2016 03.04.2017	100
2	Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapım İşi	Altyapı	16.12.2016 19.03.2017	100
3	Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşi	Altyapı	04.01.2016 31.12.2017	100
4	Fiber Optik Kablo Çekilmesi	Altyapı	08.09.2017 18.10.2017	100
5	Merkez Yerleşke I. Kısım Otopark Sahası Yapım İşi	Altyapı	02.01.2017 25.01.2017	100

2.1.3 Yeni Projeler

2.1.3.1 Muhtelif İşler (2017H032680)

“Muhtelif İşler” projesi kapsamında, 2017 yılı bütçesinden 5.800.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 6.773.042,00-TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 4.346.218,80-TL harcama yapılmış, harcanmayan 2.426.823,00-TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 64,16’dür. Bu proje kapsamında yapılan ve devam eden faaliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 17: Muhtelif İşler (Makine–Teçhizat Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

2017H032680 Muhtelif İşler Projesi				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Kamyon Alımı	Makine-Teçhizat	05.12.2017 20.12.2017	100
2	Otobüs Alımı	Makine-Teçhizat	30.11.2017 21.12.2017	100

3	EBYS ve Yazılım Alımı	Makine-Teçhizat	18.10.2016 08.02.2017	100
4	İş Makinası Alımı	Makine-Teçhizat	20.04.2017 15.05.2017	100
5	Denizcilik Malzemeleri Alımı	Makine-Teçhizat	01.01.2017 31.12.2017	100
6	Büro Mefruşat ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı	Makine-Teçhizat	01.01.2017 31.12.2017	100
7	Network Malzemesi Alımı	Makine-Teçhizat	18.10.2016 20.04.2017	100
8	Tefrişat Alımı (Konteyner)	Makine-Teçhizat	16.03.2017 31.12.2017	100
9	Elektrikli Araç Alımı	Makine-Teçhizat	22.09.2017 10.10.2017	100
10	Turnike Giriş Sistemi Alımı	Makine-Teçhizat	31.10.2017 28.12.2017	100

Tablo 18: Muhtelif İşler (Bakım Onarım) Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

2017H032680 Muhtelif İşler (Bakım Onarım)				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Petrol ve Doğalgaz Binası Asma Tavan Yapım İşİ	Bakım Onarım	21/03/2017 06/04/2017	100
2	Makine Müh. Öğrenci Kulüpleri Odası ve Teknoloji Transfer Ofisi Yapımı	Bakım Onarım	04.04.2017 11.04.2017	100
3	İSTE Mühendislik Dersliklikleri Ön Cephe Onarımı Yapım İşİ	Bakım Onarım	05.05.2017 11.05.2017	100
4	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina Elk. ve Data Tadilatı Yapım işİ	Bakım Onarım	04.05.2017 11.05.2017	100
5	İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Binası İnşaat Bakım Onarım Yapım İşİ	Bakım Onarım	17.03.2017 21.03.2017	100
6	Güvenlik Filesı Tadilatı Yapım İşİ	Bakım Onarım	17.03.2017 21.03.2017	100
7	Engelli Platformu Yapım İşİ	Bakım Onarım	17.03.2017 21.03.2017	100
8	Dağıtım Merkezi ve Trafo (Demontaj-Montaj) Taşınması	Bakım Onarım	02.06.2017 07.06.2017	100
9	Barbaros Hayrettin GİD Çeşitli Tadilat Yapım İşİ	Bakım Onarım	12.06.2017 19.06.2017	100
10	Barbaros Hayrettin GİD Fakülte Binası Doğalgaz İç Tesisat Tadilatı	Bakım Onarım	16.06.2017 26.06.2017	100

11	Trafo Binası Yapım İşi	Bakım Onarım	14.08.2017 24.08.2017	100
12	Barbaros Hayrettin GİD Fakülte Binası Çatı Yalıtımı Yapım İşi	Bakım Onarım	22.09.2017 02.10.2017	100
13	Elektrik Hatları Tadilatı Yapım işi	Bakım Onarım	13.09.2017 17.10.2017	100
14	Balkon ve Dış Cephe Yalıtımı Yapım İşi	Bakım Onarım	07.11.2017 14.11.2017	100
15	Alüminyum Doğrama Yapım İşi	Bakım Onarım	12.12.2017 14.12.2017	100
16	Merkez Kampüs Merkezi Lab. Dağıtım Merkezi Orta Gerilim Elkt. Kablo Hattı Yapım İşi	Bakım Onarım	21.08.2017 24.08.2017	100
17	Jeneratör ve Trafo (Demontaj-Montaj) Taşınması Yapım İşi	Bakım Onarım	21.08.2017 05.09/2017	100
18	Mediko Sosyal Binası Şantiyesine Elektrik Hattı Çekilmesi ve Makine Ek Bina Elektrik Tesisatı Yapım İşi	Bakım Onarım	04.08.2017 21.08.2017	100
19	Çeşitli Birimlerde Bakım Onarım Yapım İşi	Bakım Onarım	06.09.2017 03.11.2017	100
20	İskenderun Meslek Yüksekokulu Dış Cephe Boya Onarımı ile Trafo Tesisi Tadilatı Yapım İşi	Bakım Onarım	13.12.2017 12.03.2017	100

Muhtelif İşler-Bakım Onarım (2017H032680)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Muhtelif İşler-Büyük Onarım Yatırım Projesi kapsamında 2017 yılı için 2.859.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kalemi için ilave ödenek talebi yapılmamıştır. Bu proje kaleminden 2017 yılında 1.114.606,06 TL (%39) harcama yapılmış, harcanmayan 1.744.393,94 TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir.

Tablo 19. İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşi Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	09 Kasım 2017
İhale Bedeli (KDV Dahil)	223.020,00 TL
İşin Süresi	90 Gün
Sözleşme Tarihi	08 Aralık 2017
İş Başlama Tarihi	13 Aralık 2017
İş Bitiş Tarihi	12 Mart 2018
Yapılan Ödeme Tutarı	0
Fiziki Gerçekleşme	%75



Resim 4. İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Çalışmaları

2.1.3.2 Yayın Alımı (2017H032690)

2017 yılı bütçesinden basılı yayın alımlarına 500.000,00-TL, ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 482.792,09-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 17.207,91-TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 96,56'dır.

Tablo 20: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

2017H032690 Yayın Alımı Projesi				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Basılı Yayın Alımı (15.056 adet)	Yayın Alımı	11.09.2017-25.12.2017	100

2.2.EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

2.2.1. Yeni Projeler

2.2.1.1 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (2017H050050)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yatırım Projesi kapsamında 2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan: Kapalı Spor Kompleksi yapım işi için 3.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kalemi için ilave ödenek talebi yapılmamıştır. Bu proje kaleminden 2017 yılında harcama yapılmamıştır. Harcanmayan 3.500.000,00 TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir.

Tablo 21: Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşİ Bilgi Tablosu

Büyüküğü (Kapalı Alan)	7.203 m ² 887 Seyirci Kapasiteli
İhale Tarihi	08 Aralık 2017
İhale Bedeli (KDV Dahil)	19.289.460,00 TL
İşin Süresi	730 Gün
Tahmini Sözleşme Tarihi	23.01.2018
İş Başlama Tarihi	29.01.2018
İş Bitiş Tarihi	28.01.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2017 Tarihi İtibariyle)	0
Fiziki Gerçekleşme	%0



Resim 5. Kapalı Spor Kompleksi

2.3. DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

2.3.1. Yeni Projeler

2.3.1.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2017K120010)

2017 Yılı Yatırım Programında yer alan: Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 1.200.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kalemi için ilave ödenek talebi yapılmamıştır. Bu proje kaleminden 2017 yılında harcama yapılmamıştır. Harcanmayan 1.200.000,00 TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir.

2.4. HİBE YATIRIM PROJELERİ

2.4.1. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası

Üniversitemiz ve hayırsever Nuri ÜYSEN arasında imzalan protokol ile Merkez Kampüste *Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası'nın* yapımına karar verilmiştir. *Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası'nın* yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanılmış olup, 2018 yılında yapım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

Tablo 22: Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası Bilgi Tablosu

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	1.520,00 m ²
Bağışçı	Nuri ÜYSEN
Yapım Maliyeti	2.166.000,00 TL (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Birim Fiyatları İle)
İşe Başlama Tarihi	27.07 2017
İş Bitiş Tarihi	27.07.2018
Durum	Devam Ediyor



Resim 6. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası

2.5 TAMAMLANAN PROJELER

2.5.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Tablo 23: Tamamlanan Projeler Listesi

Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2017H032680 Muhtelif İşler	İş Makinası Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Kamyon Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Otobüs Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Elektrikli Araç Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Network Malzemesi Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Büro Mefruşat ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Turnike Giriş Sistem Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	EBYS ve Yazılım Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Denizcilik Malzemeleri Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Tefrişat Alımı-Konteyner Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Petrol ve Doğalgaz Binası Asma Tavan Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Makine Müh. Öğrenci Kulüpleri Odası ve Teknoloji Transfer Ofisi Yapımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	İSTE Mühendislik Dersliklikleri Ön Cephe Onarımı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina Elk. ve Data Tadilatı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Binası İnşaat Bakım Onarım Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Güvenlik Filesini Tadilatı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Engelli Platformu Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Dağıtım Merkezi ve Trafo (Demontaj-Montaj) Taşınması	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Barbaros Hayrettin GİD Çeşitli Tadilat Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi

Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2017H032680 Muhtelif İşler	Barbaros Hayrettin GİD Fakülte Binası Doğalgaz İç Tesisat Tadilatı	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Trafo Binası Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Barbaros Hayrettin GİD Fakülte Binası Çatı Yalıtımı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Elektrik Hatları Tadilatı Yapım işi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Balkon ve Dış Cephe Yalıtımı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Alüminyum Doğrama Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Merkez Kampüs Merkezi Lab. Dağıtım Merkezi Orta Gerilim Elkt. Kablo Hattı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Jeneratör ve Trafo (Demontaj-Montaj) Taşınması Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Mediko Sosyal Binası Şantiyesine Elektrik Hattı Çekilmesi ve Makine Ek Bina Elektrik Tesisatı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	Çeşitli Birimlerde Bakım Onarım Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032680 Muhtelif İşler	İskenderun Meslek Yüksekokulu Dış Cephe Boya Onarımı ile Trafo Tesisi Tadilatı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Merkez Kampüs Master Planı Maketinin Hazırlanması ve Merkezi Kütüphane Binası Uygulama Projesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Mimarlık Fakültesi ve Merkezi Yemekhane Uygulama Projesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Kapalı Spor Kompleksi ve Kapalı Yüzme Havuzu Uygulama Projeleri ve Teknik İhale Dokümanı ile Yapım İşi İhalesine Esas Yaklaşık Maliyet Dosyasının Hazırlanması	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Mediko Sosyal Hizmet Binası Uygulama Projesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Merkezi Derslik Hizmet Binası Uygulama Projesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Merkez Kampüs Altyapı Projesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Merkez Kampüs Aydınlatma Projesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Trafo Tadilat Projesi	İskenderun Teknik Üniversitesi

Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2017H032670 Çeşitli Üniversitelerin Etüd Projesi	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Onarım ve Tadilat Projesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2016H032690 Kampüs Altyapısı	Merkez Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2016H032690 Kampüs Altyapısı	Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2016H032690 Kampüs Altyapısı	Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2016H032690 Kampüs Altyapısı	Fiber Optik Kablo Çekilmesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2016H032690 Kampüs Altyapısı	Merkez Yerleşke I. Kısım Otopark Sahası Yapım İşi	İskenderun Teknik Üniversitesi
2017H032690 Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı (15.056 adet)	İskenderun Teknik Üniversitesi

2.6. PROJE TAMAMLAMA RAPORU

2017 yılı içinde tamamlanan projelerin detay bilgileri aşağıdaki “Projenin Yatırım Programı Parametreleri” başlıklı tablolarda verilmiştir.

Tablo 24: Merkez Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2016H032690					
Proje Adı	Kampüs Altyapısı- Merkez Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Merkez Kampüs Alanın Belirlenerek, Güvenliğinin Sağlanması					
Proje Yeri	Hatay - İskenderun					
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı					
Fiziki Hedefi	4.020 m Çevre Duvarı Yapımı					
Başlama-Bitiş Tarihi	16.09.2016-02.07.2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi	27.07.2017	İhale Sözleşme Bedeli		2.195.984,00 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2016						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Merkez Kampüs Alanın Belirlenerek, Güvenliğinin Sağlanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Proje kapsamında Üniversitemiz Merkez Kampüsünün güvenliği sağlanmıştır.					
Yapılan İşler- Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar- Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

Tablo 25: Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H032690					
Proje Adı	Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Merkez Kampüs alanının büyüklüğü ve birimler arasındaki mesafelerin uzaklığı nedeniyle kapalı yürüyüş yollarının yapımı					
Proje Yeri	Hatay					
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı					
Fiziki Hedefi	430 m Kapalı Yürüyüş Yolu					
Başlama-Bitiş Tarihi	20.12.2017-17.04.2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi	16.12.2017	İhale Sözleşme Bedeli		272.103,10 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
337.141,59 TL						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2016						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Merkez Kampüs alanının büyüklüğü ve birimler arasındaki mesafelerin uzaklığı nedeniyle kapalı yürüyüş yollarının yapımı.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Üniversitemiz Merkez Kampüsü birimler arası yürüyüş yollarının iklim koşullarına uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

Tablo 26: Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H032690					
Proje Adı	Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Merkez Kampüs, kampüs içi yolları, galeri hatları, kanalizasyon hatları ile yağmur suyu hatlarının yapılması					
Proje Yeri	Hatay					
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı					
Fiziki Hedefi	7.212 m Kampüs İçi Yol, 1.819 m (2*2) Galeri Hattı, 2.801 m Kanalizasyon Hattı ile 327 m Yağmur Suyu Hattı					
Başlama-Bitiş Tarihi	20.02.2017-09.10.2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi	16.12.2017	İhale Sözleşme Bedeli		4.998.000,00 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	5.859992,36 TL					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2016						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Merkez Kampüs, kampüs içi yolları, galeri hatları, kanalizasyon hatları ile yağmur suyu hatlarının yapılması					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Üniversitemiz Merkez Kampüsü Master Planına uygun olarak yollar, kanalizasyon hatları ve yağmur suyu hatları yapılmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

Tablo 27: Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Binası İnşaat Bakım Onarım Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2017H032680					
Proje Adı	Muhtelif İşler-Büyük Onarım: İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Binası İnşaat Bakım Onarım Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Büyük Onarım					
Proje Yeri	Hatay					
Karakteristiği	Büyük Onarım					
Fiziki Hedefi	-					
Başlama-Bitiş Tarihi	01.12.2016-29.03.2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi	28.11.2016		İhale Sözleşme Bedeli		194.000,00 TL	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
251.689,23 TL						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2016						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Üniversitemiz Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakülte Binasının kullanımına yönelik iyileştirmeler yapmak					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Üniversitemiz Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakülte Binasının daha etkin ve verimli kullanılması sağlanmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

1-Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması son derece önem arz etmektedir.

2-Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan Üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

3-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Tablo 28: 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Kurum Adı : İskenderun Teknik Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

(Bin TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Yılı Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	Toplam
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Haberleşme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	6	-	69.137	-	-	4.582	-	-	33.495	-	-	7.995(+)	-	-	23.371
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	1	-	8.000	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
-İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	7	-	77.137	-	-	4.582	-	-	34.695	-	-	7.995(+)	-	-	23.371
